Informe a la Gobernación de Amambay

Obras: Construcción y Reformas de Instituciones Educativas del Departamento

Mes: Enero – 2020

Profesional:

Félix Gómez Coronel

RP. M.O.P.C. N° 2478

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME A LA SECRETARÍA DE OBRAS DE LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Lic Carlos Ortiz, Secretario de obras del Gobierno Departamental

Asunto: Obras encaradas por el Gobierno Departamental –Construcción y Reforma de Escuelas del Departamento del Amambay

Informe de: Ing. Civil Felix Gomez Coronel – Fiscal de Obras

ESCUELA N° 1783 - Gral. JOSE E. DIAZ – CONSTRUCCIÓN DE 1(UN) PABELLON CON 3(TRES) AULAS – CONTRATO N° 26/2019.

- Los trabajos para la construcción de las 3(tres) salas de clases, se ajustan al proyecto arquitectónico elaborado por el MEC.
- Trabajos de fundaciones, levantamiento de pared, contrapiso
- Todos los materiales utilizados en dicha obra están dentro de las especificaciones técnicas y del PBC.
- Todas observaciones y modificaciones fueron solucionados con el contratista
- Avance de la obra: 80%

ESCUELA N° 1333 – ELISA ALICIA LINCH – CONSTRUCCIÓN DE 1(UN) SANITARIO DIFERENCIADO E INCLUSIVO – CONTRATO N° 26/2019.

- Los trabajos para la construcción del baño diferenciado se adecua al proyecto elaborado por el MEC.
- Se realizaron los trabajos de marcación, fundaciones, levantamiento de pared, contrapiso,techos
- Los materiales utilizados en esta obra están dentro de las especificaciones técnicas.

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG.
FISC.
GOBERNACION DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

ESCUELA BASICA N° 4776 – REBECA ALEN- CONSTRUCCIÓN DE 1(UN) SALA DE AULA – NIVEL INICIAL – CONTRATO N° 26/2019.

- Los trabajos realizados fueron: Marcación
- Nivelación de terreno.
- Excavación de pilotes y cargas.
- Carga de cabezales.
- Vigas de H°A°(armación y carga).
- Pilares de H°A°(armación y carga).
- Levantamiento de pared.
- Contrapisos.
- Techos

  Obs: Avance de la obra 80%

ESCUELA N° 1951 – JUAN EMILIO OLEARY – CONSTRUCCIÓN DE 1(UN) PABELLON CON 3(TRES) AULAS – CONTRATO N° 26/2019

- En esta escuela se realizaron los trabajos preliminares como limpieza y marcación.
- Trabajos de estructuras como: Pilotes, cabezales, vigas de H°A°, Pilares de H°A°.
- Levantamiento de pared
- Contrapiso.

- En esta obra se obedecieron las especificaciones técnicas (materiales) del PBC.

ESCUELA N° 7207 SANTO DOMINGO SAVIO-REFORMA DE 1(UN) PABELLON CON 5(CINCO) AULAS – CONTRATO N° 26/2019

- Los trabajos preliminares en esta obra fueron: limpieza del terreno y marcación de la misma.
- Trabajos de estructuras: Vigas de H°A°, pilares de H°A°(donde era necesario).
- Levantamiento de pared y revoques.
- Contrapiso.

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. ... M.O.C.P. 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACION DE AMAMBAY

- Techos

ESCUELA N° 1302- BRAULIO MENDOZA ARECO – REFORMA DE 1(UN) PABELLON CON 1(UNA) AULA – CONTRATO N° 26/2019

- Los trabajos realizados en esta escuela fueron:
- Refuerzos en las estructuras (vigas y pilares).
- Contrapiso
- Cambio del techo.
- Cambio del piso.
- Cambio de revoques.

  Obs: Avance de la obra 80%

ESCUELA N° 5678 SAN ALFONSO – CONSTRUCCIÓN DE 1(UN) BAÑO DIFERENCIADO E INCLUSIVO – CONTRATO N° 26/2019

- En esta escuela los trabajos preliminares fueron la limpieza del terreno y la marcación.
- Trabajos de Estructura: pilotes, cabezales, vigas de H°A°, pilares de H°A°.
- Levantamiento de Pared y revoques.
- Contrapiso.
- Techos
- Obs: Avance de la obra 80%

ESCUELA N° 7959 NIÑO JESUS – CONSTRUCCIÓN DE 1(UNA) AULA –CONTRATO N° 26/2019

- Los trabajos ejecutados preliminares fueron: limpieza del terreno y marcación.
- Trabajos de Estructura como ser: Pilotes (excavación y carga), cabezales, vigas de H°A° y pilares de H°A°.
- Levantamiento de pared y revoques.
- Contrapiso.

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG.
FISC.
GOBERNACION DE AMAMBAY

- Colocación de techos

  Obs: Avance de la obra 85%.

COLEGIO NACIONAL SANTA CLARA- CONSTRUCCIÓN DE 1(UN) BAÑO DIFERENCIADO E INCLUSIVO – CONTRATO N° 26/ 2019.

- Los trabajos realizados en esta obra fueron: Limpieza y marcación.
- Estructura: Pilotes, cabezales, vigas de H°A° y pilares de H°A°.
- Levantamiento de pared y revoques.
- Contrapiso.

Obs: Avance de la obra 70%

ESCUELA N° 2923 EDILTRUDIS LEMES- CONSTRUCCIÓN DE 1(UN) AULA – CONTRATO N° 26/2019

- Trabajos ejecutados: limpieza y marcación.
- Estructura: pilotes, cabezales, vigas de H°A° y pilares de H°A°.
- Levantamiento de pared y revoques.
- Contrapiso.
- Techos

  Obs: Avance de la obra 80%

ESCUELA N° 6509 ARROYO YSAÚ –CONSTRUCCIÓN DE 1(UN) AULA-CONTRATO N° 26/2019.

- Trabajos preliminares en esta escuela fueron: limpieza y marcación
- Estructurales: Pilotes de H°A°, cabezales, vigas de H°A° y pilares de H°A°.
- Levantamiento de pared y revoques.
- Contrapisos.
- Techos

  Obs: Avance de la obra 80%

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG.
FISCAL DE
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

ESCUELA N° 7582- PYSYRY- REFORMA DE 1(UN) PABELLON CON 3(TRES) AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE 1(UN) COCINA – COMEDOR – CONTRATO N° 26/2019

- EN LA REFORMA:
- Refuerzos en las estructuras (vigas y pilares de H°A°).
- Cambio de revoque.
- Cambio de pisos.
- Cambio de techos.
- Pinturas.
- Aberturas.

  Obs: Avance de la obra 80%
- EN LA CONSTRUCCION DE LA COCINA – COMEDOR:
- Limpieza y marcación.
- Estructuras: pilotes, cabezales, vigas de H°A° y pilares de H°A°.
- Levantamiento de pared

  Obs: avance de la obra 80%

ESCUELA N° 4000 – 14 DE MAYO (DISTRITO DE KARAPAI)- CONTRUCCIÓN DE 1(UN) PABELLÓN CON 3(TRES) AULAS – CONTRATO N° 26/2019

- Trabajos preliminares ejecutados en esta obra: limpieza y marcación.
- Estructurales: pilotes de H°A°, cabezales de H°A°, vigas de H°A° y pilares de H°A°.
- Levantamiento de pared y revoques.
- Techos de tejas y tejuelon.
- Contrapiso.
- Techos

  Obs: Avance de la obra 80%

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
RE
FISC
GOBERNACION DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

ESCUELA N° 7102- COLONIAS UNIDAS (BELLA VISTA)- CONSTRUCCIÓN DE 1(UN) COCINA-COMEDOR- CONTRATO N° 26/2019

- Los trabajos realizados fueron: limpieza y marcación.
- Estructurales: pilotes, cabezales, vigas de H°A° y pilares de H°A°.
- Levantamiento de pared y revoques.
- Contrapiso.
- Techos

OBS: Avance de la obra 80%

ESCUELA N° 4668-SAN ISIDRO (BELLA VISTA)-CONSTRUCCIÓN DE 1(UN) AULA NIVEL INICIAL-CONTRATO N° 26/2019

- Trabajos preliminares: limpieza y marcación del terreno.
- Trabajos estructurales: pilotes, cabezales, vigas de H°A° y pilares de H°A°.
- Levantamiento de pared y revoques del mismo.
- Contrapiso.
- Techos

Obs: Avance de la obra 80%

ESCUELA N° 1305 SAN ROQUE (CAPITAN BADO) – CONSTRUCCIÓN DE 1(UN) COCINA-COMEDOR- CONTRATO N° 26/2019

- Trabajos realizados: limpieza y marcación.
- Trabajos de estructura: pilotes, cabezales, vigas de H°A° y pilares de H°A°.
- Levantamiento de pared y revoques.
- Contrapiso.
- Colocación de cajita para inst. electrica
- Techos
- Aberturas.

Obs: Avance de la obra 80%

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. 2478
FISC. CAS.
GOBERNACION DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

COLEGIO NACIONAL HERMINIA C. DE GRAU (CAPITAN BADO)- CONSTRUCCIÓN DE 1(UN) BAÑO DIFERENCIADO E INCLUSIVO- CONTRATO N° 26/2019

- Trabajos preliminares realizados: limpieza y marcación del terreno.
- Trabajos estructurales: excavación y carga para pilotes, cabezales, vigas de H°A° y pilares de H°A°.
- Levantamiento de pared
- Techos

  Obs: Avance de la obra 80%

Es mi informe,

Felix Gomez Coronel

Ing. Civil – Reg M.O.P.C. N° 2478

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG 2478
FISCA
GOBERNACION DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

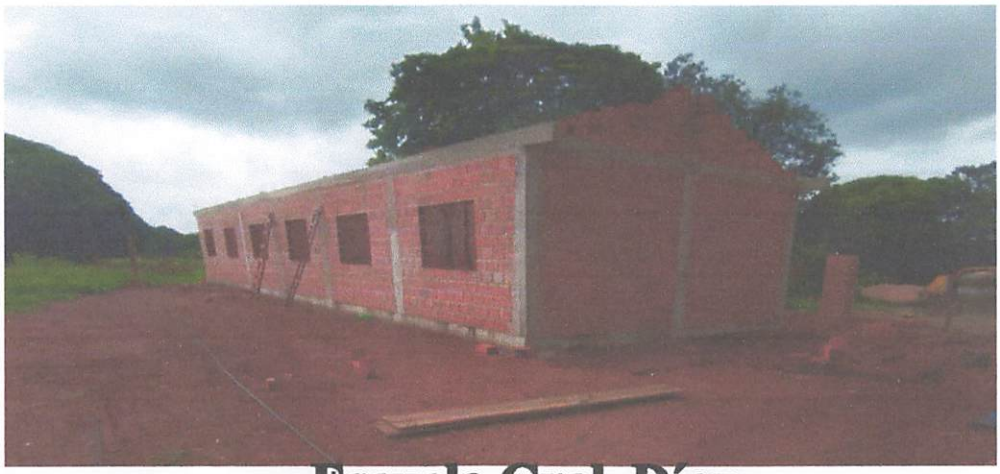

Escuela Gral. Díaz
Contrato Nº26/2019

Escuela Juan Eoleary
Contrato Nº 26/2019

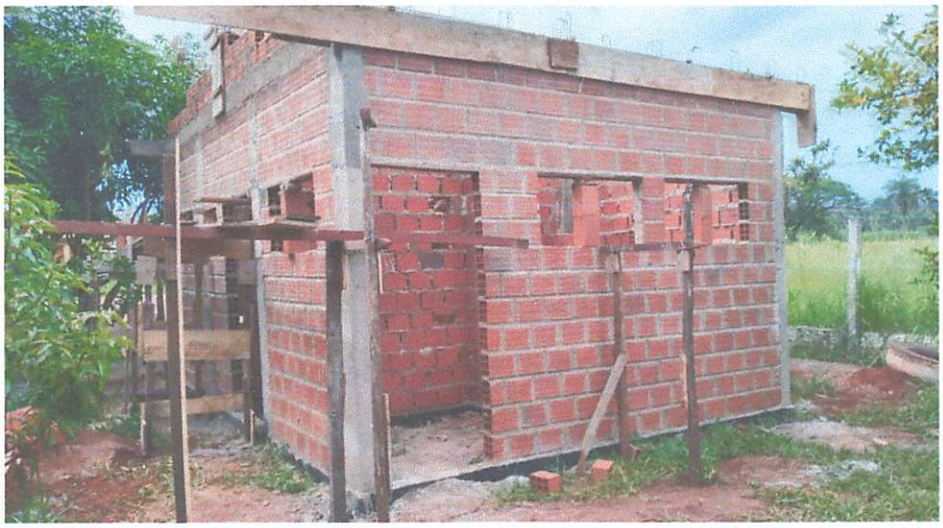

Escuela San Alfonso
Contrato Nº26/2019

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
GOBERNACION DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

Escuela Herminia Grau Cap Bado
Contrato Nº26/2019

Escuela San Roque Cap Bado
Contrato Nº26/2019

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
GOBERNACION DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

Escuela Braulio Mendoza Areco
Contrato Nº26/2019

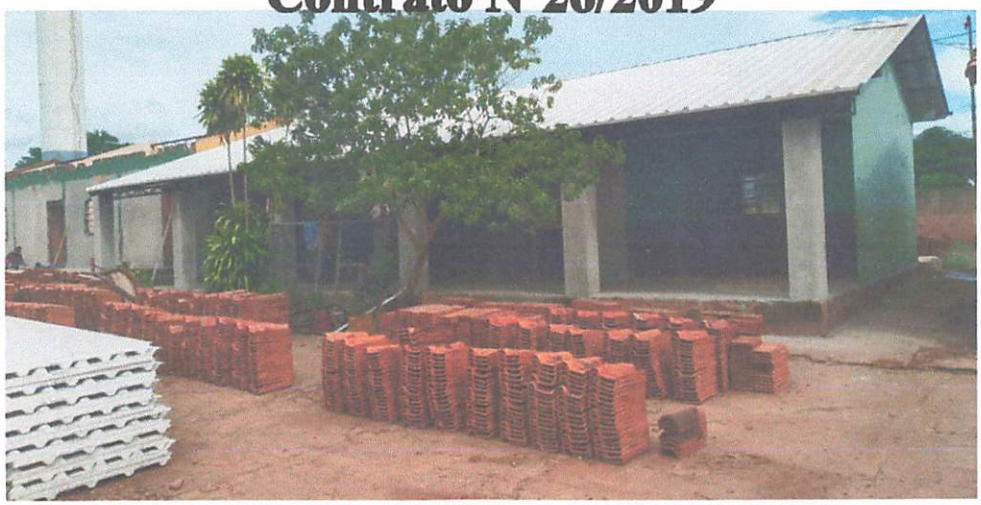

Escuela Domingo Savio
Contrato Nº26/2019

Escuela Escuela Alicia Lynch
Contrato Nº26/2019

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
RE... 478
GOBERNACION DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

Escuela karapai
Contrato Nº26/2019

Escuela Col. Colonias Unidas Bella Vista
Contrato Nº26/2019

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REC
Fio
GOBERNACION DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

ESCUELA DE KARAPA`I

ESCUELA SANTA CLARA 2º ZONA

ESCUELA EDILTRUDIS LESME
COLONIA MARIA AUXILIADORA

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

ESCUELA JUAN EMILIO O`LEARY

COLEGIO MARIA AUXILIADORA

ESCUELA ARROYO YSAU

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. DGDE MOPC P 2470
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACION DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

ESCUELA ALICIA LYNCH

ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO

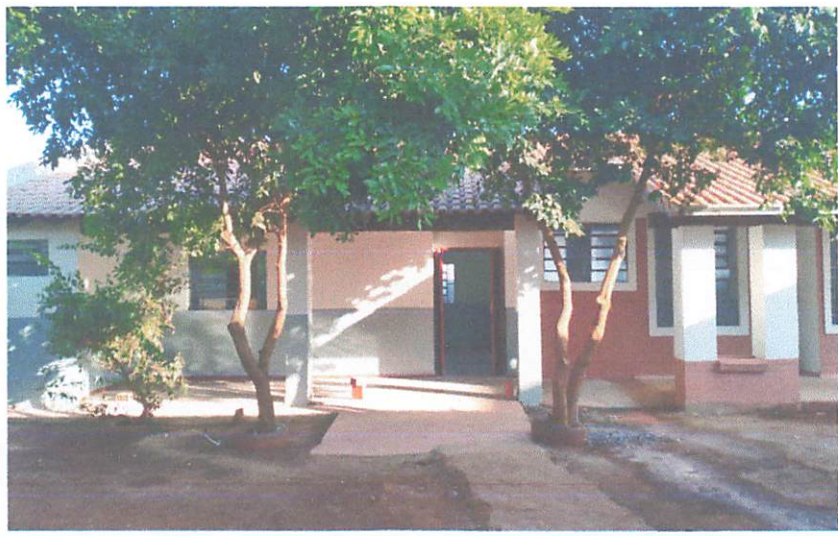

ESCUELA REBECA ALÉN

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 247
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACION DE AMAMBAY
