Ayolas misiones; 15 de octubre de 2025

Señor.
ABG. CARLOS ALBERTO DUARTE GUTIÉRREZ
INTENDENTE MUNICIPAL
PRESENTE.

REF: "Construcción de bloque de aula y pista de formación en el Colegio Padre Luis Leita"- Adjudicación de la Licitación 453834

De mi mayor consideración.

Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de presentar el Certificado de Obras N° 02 del Contrato N° 05/2025 - “"Construcción de bloque de aula y pista de formación en el Colegio Padre Luis Leita" de la Compañía de Coratei - Adjudicación de la Licitación 453834, correspondiente al mes de agosto del corriente año.

Para el efecto adjunto a la presente nota todos los documentos con las mediciones y resúmenes correspondientes.

El monto neto del presente certificado es de guaraníes, 338.119.200GS. (Trescientos treinta y ocho millones ciento diecinueve mil doscientos).

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

.....
FAMILIAR S.R.L.
CONTRATISTA

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

CERTIFICADO BASICO DE OBRA Nº 2

RESUMEN DE PAGO DE CERTIFICADO

OBRA: "Construcción de bloque de aula y pista de formación en el Colegio Padre Luis Leita"- Adjudicación de la Licitación 453834

UBICACIÓN: Compañía Coratei

CONTRATISTA: FAMILIAR S.R.L

CONTRATO Nº: 05/2025

PLAZO CONTACTUAL: 120 dias

FECHA: 15 de octubre de 2025

ITEM.	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	MONTO DE CONTRATO
1	**"Construcción de bloque de aula y pista de formación en el Colegio Padre Luis Leita"- Adjudicación de la Licitación 453834**	1	GL	**1.180.928.440**

RESUMEN DE PAGO

MONTO DE CERTIFICADO Nro 2 - 15 de octubre de 2025			**338.119.200**
MONTO DEL IVA 10%	30.738.109	**MONTO IMPONIBLE**	307.381.091

DESCRIPCION	TOTAL
MONTO DE CERTIFICADO	338.119.200
FONDO DE REPARO 5%	16.905.960
IVA 30%	9.221.433
DNCP 0,4%	1.229.524
RENTA 4%	12.295.244
MULTAS Y DEDUCION	0
MONTO DE CHEQUE	**298.467.039**

Son en guaranies: Doscientos noventa y ocho millones cuatrocientos sesenta y siete mil treinta y nueve

FAMILIAR S.R.L.
Contratista

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

Carlos Ayala Lujan
Ing. MTOP Nº 5.778
FISCAL DE OBRA
Municipalidad de Ayolas

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 02

OBRA: "Refacción, Reparación y Adecuación de Aulas para Comedor en la Escuela Básica N°1915 Agustín Pío Barrios, de la Ciudad de Ayolas"- Convocatoria de la Licitación 456469

UBICACIÓN: Compañía Coratei
Contratista: FAMILIAR S.R.L.
Contrato N°: 05/2.025
Monto del Contrato: 1.180.928.440
Plazo Contractual: 120 dias
Fecha de certificacion: 15 de octubre de 2025

CUADRO DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
JULIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AGOSTO	295.232.110	295.232.110	571.207.200	571.207.200	25,00%	25,00%	48,37%	48,37%
OCTUBRE	295.232.110	590.464.220	338.119.200	909.326.400	25,00%	50,00%	28,63%	77,00%
NOVIEMBRE	295.232.110	885.696.330			25,00%	75,00%		
DICIEMBRE	295.232.110	1.180.928.440			25,00%	100,00%		

CURVA DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO

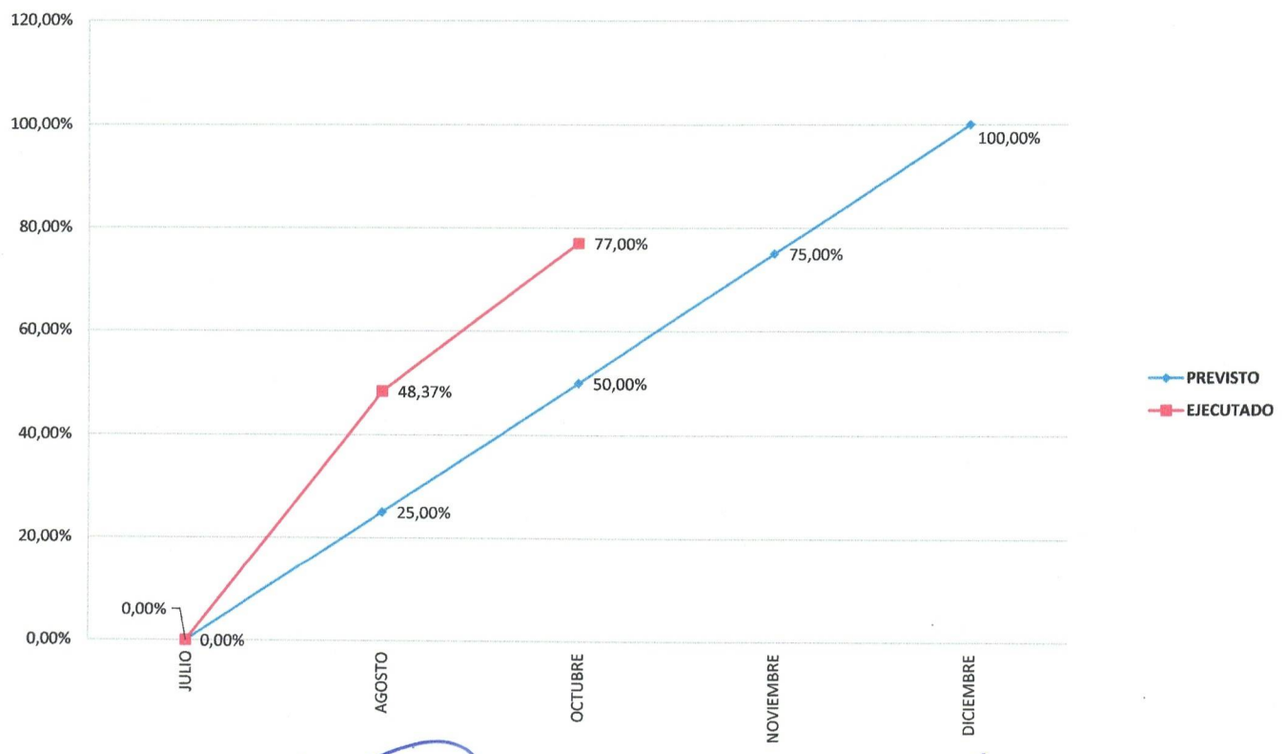

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

FAMILIA S.R.L.
Contratista

Carlos Ayala Lujan
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5129

Fiscal de Obras
MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
