GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 01

Mes: enero

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 32/23 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	% Avance de Obra	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	**LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 32/23 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092**	100,00%	98.841.130	0,00%	0	24,58%	24.294.111	24,58%	24.294.111
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**98.841.130**	**0,00%**	**0**	24,58%	**24.294.111**	**24,58%**	**24.294.111**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	19.768.226	0	4.858.822	4.858.822
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**19.768.226**	0	**4.858.822**	**4.858.822**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				19.435.289	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**19.435.289**	

Certificado Básico Nº	**01**
Mes: enero	
Contrato N°:	32/23
Monto Básico:	₲ 98.841.130
Contratista:	Impacto Constructora -Noelia Ledesma
Fecha de Inicio:	18-dic-23
Plazo de Ejecución:	90 dias
Fecha de Terminación:	17-mar-24

SON GUARANIES: Diez y nueve millones cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos ochenta y nueve.

.....

Lic. Noelia Ledesma Ocampos

Contratista

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

.....

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 32/23 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092

Contrato N°:	32/23		
Monto del Contrato:	98.841.130 gs	**Term. Prevista:**	17-mar-24
Plazo Contractual:	90 dias	**Ampliaciones:**	
Inicio de Obra:	18-dic-23	**Mes:**	ENERO

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N°: 32/23

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
enero	24.294.111	24.294.111	24.294.111	24.294.111	24,58%	24,58%	24,58%	24,58%
febrero	59.068.225	83.362.336			59,76%	84,34%		
marzo	15.478.794	98.841.130			15,66%	100,00%		

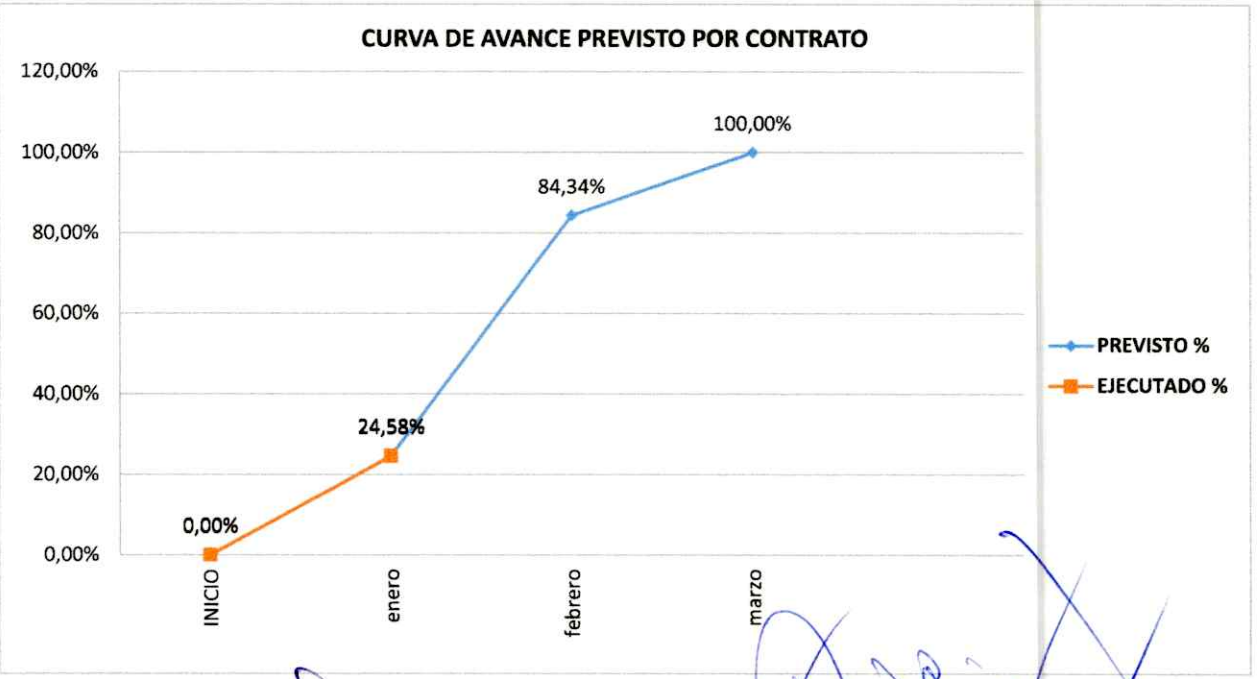

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA
IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 32/23 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	$ 98.841.130	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	32/23	**PRÓRROGA:**	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 dias	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							PLANILLA DE MEDICIÓN N° 01						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 01					
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORA - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092				IMPACTO CONSTRUCTORA		Incidencia del Rubro sobre el Total	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.196.384	1.196.384	0,012	0	100	100	0	0,012	0,012	0	1	1	-	1.196.384	1.196.384
2	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	183,5	8.687	1.594.065	0,016	0	100	100	0	0,016	0,016	0	183,5	183,5	-	1.594.065	1.594.065
3	Construcción de empedrado - Empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	1.431,30	30.050	43.010.565	0,435	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
4	Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	1.431,30	5.698	8.155.547	0,083	0	20	20	0	0,017	0,017	0	286,26	286,26	-	1.631.109	1.631.109
5	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1,05	968.013	1.016.414	0,010	0		0	0	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
6	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	359	79.079	28.389.361	0,287	0	70	70	0	0,201	0,201	0	251,3	251,3	-	19.872.553	19.872.553
7	Colocacion de hormigon armado -Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	7,56	1.711.407	12.938.237	0,131	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
8	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.431,30	1.775	2.540.558	0,026	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
					98.841.130	**100%**				**0%**	**24,58%**	**24,58%**				**0**	**24.294.111**	**24.294.111**

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

IMPACTO
CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaria de Obras Publicas y Transporte

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapua

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 32/23 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	₲ 98.841.130	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	32/23	**PRÓRROGA:**	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 dias	**FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:**	

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORA - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092				IMPACTO CONSTRUCTORA - Noelia Ledesma		PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 días			TOTAL
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	
1	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.196.384	1.196.384	1.196.384			100%
2	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	183,5	8.687	1.594.065	1.594.065			100%
3	Construcción de empedrado - Empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	1.431,30	30.050	43.010.565		43.010.565		100%
4	Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	1.431,30	5.698	8.155.547	1.631.109	6.524.438		100%
5	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1,05	968.013	1.016.414		1.016.414		100%
6	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	359	79.079	28.389.361	19.872.553	8.516.808		100%
7	Colocacion de hormigon armado - Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	7,56	1.711.407	12.938.237			12.938.237	100%
8	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.431,30	1.775	2.540.558			2.540.558	100%
					98.841.130				

PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES - POR CONTRATO	24.294.111	59.068.225	15.478.794	98.841.130
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE - POR CONTRATO	24,58%	59,76%	15,66%	100,00%

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005414 - 1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 32/23 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	₲ 98.841.130	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	32/23	**PRÓRROGA:**	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 dias	**FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:**	

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORA - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092				IMPACTO CONSTRUCTORA - Noelia Ledesma		PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 días			TOTAL
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	
1	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.196.384	1.196.384	1.196.384			100%
2	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	183,5	8.687	1.594.065	1.594.065			100%
3	Construcción de empedrado - Empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	1.431,30	30.050	43.010.565		43.010.565		100%
4	Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	1.431,30	5.698	8.155.547	1.631.109	6.524.438		100%
5	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1,05	968.013	1.016.414		1.016.414		100%
6	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	359	79.079	28.389.361	19.872.553	8.516.808		100%
7	Colocacion de hormigon armado - Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	7,56	1.711.407	12.938.237			12.938.237	100%
8	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.431,30	1.775	2.540.558			2.540.558	100%
					98.841.130				

PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES - POR CONTRATO	24.294.111	59.068.225	15.478.794	98.841.130
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE - POR CONTRATO	24,58%	59,76%	15,66%	100,00%

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414 - 1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Obras Públicas y Transporte

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

REFERENCIA: **I.D: 437.092**
LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 47/2023
"Construcción de Empedrado en Arroyo Pora - Cambyreta" - Plurianual
Contrato: 32/2023
Distrito: CAMBYRETA

CONTRATISTA: **NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS**
IMPACTO CONSTRUCTORA

FISCAL DE OBRAS: **Ing. Fernando Oreggioni**

UBICACIÓN	DISTRITO	PLAZO CONTRACTUAL	MONTO DE LA OBRA
Barrio Arroyo Pora	Cambyreta	90 días corridos	Gs. 98.841.130
CONTRATISTA	**N° DE TELÉFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE/ITEM.**
Noelia Elisa Ledesma Ocampos-IMPACTO CONSTRUCTORA	0985-171-856	32/2023	----------
FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN PROBABLE**	**PRORROGAS DE PLAZO**	**AVANCE DE OBRA**
18 de diciembre - 2023	15 de mayo – 2024	----------	24,58%

Observaciones:

En la visita realizada se registraron trabajos de cargamento de Hormigón (H°) en cordón cuneta, colocación de piedras, se realizaron control de medidas y procedimientos ejecutados en obra. La obra tuvo un avance del 24,58% en relación a su cronograma físico-financiero, y la ejecución de la obra se esta dando de forma continua y cumpliendo los plazos establecidos.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Fiscal de Obras
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa.

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

va a'

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORÁ – CAMBYRETA

- Cartel - Cordón Cuneta H° -

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORÁ – CAMBYRETA

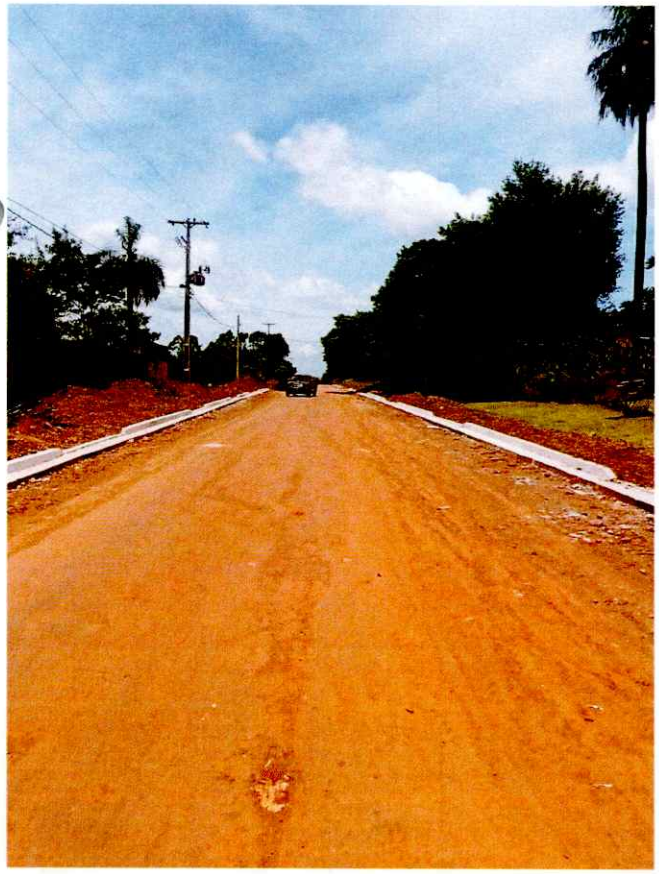

Ing. Fernando Crescioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Misiones

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORÁ – CAMBYRETA

- Control y verificación – Medidas de las piedras, colocación y procedimiento -

Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Caggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
