CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Obras y Proyectos

Compromiso con la gente

INFORME TECNICO

Asunción, 8 de junio de 2020

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N° 01

OBRA: Construcción de Techo para el sector de estacionamiento de funcionarios de la sede del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Casado.

LOCALIDAD: Puerto Casado – Circunscripción Judicial de Alto Paraguay.

FECHA DE SUPERVISION DE OBRA: 02 y 03 de junio de 2020.

DESCRIPCIÓN:

Se realizó la verificación "In situ" de la situación actual de la obra, en cuanto al avance y ejecución de los trabajos realizados hasta la fecha, una vez hecho el recorrido se constata los siguientes puntos detallados en la transcripción del Acta de Reunión:

1. La firma del Acta de inicio de Obras se realizó el **09/03/2020.**
2. La empresa Contratista inicio los trabajos de fundación incumpliendo lo especificado en el contrato, el mismo sustituyo los pilotes de 0,30 de diámetro por 6 m. de profundidad por zapatas, el cual fue visualizado en obras en dicha fecha notificando al mismo del incumplimiento de lo solicitado en las E.E.T.T. debiendo adecuarse a los planos originales en la brevedad posible, esto acarreo replantear los pilares con un desfasaje de aproximadamente 60 cm. para que estos no afecten a la distribución de espacios de estacionamiento.
3. En fecha 02/06/2020 la Empresa Contratista reinició los trabajos luego de la Cuarentena, debido a la pandemia del Covid-19.
4. Se pudo constatar la realización de las fundaciones acordes a las Especificaciones Técnicas del Contrato.
5. También se verifico en el sitio de obras toda la estructura metálica a montarse una vez finalizada la fundación, las mismas fueron verificadas en cuanto a dimensiones, espesores y características, adecuando a las Especificaciones Técnicas correspondientes.
6. El Administrador de Contrato, solicitó al Contratista la prórroga de las pólizas vigentes a la fecha de manera a precautelar el fiel cumplimiento del contrato.

Observaciones:

- Ninguna.-

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

PODER JUDICIAL
Departamento de Obras y Proyectos
D.I.F.

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Ent. N° 830 Fecha 08-06-20 Firma

Es mi informe

Christian Vargas Núñez
Auxiliar
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

TOMAS FOTOGRAFICAS

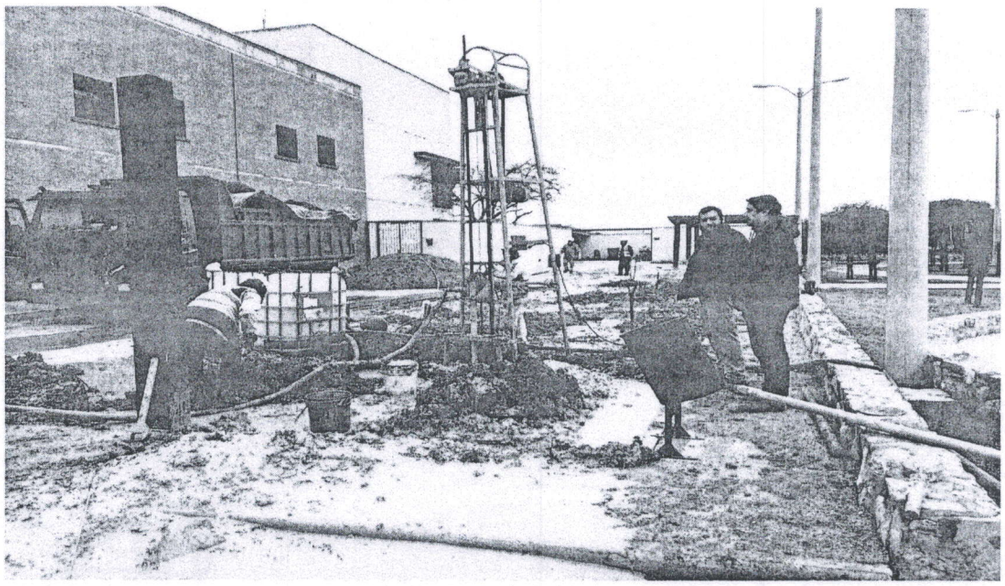

Vista general de la obra

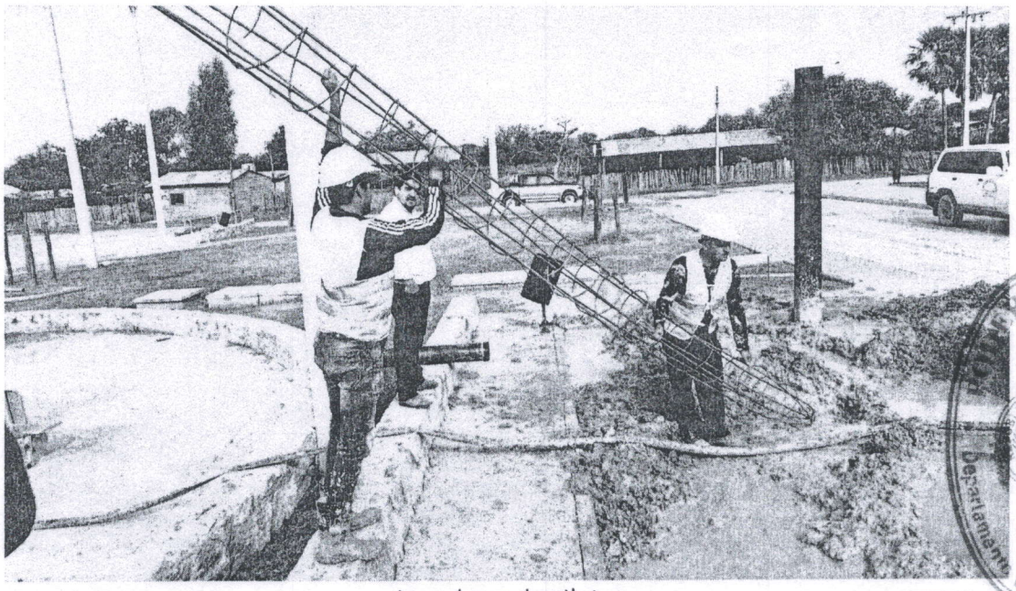

Armaduras de pilotes

PODER JUDICIAL
Departamento de Obras y Proyectos
D.I.F.

Diego Baez Vega
Técnico
Dp.to. Obras y Proyectos - D.I.F.

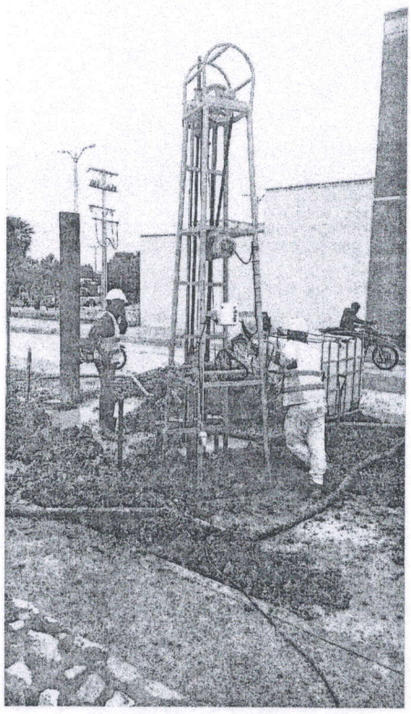

Perforación de fosas

Cargamento de hormigón

Nuevo replanteo de pilotes, cabezales y pilares

PODER JUDICIAL
D.I.F
Dpto. Obras y Proyectos

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

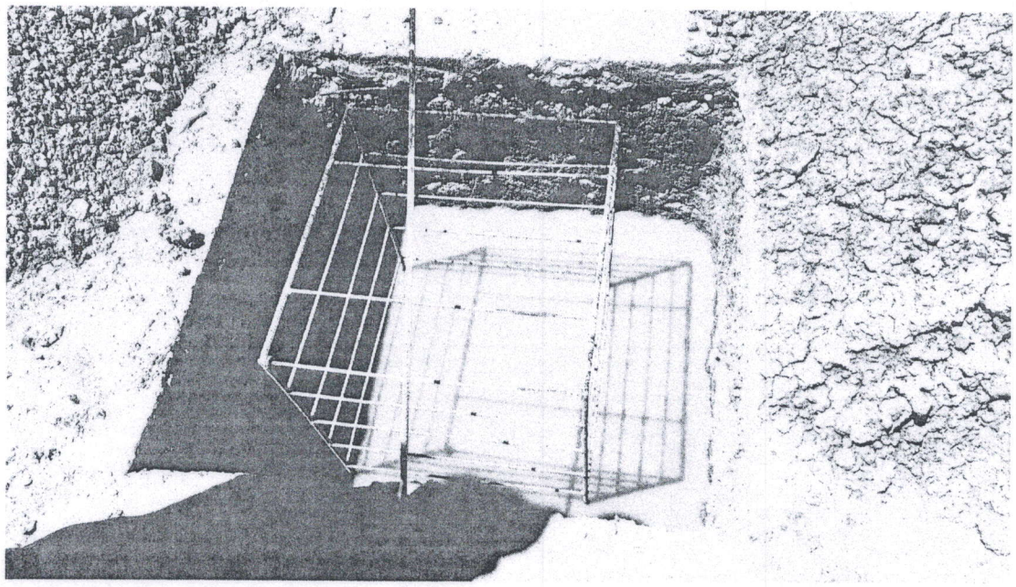

Zapatas realizadas por el Contratista rechazadas por la Supervision de Obras

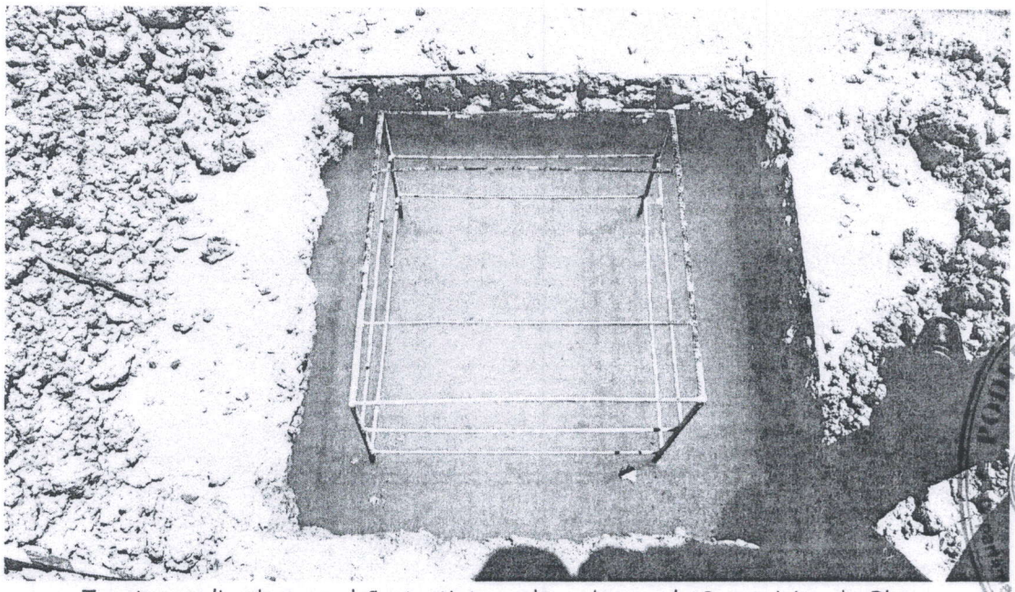

Zapatas realizadas por el Contratista rechazadas por la Supervision de Obras

PODER JUDICIAL D.I.F.

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA — CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

G-SIL
CONSTRUCTORA – CONSULTORA
San Lorenzo - Paraguay

CONTRATO Nº 25/2019.

CONTRATACION DIRECTA ID: 369.153 - CONSTRUCCION DE TECHO PARA EL SECTOR DE ESTACIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA SEDE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO CASADO

LIBRO DE OBRA

FECHA:

Nº 0000001

CONTRATISTA : G-SIL CONSTRUCTORA & CONSULTORA DEL ARQ. JAVIER GONZALEZ

FISCALIZADOR CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY :

LOCALIDAD : PUERTO CASADO

DEPARTAMENTO: ALTO PARAGUAY

ESTADO DEL TIEMPO : Sol

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO PARA EL SECTOR DE ESTACIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA SEDE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO CASADO

"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY"

09-MAR-2020

ACTA DE INICIO

Se procede a la firma del Acta de inicio de Obras en la fecha y en presencia del Arq. Diego Baez, Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física de la C.S.J., el Arq. Javier Gonzalez, el Sr. Silvio Bogarin, Adm. de Contrato y el Lic Arcadio Gomez, Adm. de la Circunscripción.

A tal efecto se firman 4 (cuatro) ejemplares de la presente acta en el lugar y fecha indicados.

CONTRATISTA

Diego Báez Vega
Supervisor de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

FISCALIZACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA — CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

G-SIL
CONSTRUCTORA – CONSULTORA
San Lorenzo - Paraguay

CONTRATO Nº 25/2019.

CONTRATACION DIRECTA ID: 369.153 - CONSTRUCCION DE TECHO PARA EL SECTOR DE ESTACIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA SEDE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO CASADO

LIBRO DE OBRA

FECHA:

Nº 0000002

CONTRATISTA : G-SIL CONSTRUCTORA & CONSULTORA DEL ARQ. JAVIER GONZALEZ

FISCALIZADOR CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY :

LOCALIDAD : PUERTO CASADO

DEPARTAMENTO: ALTO PARAGUAY

ESTADO DEL TIEMPO : Lluvioso y nublado

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO PARA EL SECTOR DE ESTACIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA SEDE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO CASADO

"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY"

21 - JUN - 2020

(1) Luego de la habilitación de la cuarentena inteligente dispuesta por el Gobierno, se da inicio a la ejecución de los pilotes según planos y especificaciones técnicas.

(2) Se realizo el re-plantéo de obras de acuerdo a los nuevos planos provistos por la D.I.T.

(3) Se observa recepción de materiales de acuerdo a los rubros a ejecutarse y la presencia de 10 obreros.

(4) A la fecha se solicita a la Empresa contratista la prorroga de la Boleta de Anticipo.

CONTRATISTA

Diego Báez Vega
Supervisor de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.P.

FISCALIZACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA — CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

G-SIL CONSTRUCTORA – CONSULTORA
San Lorenzo - Paraguay

CONTRATO Nº 25/2019.

CONTRATACION DIRECTA ID: 369.153 - CONSTRUCCION DE TECHO PARA EL SECTOR DE ESTACIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA SEDE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO CASADO

LIBRO DE OBRA

FECHA:

Nº 0000003

CONTRATISTA : G-SIL CONSTRUCTORA & CONSULTORA DEL ARQ. JAVIER GONZALEZ

FISCALIZADOR CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY :

LOCALIDAD : PUERTO CASADO

DEPARTAMENTO: ALTO PARAGUAY

ESTADO DEL TIEMPO : Nublado

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO PARA EL SECTOR DE ESTACIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA SEDE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO CASADO

"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY"

02- JUN - 2020

Actividades en Obras:

1. Continuan los trabajos de perforacion y preparacion de armaduras para los pilotes y cabezales, se verifica que las varillas corresponden a las especificaciones tecnicas, ademas de la profundidad de 6 m. para los pilotes
2. Se verifica que los espesores de las chapas de la estructura del techo metalico corresponden a las especificaciones tecnicas
3. Se cargaron 3 fustes/pilotes.

CONTRATISTA

Diego Báez Vega
Supervisor de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

FISCALIZACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA — CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

G-SIL
CONSTRUCTORA – CONSULTORA
San Lorenzo - Paraguay

CONTRATO Nº 25/2019.

CONTRATACION DIRECTA ID: 369.153 - CONSTRUCCION DE TECHO PARA EL SECTOR DE ESTACIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA SEDE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO CASADO

LIBRO DE OBRA

FECHA:

Nº 0000004

CONTRATISTA : G-SIL CONSTRUCTORA & CONSULTORA DEL ARQ. JAVIER GONZALEZ

FISCALIZADOR CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY :

LOCALIDAD : PUERTO CASADO

DEPARTAMENTO: ALTO PARAGUAY

ESTADO DEL TIEMPO : NUBLADO.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO PARA EL SECTOR DE ESTACIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA SEDE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO CASADO

"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY"

03- JUN- 2020

Actividades en Obras.

Continuan los trabajos de perforación y descarga de pilotes, se estima para el día de hoy completar 3 (tres) pilotes más llegando así a 6 (seis). Los (las) 3 restantes se completaran en la jornada laboral del día de mañana.

Continuan la misma cantidad de Obreros del día anterior.

CONTRATISTA

Diego Báez Vega
Supervisor de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.P.

FISCALIZACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA — CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

G-SIL
CONSTRUCTORA – CONSULTORA
San Lorenzo - Paraguay

CONTRATO Nº 25/2019.

CONTRATACION DIRECTA ID: 369.153 - CONSTRUCCION DE TECHO PARA EL SECTOR DE ESTACIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA SEDE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO CASADO

LIBRO DE OBRA

FECHA:

CONTRATISTA: G-SIL CONSTRUCTORA & CONSULTORA DEL ARQ. JAVIER GONZALEZ

Nº 0000005

FISCALIZADOR CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY:

LOCALIDAD: PUERTO CASADO

DEPARTAMENTO: ALTO PARAGUAY

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO PARA EL SECTOR DE ESTACIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA SEDE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO CASADO

"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY"

04- Jun - 2020.

Sin actividad por la intemperie del tiempo (Lluvia).

Continuacion los trabajos si el clima mejora

Diego Báez Vega
Superviser de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CONTRATISTA

FISCALIZACION
