Saltos del Guairá, 31 de agosto de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO 29 DE JUNIO KM 5´´** con ID: N.º 431.682 Contrato N.º 80/2023, adjudicada a **LM EMPRENDIMIENTOS.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Arq. Eduardo Isaac Cuevas Fleitas
Registro N°4.716
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO 29 DE JUNIO KM 5

UBICACIÓN: BARRIO 29 DE JUNIO KM 5

ID NRO: 431.682

CONTRATO NRO: 80/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nº 01 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginio Bogado
Fiscal de Obras

SALTOS DEL GUAIRA 31 **DE** AGOSTO **DE** 2.023

RUC: 2403835-0
Dirección: Gral. Eugenio A. Garay c/ Camilo Recalde - Barrio San Francisco
Cel: 0983 800938
Correo: juanln420@gmail.com

Saltos del Guairá, 29 de agosto de 2023.-

Señor:
SR. HECTOR FABIAN MORAN
INTENDENTE MUNICIPAL
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar la Certificación de la Obra N° 01 referente al llamado a Licitación por Contratación Directa, ID N° 431682"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO 29 DE JUNIO KM 5", Contrato N° 80/2023, para su estudio y consideración por parte de la Fiscalización de Obra de la Institución a su digno cargo, de acuerdo al siguiente detalle:

Certificación Nº 01	64.268.000
Retención de I.V.A 30%	1.752.764
Retención fondo de reparo	3.213.400
Certificación Neta	59.301.836

Atentamente

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

JUAN FELIX LEON C.
LM EMPRENDIMIENTOS
RUC: 2403835-0

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 2465
FECHA 29/08/23 HORA 08:17
CANT HOJAS 7) (1 FOLT
NUMERO DE CEL: 83 806938 MónicaG
FIRMA

Ítems del llamado **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO 29 DE JUNIO -KM5 con ID: 431682**

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	420	6.150	2.583.000
2	72131601-9974	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	420	6.396	2.686.320
3	72103004-001	Construccion cordon de hormigon	Metro lineal	173	38.000	6.574.000
4	72101510-005	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	8,4	1.881.000	15.800.400
5	72131701-002	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	2,3	2.123.600	4.884.280
6	72131701-002	Construccioon de Empedrado incluye colocación de piedra 6ta y compactaciòn.	Metros cuadrados	336	65.000	21.840.000
7	72141505-001	Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	420	20.000	8.400.000
8	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
				Precio Total		64.268.000

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

Firma
Nombre: JUAN FELIX LEON CAÑETE
En calidad de: PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000744

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL Bº 29 DE JUNIO-KM 5

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 14-08-2023

LICITACIÓN Nº: 431682 **FECHA DE INICIO:** 14-08-2023

FECHA CONTRATO: 04-08-2023 **MONTO:** 64.268.000

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: BARRIO 29 DE JUNIO KM 5

AVANCES DE OBRA

- REPLANTEO Y MARCACION
- PREPARACION DE TERRENO, MOVIMIENTO DE SUELO
- CONSTRUCCION DE HORMIGON - CORDON

16-08-23

- COLOCACION DE CORDON DE Hº Aº
- PREPARACION DE BADEN

17-18/08/2023

- COLOCACION DE CORDON
- PREPARACION DE BADEN DE Hº A

OBSERVACIÓN:

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-8

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Fiscal de Obras.

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000745

OBRA: EMPEDRADO EN EL BARRIO 29 DE JUNIO - KM 5

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 19-08-2023

CITACIÓN Nº: 431682 FECHA DE INICIO: 14-08-23

FECHA CONTRATO: 04-08-2023 MONTO: 64.268.000

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: BARRIO 29 DE JUNIO - KM 5

AVANCES DE OBRA

- PREPARACION DE COLCHON DE ARENA
- CANAL DE DESAGUE PLUVIAL
- COLOCACION DE PIEDRA

21-08-23

- COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRA

22-08-23

- COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRA

OBSERVACIÓN:

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginio Bogado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000746

OBRA: EMPEDRADO EN EL BARRIO 29 DE JUNIO - KM 5

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 23-08-23

CITACIÓN N°: 431682 FECHA DE INICIO: 14-08-23

FECHA CONTRATO: 04-08-23 MONTO: 64.268.000

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: BARRIO 29 DE JUNIO - KM 5.

AVANCES DE OBRA

- PREPARACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL
- COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRA

24-08-23

- COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRA

25-26/08/23

- COLOCACION DE COLCHON DE ARENA
- COLOCACION DE PIEDRA

OBSERVACIÓN:

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Becgado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000747

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO 29 DE JUNIO - KM 5

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 28-08-2023

CITACIÓN N°: 431682 **FECHA DE INICIO:** 14-08-2023

FECHA CONTRATO: 04-08-2023 **MONTO:** 04.268.000

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: BARRIO 29 DE JUNIO KM 5-

AVANCES DE OBRA

- CONSTRUCCION DE BADEN
- COLCHON DE ARENA
- TERMINACION DE EMPEDRADO
- COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA 6TA Y COMPACTACION
- LIMPIEZA FINAL

OBSERVACIÓN:

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obra

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

FIRMA FISCAL DE OBRA

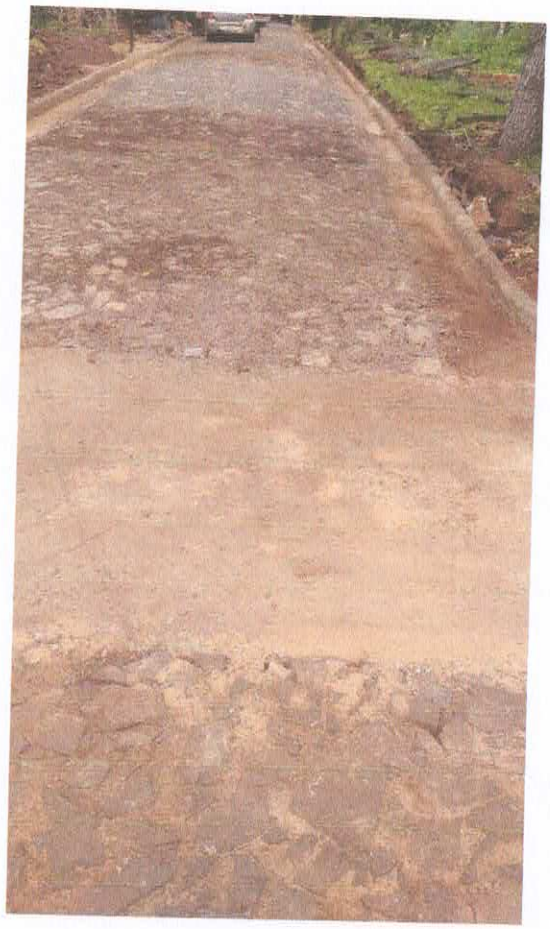

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

B° 29 ~~DE~~ JUNIO KM 5
