

## Asesoría Jurídica

**DICTAMEN N° 279 /2025** - Ref.: Expte. DINAC N° 243.685 – UOC S/Solicitud de Ampliación y otras modificaciones del Contrato N° 151/2024 – Menor Cuantía Nacional N° 98/24 “Adecuación de Áreas de Exportación de Cargas Aéreas del AISP”.

Asunción, 21 de agosto del 2025.-

### A LA SECRETARIA GENERAL:

Con relación al expediente de referencia, a través del cual se solicita emitir parecer jurídico correspondiente con el pedido de Ampliación y otras modificaciones del Contrato N° 151/2024 suscrito en el marco del llamado a Menor Cuantía Nacional N° 98/24 “Adecuación de Áreas de Exportación de Cargas Aéreas del AISP”, con la firma EN OBRAS del Ing. NELSON FEDERICO SEGOVIA.-

### La Asesoría Jurídica, al respecto expresa:

El Contrato N° 151/2024 suscrito con la firma EN OBRAS del ING. NELSON FEDERICO SEGOVIA en el marco del llamado a MENOR CUANTIA NACIONAL N° 98/2024 “ADECUACION DE AREAS DE EXPORTACION DE CARGAS AEREAS DEL AISP” fue suscrito en fecha 03 de diciembre de 2024 y establece la vigencia del mismo, desde la publicación del contrato en el SICP, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras por un monto Gs. 280.758.800 (guaraníes Doscientos Ochenta Millones Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos) IVA incluido.

Por Dictamen de fecha 13/03/2025 la Administradora del Contrato resuelve conceder la suspensión de los plazos contractuales y de los trabajos del Contrato N° 151/2024 suscrito entre la DINAC y la Firma EN OBRAS, desde el 20 de marzo de 2025 hasta la aprobación de la modificación de los plazos propuestos por el contratista. Asimismo, resuelve gestionar la Ampliación de Contrato por un valor de Gs. 55.775.000 (Guaraníes Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil y 9 (nueve) días de ampliación del plazo de entrega para la ejecución de los trabajos complementarios, esto en vista al cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos y así permitir la prosecución de la obra bajo condiciones óptimas y conforme a las necesidades reales del proyecto. En el cual se adjunta la siguiente planilla;

RUBROS CON CANTIDADES MAYORES					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA incluido)
6	Provision de Materiales para construccion de Zapata	M3	4	₡ 1.500.000	₡ 6.000.000
7	Mano de obra / Construccion de Zapata	M3	4	₡ 650.000	₡ 2.600.000
TOTAL					₡ 8.600.000

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Impermeabilización de losa	M2	85	₡ 150.000	₡ 12.750.000

Mgtr. Abg. Arnaldo Balbuena  
 Coordinador de Gestión Administrativa  
 Asesoría Jurídica  
 DINAC

Mgtr. Abg. Ana Gabriela Ortiz N.  
 Asesora Jurídica  
 DINAC

ENCARGADO DE DESPACHO  
 ASESORIA JURIDICA  
 DINAC

08 09  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 24  
 25 26  
 27 28  
 29 30  
 31 01  
 02 03  
 04 05  
 06 07  
 08 09  
 10 11  
 12 13  
 14 15  
 16 17  
 18 19  
 20 21  
 22 23  
 24 25  
 26 27  
 28 29  
 30 31  
 01 02  
 03 04  
 05 06  
 07 08  
 09 10  
 11 12  
 13 14  
 15 16  
 17 18  
 19 20  
 21 22  
 23 2

## Asesoría Jurídica

2	Contrapiso de cascotes con carpeta impermeable	M2	85	₡ 110.000	₡ 9.350.000
3	Protección mecánica de losa con piso cerámico alto tránsito	M2	85	₡ 220.000	₡ 18.700.000
4	Muro de ladrillos comunes borde losa con revoque impermeable y pintura impermeable y tela bidim+ caños de desagüe	M2	85	₡ 75.000	₡ 6.375.000
TOTAL					₡ 47.175.000

TOTAL AMPLIACION	
RUBROS CON CANTIDADES MAYORES	₡ 8.600.000
RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO	₡ 47.175.000
TOTAL	₡ 55.775.000

Se solicita la modificación de la unidad de medida del Ítem N° 04 debiendo ser; según la planilla;

RUBRO A REALIZAR CON MODIFICACION DE UNIDAD DE MEDIDA					
Ítem	Descripción	ATRIBUTOS	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA incluido)
4	Losarap	M2	85	₡ 315.000	₡ 26.775.000

Por Memorandum N° 308/2025, el Dpto. de Presupuesto informa que la Actividad 1.1.3 SERVICIOS AEROPORTUARIOS, cuenta con disponibilidad presupuestaria en el OG 522-CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL para cubrir lo solicitado en el presente Ejercicio Fiscal.

Por Dictamen UOC N° 21/2024 del 14 de julio del 2025, el Coordinador de la UOC recomienda la modificación planteada en cuanto a la solicitud hecha por la firma En Obras y aprobada por la Administradora del Contrato.-

Ahora bien, la **Ley N° 7021/22 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS**, en su capítulo IX Régimen Jurídico de los Contratos - **Artículo 65.-** Derechos de las Contratantes, establece que: Las contratantes gozan de los siguientes derechos: inc. b) *Modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, si hubiere mérito para las mismas.-*

Así mismo, la **Resolución DNCP N° 230/2025, SECCIÓN VI, ARTÍCULO N° 181.** Modificaciones al amparo del Interés Público comprometido. *“Las modificaciones a los contratos, amparadas en las disposiciones contenidas en el artículo 65 inciso b) de la Ley, deberán considerar, a más de las reglas que surgen del propio texto del artículo en cuestión, una limitación de hasta el 20% (veinte por ciento) del valor total del contrato, de forma separada o conjunta, incluidas las modificaciones realizadas conforme al artículo 67 de la citada Ley, según sea el caso. En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza del contrato”.*

Mag. Abg. Ana Gabriela Ortiz N.  
Asesora Jurídica  
DINAC

Mgr. Abg. Arnaldo Balbuena  
Coordinador de Gestión Administrativa  
Asesoría Jurídica



## Asesoría Jurídica

Así también la referida **Resolución** en su **Artículo N° 182** Requisitos del dictamen. *El Dictamen que justifique la modificación contractual al amparo del artículo 65 inciso b) de la Ley deberá cumplir necesariamente con los siguientes requisitos:*

a) **Exposición acabada y circunstanciada de los motivos que justifican la modificación.**

A partir del análisis de los antecedentes expuestos por la administración, la modificación solicitada se fundamenta En que en vista de que las obras de adecuación de las áreas de exportación de cargas aéreas del AISP requirieron tareas adicionales no previstas en el contrato inicial, se solicita una ampliación del plazo de entrega nueve (9) días calendario, una ampliación del monto contractual por Gs. 55.775.000, que incluye tanto los rubros con cantidades mayores, como los rubros no contemplados (impermeabilización, contrapiso, protección mecánica y muro), así como la modificación de la unidad de medida del Ítem N° 04 a 85 m<sup>2</sup>, todo ello para reflejar con precisión el alcance real del trabajo, asegurar la correcta finalización de la obra, preservar la operatividad eficiente del área de exportación y optimizar el uso de recursos públicos en un contexto donde el transporte de carga aérea ha crecido significativamente.

Esta modificación no altera el objeto ni las condiciones esenciales del contrato, sino que busca dotar de mayor precisión y coherencia a los instrumentos contractuales, facilitando su aplicación práctica y evitando futuras interpretaciones contradictorias.

b) **Una explicación clara que sustente de qué forma se encuentra comprometido el interés público.**

El interés público se encuentra claramente comprometido debido a que la adecuación de las áreas de exportación de cargas aéreas del AISP es esencial para garantizar la conservación, seguridad y operatividad eficiente de un servicio estratégico nacional. Las labores complementarias solicitadas de ampliación de plazo, ajustes presupuestarios y corrección técnica en la unidad de medida, son indispensables para mantener infraestructura adecuada ante el creciente volumen de carga, preservando los estándares de seguridad que protegen a las personas, la mercancía y la infraestructura misma. Si no se implementan estos ajustes, se corre el riesgo de enfrentar demoras logísticas, posibles interrupciones en el despacho aduanero y deficiencias en el control contra actividades ilícitas, lo que impactaría negativamente en el comercio internacional, los ingresos estatales y la imagen del país como centro de exportación aérea confiable.

En este estado de cosas, nos gustaría definir al interés público citando a Escola, como “*el resultado de un conjunto de intereses compartidos y coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que se asigna a toda la comunidad como consecuencia de esa mayoría, y que encuentra su origen en el querer axiológico de esos individuos, apareciendo con un contenido concreto y determinable, actual, eventual o potencial, personal y directo respecto de ellos, que pueden reconocer en él su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los intereses individuales que se le opongan o lo afecten, a los que desplaza o sustituye, sin aniquilarlos*”.

c) **Las razones por las cuales dichas circunstancias no pudieron ser previstas al tiempo de la programación del llamado que derivó en el contrato a ser modificado.**


Las circunstancias que motivan la solicitud de modificación del contrato no pudieron ser previstas al momento de la programación del llamado debido a su naturaleza imprevisible y técnica. Durante la ejecución de las obras de adecuación de las áreas de exportación de cargas aéreas del AISP, se identificaron necesidades adicionales que no fueron evidentes en la fase de planificación. Estas necesidades surgieron a partir de condiciones específicas del terreno y de la infraestructura existente, que solo pudieron ser evaluadas con precisión una vez iniciados los trabajos.

d) **Una explicación clara de los motivos por los cuales:**

i. **La aplicación de un procedimiento ordinario o excepcional no resulta conveniente para la satisfacción de las necesidades que originan la contratación,**

Mag. Abg. Ana Gabriela Ortiz N.  
Asesoría Jurídica  
AV. MCAL. LÓPEZ E. MICE. PÓTE. SANCHEZ Y 22 DE SETIEMBRE - EDIF. MIDON 5 - PISO 5  
TELEF. - FAX (595-21) 204-205

Mgtr. Abg. Arnaldo Balbuena  
Coordinador de Gestión Administrativa  
Asesoría Jurídica  
DINAC

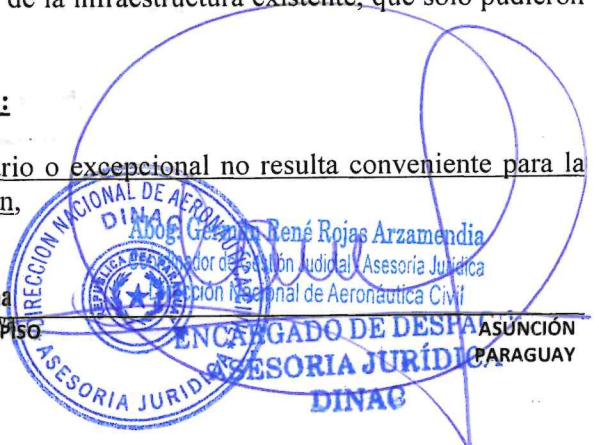

## Asesoría Jurídica

Se ha recurrido a la figura prevista en el Inc. b) del Art. 65 de la Ley 7021/22, ante las limitaciones establecidas en el Artículo 67 de la Ley 7021/22 que impide recurrir a los procedimientos ordinarios.

ii. No existiría violación a los principios previstos en el Artículo 4° de la Ley N° 7021/22

No existe violación alguna a los principios que rigen la actividad de las contrataciones públicas. La presente modificación se hubiera dado cualquiera sea el adjudicado. Por el contrario, no realizar la modificación en cuestión si llevará a esta Contratante a incurrir en violación de disposiciones vigentes. Por tanto, se hace uso de la prerrogativa que faculta el *Ley 7021/22 Artículo 65.- Derechos de las Contratantes, establece que: Las contratantes gozan de los siguientes derechos: inc. b) Modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, si hubiere mérito para las mismas.* Velando por el interés público como se ha explicado en detalle más arriba, razón por la que podemos afirmar que no existe violación alguna a lo dispuesto en el Artículo 4° de la Ley 7021/22.

iii. No se alteran, de manera sustancial, la naturaleza ni la finalidad del contrato

La presente modificación no altera de manera alguna la naturaleza ni la finalidad del contrato, debido a que la solicitud mantiene el objeto, la finalidad y naturaleza de lo adjudicado.

POR TANTO, a mérito de lo expuesto precedentemente, conforme al Dictamen de la UOC y a la solicitud de la Administradora del Contrato, es parecer de esta Asesoría Jurídica, que se podrá hacer lugar al pedido de Ampliación y otras modificaciones del Contrato N° 151/2024 suscrito en el marco del llamado a Menor Cuantía Nacional N° 98/24 “Adecuación de Áreas de Exportación de Cargas Aéreas del AISP”, con la firma EN OBRAS del Ing. NELSON FEDERICO SEGOVIA.-

*M. Abg. Ana Gabriela Ortiz N.*  
Asesora Jurídica  
DINAC

*Mgr. Abg. Arnaldo Balbuena*  
Coordinador de Gestión Administrativa  
Asesoría Jurídica  
DINAC

*Germán René Rojas Arzamendia*  
Coordinador de Gestión Judicial - Asesoría Jurídica  
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil



<b>DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL</b>					
EXPERIENTE DINAC N°:					
<input checked="" type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> DAC	<input type="checkbox"/> DMH	<input type="checkbox"/> GTIC	
<input checked="" type="checkbox"/> SDN	<input type="checkbox"/> SDN	<input type="checkbox"/> STA	<input type="checkbox"/> SDNV	<input type="checkbox"/> RAN	
<input type="checkbox"/> SDIA	<input type="checkbox"/> SDIA	<input type="checkbox"/> SAVSEC	<input type="checkbox"/> SAVSEC	<input type="checkbox"/> SDSA	
<input type="checkbox"/> CIPAA	<input type="checkbox"/> CIPAA	<input type="checkbox"/> CIPAA	<input type="checkbox"/> CIPAA	<input type="checkbox"/> RR.PP.	
<input checked="" type="checkbox"/> Dictamen	<input checked="" type="checkbox"/> Dar Cumplimiento	<input type="checkbox"/> Comentario			
<input checked="" type="checkbox"/> Informar	<input checked="" type="checkbox"/> Proponer Respuesta	<input type="checkbox"/> Proyecto (Nota/Res/Decreto)			
<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/> Tomar Conocimiento	<input type="checkbox"/> Urgente.....Hs.			
Observaciones					
