



GM/U.O.C. N° 175/2025.-

San Juan Bautista Misiones, 14 de noviembre de 2.025.-

Señor:

Dr. Agustín Encina, Director Nacional

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

De mi mayor consideración:

En nombre de la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) de la Gobernación de Misiones, me dirijo a Usted con el objeto de saludarle cordialmente y a la vez contestar la Nota DGNC N° 8964/2025.

Con respecto a la observación que establece:

Exp.: 323844; 1. Consultamos a la contratante, en qué periodo o plazo serán ejecutados los nuevos rubros objetos de la ampliación, esto es considerando que el plazo originalmente pactado sería para la ejecución de los rubros adjudicados y sobre los cuales se ha firmado el contrato. 2. Así mismo, la presente ampliación es plurianual, sin embargo, en la adenda no se ha establecido ampliación de plazo alguno, al respecto, se solicita a la contratante se sirva aclarar. Esto es considerando la fecha de suscripción del contrato original (5/11/2024), plazo de ejecución establecido en le PBC (300 días corridos, excluido el período de movilización), y la fecha de recepción de la orden de inicio (14/11/2024).

Se cumple en manifestar cuanto sigue:

Conforme a lo informado por la Secretaría de Obras Públicas y por la Fiscalización de Obras de esta institución, se encuentra en proceso de formalización una ampliación del plazo de ejecución por razones técnicas del Contrato de Adjudicación N° 37/2024, la cual será incorporada mediante el instrumento administrativo correspondiente.

Dicha ampliación de plazo obedece a razones estrictamente técnicas, vinculadas a la incorporación de rubros adicionales que han sido identificados durante el desarrollo de los trabajos y que resultan indispensables para asegurar la correcta y completa ejecución del proyecto. Estos rubros adicionales son precisamente los que sustentan la ampliación de monto remitida a esa Dirección Nacional para su evaluación. En ese contexto, la modificación del cronograma contractual permitirá establecer con precisión el periodo en el cual serán ejecutados los nuevos rubros, garantizando su adecuada integración dentro del alcance total de la obra. La ampliación del plazo, actualmente en trámite, será comunicada a la DNCP una vez concluida su formalización administrativa, en estricto cumplimiento del marco normativo aplicable.

Asimismo, es pertinente aclarar que la característica plurianual de la presente adenda se encuentra plenamente justificada, toda vez que, conforme a lo indicado precedentemente, la ejecución total de la obra —considerando el alcance ampliado y el

nuevo plazo en trámite— se extenderá hasta el próximo ejercicio fiscal, lo que hace necesaria su programación y registro como comprometido plurianual. En consecuencia, la ampliación del plazo en formalización subsana y da fundamento a los dos puntos observados:

Define el periodo de ejecución de los nuevos rubros incorporados.

Justifica la plurianualidad de la adenda, atendiendo al hecho de que la conclusión de la obra, con los rubros ampliados, excederá el ejercicio fiscal en curso.


Finalmente, se deja constancia de que esta Convocante realizará las actualizaciones correspondientes ante la DNCP una vez culminado el proceso interno de formalización del nuevo plazo contractual, asegurando la coherencia entre el contrato original, la adenda de ampliación y las obligaciones derivadas del cronograma de obra.

Con respecto a la observación que establece:

Entre los documentos de antecedentes de estimación de costos, no se visualiza la nota de pedido de presupuesto. Se solicita adjuntar dichos documentos.

Se cumple en manifestar que se remite la documentación solicitada a los efectos de subsanar la referida observación.

Sin otro motivo en particular y me despido de Ud. con el debido respeto que se merece.

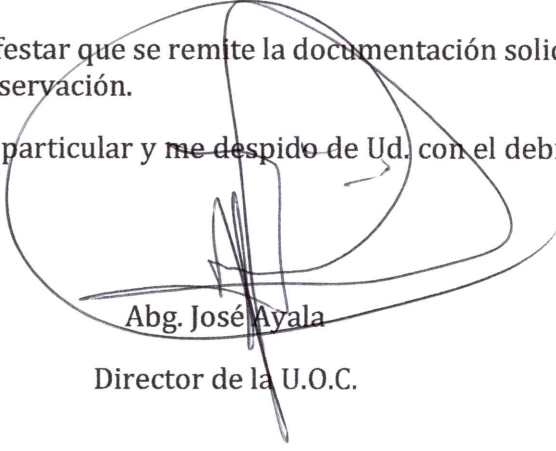

Abg. José Ayala

Director de la U.O.C.





San Juan Bautista Misiones, 30 de setiembre de 2.025.-

Señores:

JORGE FENANDO DIAZ LAVIGNE


De mi mayor consideración:

En nombre de la **U.O.C. de la Gobernación de Misiones**, me dirijo a Ustedes con el objeto de saludarles cordialmente y a la vez solicitar presupuesto de los ítems individualizados en la planilla de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Contrataciones Públicas.


ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DIA ONCOLOGICO. CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO. CONSTRUCCION EN PLANTA BAJA Y ALTA			
	Nueva acometida electrica en media tension (70 ml. 2 columnas de 12/200 y 1 de 9)	gl	1,00	
	Demolicion de rampa para acceso oxigeno	gl	1,00	
	Revision y verificacion de calculos estructurales.	gl	1,00	
	Excavacion para pilotes	ml	650,00	
	Pilotes de Ho D= 0,40	ml	210,00	
	Pilotes de Ho D= 0,30	ml	440,00	
	Cabezales para pilotes	m3	30,83	
	parapeto de 0,30 revocado	ml	68,00	
	Instalacion y provision de ventiladores de techo	un	20,00	
	Instalaciones de ductos de cobre para gas y conexiones varias, incluye soporte de los equipos, AA.	un	22,00	

Cenefa de chapa con estructura metalica en Acceso, incluye letras corporeas en acero inoxidable con luces.	un	1,00	
Canaletas desarrollo 0.60 y bajadas	ml	96,00	
Reja acceso lateral	m2	12,00	
Mamparas divisorias de Eukatex	m2	79,60	
CORTINAS PVC ANTIBACTERIALES, COMO DIVISORIAS, 4 UNIDADES. PROVICION Y COLOCACION	UN	4,00	
Puertas para mamparas	un	6,00	
Cenefas DE 15 ML CON LETRAS CORPOREAS Y LUCES LED DETRAS	UN	1,00	

Sin otro motivo en particular, me despido de Ustedes con el debido respeto que se merecen.


Abg. José Ayala

Director de la U.O.C

Recibido: 
JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

San Juan Bautista Misiones, 01 de octubre de 2.025.-

Señores:


JAVIER GONZALEZ CARDOZO

CONSTRUCCIONES DEL FUTURO

De mi mayor consideración:

En nombre de la **U.O.C. de la Gobernación de Misiones**, me dirijo a Ustedes con el objeto de saludarles cordialmente y a la vez solicitar presupuesto de los ítems individualizados en la planilla de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Contrataciones Públicas.


ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DIA ONCOLOGICO. CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO. CONSTRUCCION EN PLANTA BAJA Y ALTA			
	Nueva acometida electrica en media tension (70 ml, 2 columnas de 12/200 y 1 de 9)	gl	1,00	
	Demolicion de rampa para acceso oxigeno	gl	1,00	
	Revision y verificacion de calculos estructurales.	gl	1,00	
	Excavacion para pilotes	ml	650,00	
	Pilotes de Ho D= 0,40	ml	210,00	
	Pilotes de Ho D= 0,30	ml	440,00	
	Cabezales para pilotes	m3	30,83	
	parapeto de 0,30 revocado	ml	68,00	
	Instalacion y provision de ventiladores de techo	un	20,00	



CONSTRUCCIONES DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 320470-8

Instalaciones de ductos de cobre para gas y conexiones varias, incluye soporte de los equipos, AA.	un	22,00	
Cenefa de chapa con estructura metalica en Acceso. incluye letras corporeas en acero inoxidable con luces.	un	1,00	
Canaletas desarrollo 0.60 y bajadas	m1	96,00	
Reja acceso lateral	m2	12,00	
Mamparas divisorias de Eukatex	m2	79,60	
CORTINAS PVC ANTIBACTERIALES, COMO DIVISORIAS, 4 UNIDADES. PROVICION Y COLOCACION	UN	4,00	
Puertas para mamparas	un	6,00	
Cenefas DE 15 ML CON LETRAS CORPOREAS Y LUCES LED DETRAS	UN	1,00	

Sin otro motivo en particular, me despido de Ustedes con el debido respeto que se merecen.

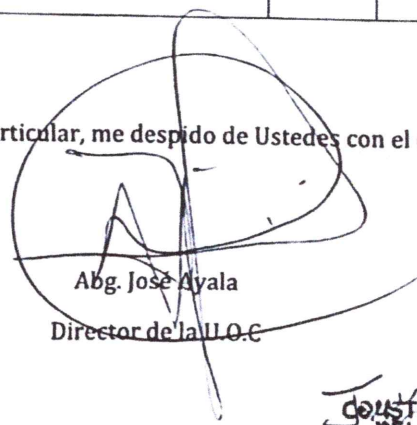

Abg. José Ayala
Director de la U.O.C

CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO
Javier Gonzalez
R.U.C 300416 - 8



GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

San Juan Bautista Misiones, 01 de octubre de 2.025.-

Señores:


JUAN ANTONIO CHAMORRO ESCOBAR

CONSTRUCTORA SAN ANTONIO

De mi mayor consideración:


En nombre de la **U.O.C. de la Gobernación de Misiones**, me dirijo a Ustedes con el objeto de saludarles cordialmente y a la vez solicitar presupuesto de los ítems individualizados en la planilla de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Contrataciones Públicas.

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DIA ONCOLOGICO. CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO. CONSTRUCCION EN PLANTA BAJA Y ALTA			
	Nueva acometida electrica en media tension (70 ml, 2 columnas de 12/200 y 1 de 9)	gl	1,00	
	Demolicion de rampa para acceso oxigeno	gl	1,00	
	Revision y verificacion de calculos estructurales.	gl	1,00	
	Excavacion para pilotes	ml	650,00	
	Pilotes de Ho D= 0,40	ml	210,00	
	Pilotes de Ho D= 0,30	ml	440,00	
	Cabezales para pilotes	m3	30,83	
	parapeto de 0,30 revocado	ml	68,00	
	Instalacion y provision de ventiladores de techo	un	20,00	


CONSTRUCTORA
San Antonio

Instalaciones de ductos de cobre para gas y conexiones varias, incluye soporte de los equipos, AA.	un	22,00	
Geneza de chapa con estructura metalica en Acceso, incluye letras corporeas en acero inoxidable con luces.	un	1,00	
Canaletas desarrollo 0,60 y bajadas	ml	96,00	
Reja acceso lateral	m2	12,00	
Mamparas divisorias de Eukatex	m2	79,60	
CORTINAS PVC ANTIBACTERIALES, COMO DIVISORIAS, 4 UNIDADES. PROVISION Y COLOCACION	UN	4,00	
Puertas para mamparas	un	6,00	
Cenefas DE 15 ML. CON LETRAS CORPOREAS Y LUCES LED DETRAS	UN	1,00	

Sin otro motivo en particular, me despido de Ustedes con el debido respeto que se merecen.

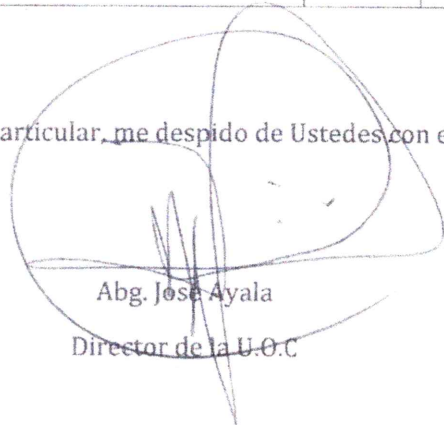

Abg. José Ayala
Director de la U.O.C

San Antonio
CONSTRUCTORA
San Antonio
Ruc: 6223846 - 9
