SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

Asunción, de septiembre de 2021

Señor

Ing. Fredy G. Ramírez V.

Universidad Nacional de Caaguazú.

Coordinador de Fiscalización

Presente

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – LPN/SBE N° 02/2020. "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN". PLURIANUAL. LOTE 06. ID N° 360254. CONTRATO N° 31/2020.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en relación a los cálculos de afectación por días de lluvia, del mes de septiembre de 2021 de nuestro Lote. Conforme a las nuevas disposiciones, hemos realizado los ajustes y conteo de las incidencias climáticas, conforme al Libro de Obras e Informe de Registros de lluvia de la DINAC para el siguiente periodo.

Periodo	Certificado	Registro DINAC	Incidencias Libro de Obras	Cantidad de días de prórroga
Septiembre 2021	Certificado N° 06 – OS2	10 días	5 días	5 días

Sin nada más que agregar, me despido cordialmente.

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recibido por: Franco Gonzalez

DIA	MES	AÑO	HORA
06	10	2021	09:00

Dirección: Pariri N° 1013 casi Av. Fernando de la Mora
Tel.: (595 21) 550 283 • Sitio web: www.scc.com.py

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CAAZAPÁ	26° 10' 31,70"	56° 21' 16,92"	142 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									0,0			
2									0,0			
3									3,0			
4									15,0			
5									0,0			
6									0,0			
7									5,0			
8									10,0			
9									0,0			
10									0,0			
11									0,0			
12									0,0			
13									26,3			
14									2,0			
15									1,8			
16									3,0			
17									0,0			
18									0,0			
19									0,0			
20									0,0			
21									19,4			
22									0,0			
23									0,0			
24									-			
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total									85,5			
Máx. 24h									26,3			
Día Máx.									13			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público - DINAC

Diana Gomez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. Luis M. Guimo C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
LOTE 6 – CONTRATO N°31/2020
Lluvias y Afectaciones – Septiembre 2021

Afectaciones por materiales húmedos en la institución: Duarte Ortellado

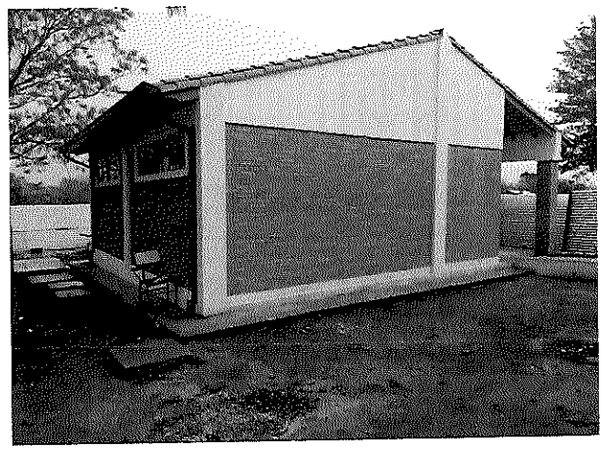

Afectaciones por materiales húmedos en la institución: Tupasy SSHH

Camino a Zona de obras afectada por lluvia en la institución: San Miguel

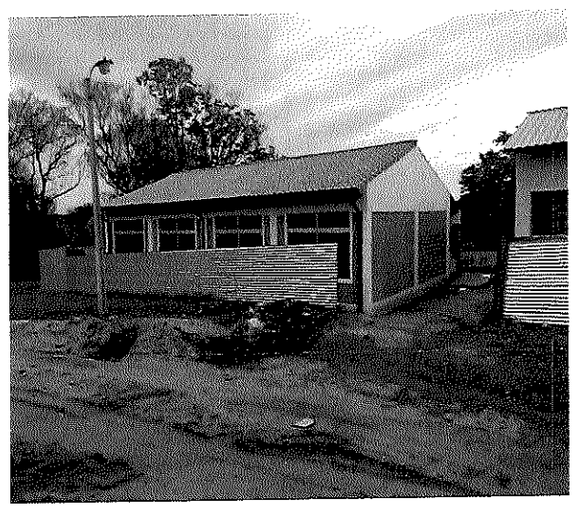

Afectaciones por materiales húmedos en la institución: Capitindy

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000150

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 256 Pbro. Julio C. Duarte Ortellado
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 3-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000151

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 256 Pbro. Julio C. Duarte Ortellado
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 4-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA.	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello
Sociedad Constructora Chaco S.A.	Carlos I. Gonzalez Ayala	

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000154

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 256 Pbro. Julio C. Duarte Ortellado
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 7-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Empresa Constructora Chaco S.A.
Firma y Sello

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000152

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 60 Frays Luis De Bolaños
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 3-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Carlos I. Gonzalez Ayala
Arquitecto
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000153

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 60 Frays Luis De Bolaños
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 4-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA.	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ CONSULTORIO JURÍDICO 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parque
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000156

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 60 Frays Luis De Bolaños
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 7-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA.	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramirez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1[illegible]53
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Carlos I. Gonzalez Vera
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000153

INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nacional Dr. Felipe Molas López - Loc. Yuty
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 03-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por Lluvia	Sin Actividad por Lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por Lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Della Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Sociedad Constructora Chaco
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000154

INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nacional Dr. Felipe Molas López - Loc. Yuty
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 04-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por Lluvia	Sin Actividad por Lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por Lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2001

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parque
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 470082-0 - Tel.: 021 371 600 / 0981 [illegible]

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000157

INSTITUCION EDUCATIVA:	Colegio Nacional Dr. Felipe Molas López - Loc. Yuty
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 07-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por Lluvia	Sin Actividad por Lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por Lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco

EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

ORIGINAL

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000153

INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nacional de Capiitindy - Loc. 3 de Mayo
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 03-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin Actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2021

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1753
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000154

INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nacional de Capiitindy - Loc. 3 de Mayo
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 04-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin Actividad por Lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramirez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 6153
Sociedad Constructora Chaco
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000157

INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nacional de Capiitindy - Loc. 3 de Mayo
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 07-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por Lluvia	Sin Actividad por Lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por Lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parque
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Sociedad Constructora Chaco

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000152

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 941 "Constantino Trociuk" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 03-09-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad (lluvia)			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1753
Constructora Chaco S.A.

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000153

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 941 "Constantino Trociuk" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 07-09-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS Sin Actividad (Lluvia)			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramirez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000156

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 941 "Constantino Trociuk" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 02-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad (lluvia)			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 11153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000152

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás . N° 147 Esteban Tomboly - Loc. Dr. Moisés S. Bertoni
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 3-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA.	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Carlos I. González García
Arquitecto
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000153

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás . N° 147 Esteban Tomboly - Loc. Dr. Moisés S. Bertoni
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 4-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA.	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Carlos J. Gonzalez Ayala
FISCAL
Arquitecto
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000156

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás . N° 147 Esteban Tomboly - Loc. Dr. Moisés S. Bertoni
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 7-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA.	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Jue Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Empresa Constructora Chaco S.A

EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Carlos I. González Ayala
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000153

INSTITUCION EDUCATIVA: Col. Nac. Don Emilio Napout - Loc. Fulgencio Yegros
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 03-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin Actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

que Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000154

INSTITUCION EDUCATIVA: Col. Nac. Don Emilio Napout - Loc. Fulgencio Yegros
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 04-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin Actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tel. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000157

INSTITUCION EDUCATIVA: Col. Nac. Don Emilio Napout - Loc. Fulgencio Yegros
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 07-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin Actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 11153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000153

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 2.189 San Gerardo - Loc. San Juan Nepomuceno
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 03-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad (Lluvia)			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000154

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 2.189 San Gerardo - Loc. San Juan Nepomuceno
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 04-09-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad (Lluvia)			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

...que Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
...ciedad Constructora Chaco S.A.

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000151

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 1893 San Miguel - Loc. Dr. Moisés S. Bertoni
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 3-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Terminación y Lluvia.	SIN ACTIVIDAD POR INCIDENCIA DE LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Carlos Bolsoni Ayala
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000152

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 1893 San Miguel - Loc. Dr. Moisés S. Bertoni
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 4-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA.	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Carlos I. González Ayala
Ar. Fiscal
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000155

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 1893 San Miguel - Loc. Dr. Moisés S. Bertoni
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 7-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA.	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 11153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Carlos J. González Ayala
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreids
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000149

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 5112 (10662) Santa Teresa - Loc. Dr. Moisés S. Bertoni
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 3-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Lluvia	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello
	CARLOS GONZALEZ AYALA ARQUITECTO	

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000150

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 5112 (10662) Santa Teresa - Loc. Dr. Moisés S. Bertoni
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 4-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Lluvia.	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramirez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000153

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 5112 (10662) Santa Teresa - Loc. Dr. Moisés S. Bertoni
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 7-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Carlos I. González Ayala
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000153

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc Bás. N° 4.231 San Roque - Loc. 3 de Mayo
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 03-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin Actividad por Lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000154

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc Bás. N° 4.231 San Roque - Loc. 3 de Mayo
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 04-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin Actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por lluvia.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000157

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc Bás. N° 4.231 San Roque - Loc. 3 de Mayo
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 07 - 09 - 21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin Actividad por Lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por lluvia.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000152

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 3.005 Sta. Teresita del Niño Jesús - Loc. Gral. Higinio Morínigo
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 03-09-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajos suspendidos por lluvia.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000153

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 3.005 Sta. Teresita del Niño Jesús - Loc. Gral. Higinio Morínigo
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 07-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajos suspendidos por lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ SECRETARÍA GENERAL 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1484 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000156

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. N° 3.005 Sta. Teresita del Niño Jesús - Loc. Gral. Higinio Morínigo
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 07-09-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajos suspendidos por lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000152

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. N° 1.563 "San Antonio" - Loc. Abaí
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 03-09-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad (lluvia)			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1163
Sociedad Constructora Chaco

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000153

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. N° 1.563 "San Antonio" - Loc. Abaí
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 04-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad (Lluvia)			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parque
Ingeniero Civil
Reg. Prof. [illegible]153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000156

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 1.563 "San Antonio" - Loc. Abaí
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 07-09-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad (lluvia)			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Sociedad Constructora Chaco

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000152

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 1.631 "San Isidro de Labrador" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 03-09-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS Sin Actividad (lluvia)			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Carlos I. González Ayala
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio/- 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000153

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 1.631 "San Isidro de Labrador" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 07-09-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad Lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Paredes
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco

EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Carlos I. González Ayala
Arquitecto

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479062-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000156

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 1.631 "San Isidro de Labrador" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 07-06-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad (lluvia)			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ INSPECTORIA 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parque...
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S...

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	Carlos I. González Ayala Arquitecto FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000153

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc.Bás. Nº 1.941 "Tupasy Ykua" - Loc. 3 de Mayo
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 02-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por Lluvia	Sin Actividad por Lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por Lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3036

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. P.N. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000154

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc.Bás. N° 1.941 "Tupasy Ykua" - Loc. 3 de Mayo
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 04-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por Lluvia	Sin Actividad por Lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por Lluvia.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parque
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 7153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

ORIGINAL

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000157

INSTITUCION EDUCATIVA:	**Esc.Bás. N° 1.941 "Tupasy Ykua" - Loc. 3 de Mayo**
EMPRESA CONTRATISTA:	**Sociedad Constructora Chaco S.A.**
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	**Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020**
FISCALIZACIÓN:	**Universidad Nacional de Caaguazú**
SUPERVISOR:	**Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC**

DIA: 07-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por Lluvia	Sin Actividad por Lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por Lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N°0000153

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 5131 San Rafael - Loc. Yuty
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 03-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por Lluvia	Sin Actividad por Lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por Lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 470982-0 - Tel.: 021 371 600 / 0981 905 000 / 0985 [illegible]

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N°0000154

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. Nº 5131 San Rafael - Loc. Yuty
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 04-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por Lluvia	Sin Actividad por Lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por Lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ DIRECCIÓN TÉCNICA 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000157

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 5131 San Rafael - Loc. Yuty
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 07-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por Lluvia	Sin Actividad por Lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad por Lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000152

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 998 Virgen de Fátima
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 2-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Lluvia.	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1753
Sociedad Constructora Chaco S.A.

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000153

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 998 Virgen de Fátima
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 4-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Lluvia	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ INSTITUTO TÉCNICO 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000156

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. Nº 998 Virgen de Fátima
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 7-09-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Lluvia	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ FISCALIZACIÓN 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Marque
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 7153
Sociedad Constructora Chaco

CARLOS GONZALEZ AYALA
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000152

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 1.795 Defensores del Chaco - Loc. Buena Vista
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 03-09-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS Sin Actividad (Lluvia)			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 11153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Carlos I. González Ayala
Fiscalizador
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000153

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 1.795 Defensores del Chaco - Loc. Buena Vista
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 09 - 09-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Sin Actividad (lluvia)			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Carlos J. González Ayala
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000156

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. N° 1.795 Defensores del Chaco - Loc. Buena Vista
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 07-09-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS Sin Actividad (lluvia)			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Carlos I. González Ayala
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00101/00200 - Julio - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO
