a (nuevo) (7)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 16072/2023

TITULAR:
CONSTRUCTORA ASUNCION S.A & ASOCIADOS/32

NOMBRE Y APELLIDO:
ELENA AGUILERA

TELEFONO:
0991-438-375

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
4F. CONTRATO SG MINISTRO Nº 14/2020. COMUNICA Y DEJA CONSTANCIA DE DIFICULTADES PARA LA PROVISION DE INSUMOS.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARDIAN 24/03/2023 14:22:11

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Constructora Asunción S. A. & Asociados /32

L.A. de Herrera 1424 – Tel: 214 368 (RA) / Fax: 201 451 - Asunción – Paraguay

Asunción 24 de marzo de 2023

Nota N°139/2023 MOPC

COPIA

Señor
Ing. Guido Benítez Villate
Coordinador Interino UEP-BID-DV
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva esquina Alberdi
Presente

Ref. Contrato S.G Ministro N° 14/2020 – Obra de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta 9 y Accesos Tramo 4 - Lote 7 ID 370320

Objeto: Comunicar

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud., en nombre y representación de la firma CONSTRUCTORA ASUNCION S.A.Y ASOCIADOS/32, Contratista de la obra de referencia, con el objeto de comunicar y a su vez dejar constancia de las dificultades que estamos atravesado para la provisión de los insumos críticos para nuestra obra en ejecución. En efecto, se da una situación impredecible y de fuerza mayor, que escapa a nuestro control, y nos referimos a la afectación que causan las lluvias extraordinarias que impiden la normal provisión de material pétreo, cuya extracción se efectúa en la cantera de Puerto Casado. En lo que va del año en curso, han caído más de 1.000 mm de lluvia lo cual ha ocasionado el cierre o clausura de todos los caminos y accesos, impidiendo que el material pueda llegar al sitio de obras. La magnitud del fenómeno natural es tal que se ha declarado en situación de emergencia por inundación en los Departamentos afectados. Acompañamos a la presente, copia del Libro de Obra N°00070 y registro fotográfico de parte de los daños causados por las inundaciones.

Por los motivos expuestos anteriormente dejamos constancia que se solicitaría el reconocimiento de la ampliación de los plazos de obra, así como de los sobrecostos que se generaron y continúan generando en la obra.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarles con nuestra más distinguida consideración y respeto.

RECIBIDO
24 MAR 2023
MOPC - BID
Ronald Alvarez
12:05h

Arq. José M. Díaz Benza
Representante Legal

Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados / 32

7 (siete)

MOPC LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL LIPI Nº 32/2019 - ID 370320
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y ACCESOS. TRAMO 4. LOTE 7

Consorcio
Constructora Asunción S.A. y Asociados/SE

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA Nº — 00000[illegible]

PARA: [illegible] DE: [illegible]

ASUNTO: [illegible]

[illegible]

ANEXO: [illegible]

Fecha: 22/03/2023

Fecha:

RECIBIDO 23/03/2023

Ing. Enrique Chamorro
Coordinador de Obra
Por el Contratista

Ing. Carlos Guevara
Residente

CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. SOC./S.
Arq. José M. Díaz [illegible]
[illegible] Legal

6 (seis)

LP 030

2/3

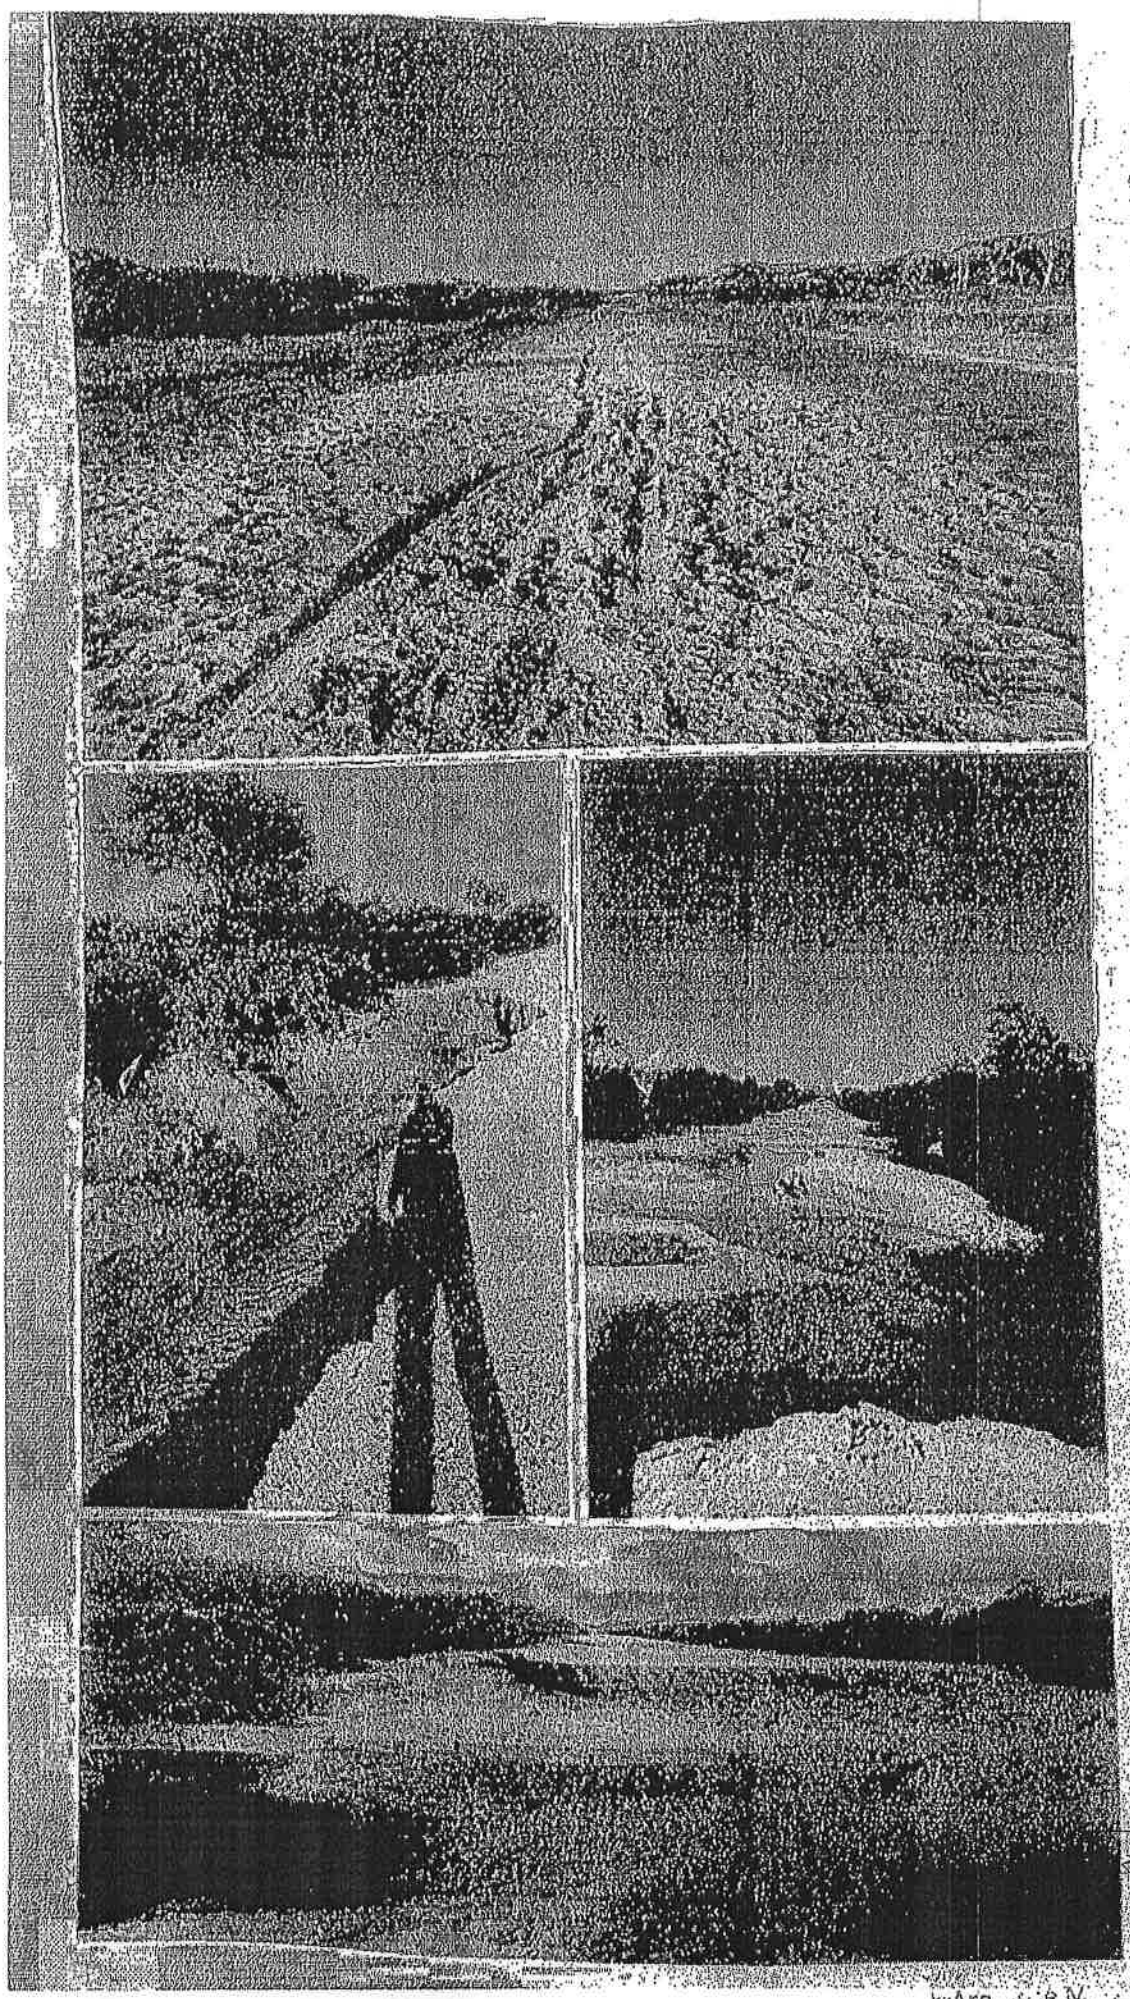

Arq. José M. Luzzenza
Representante Legal

5(cinco)

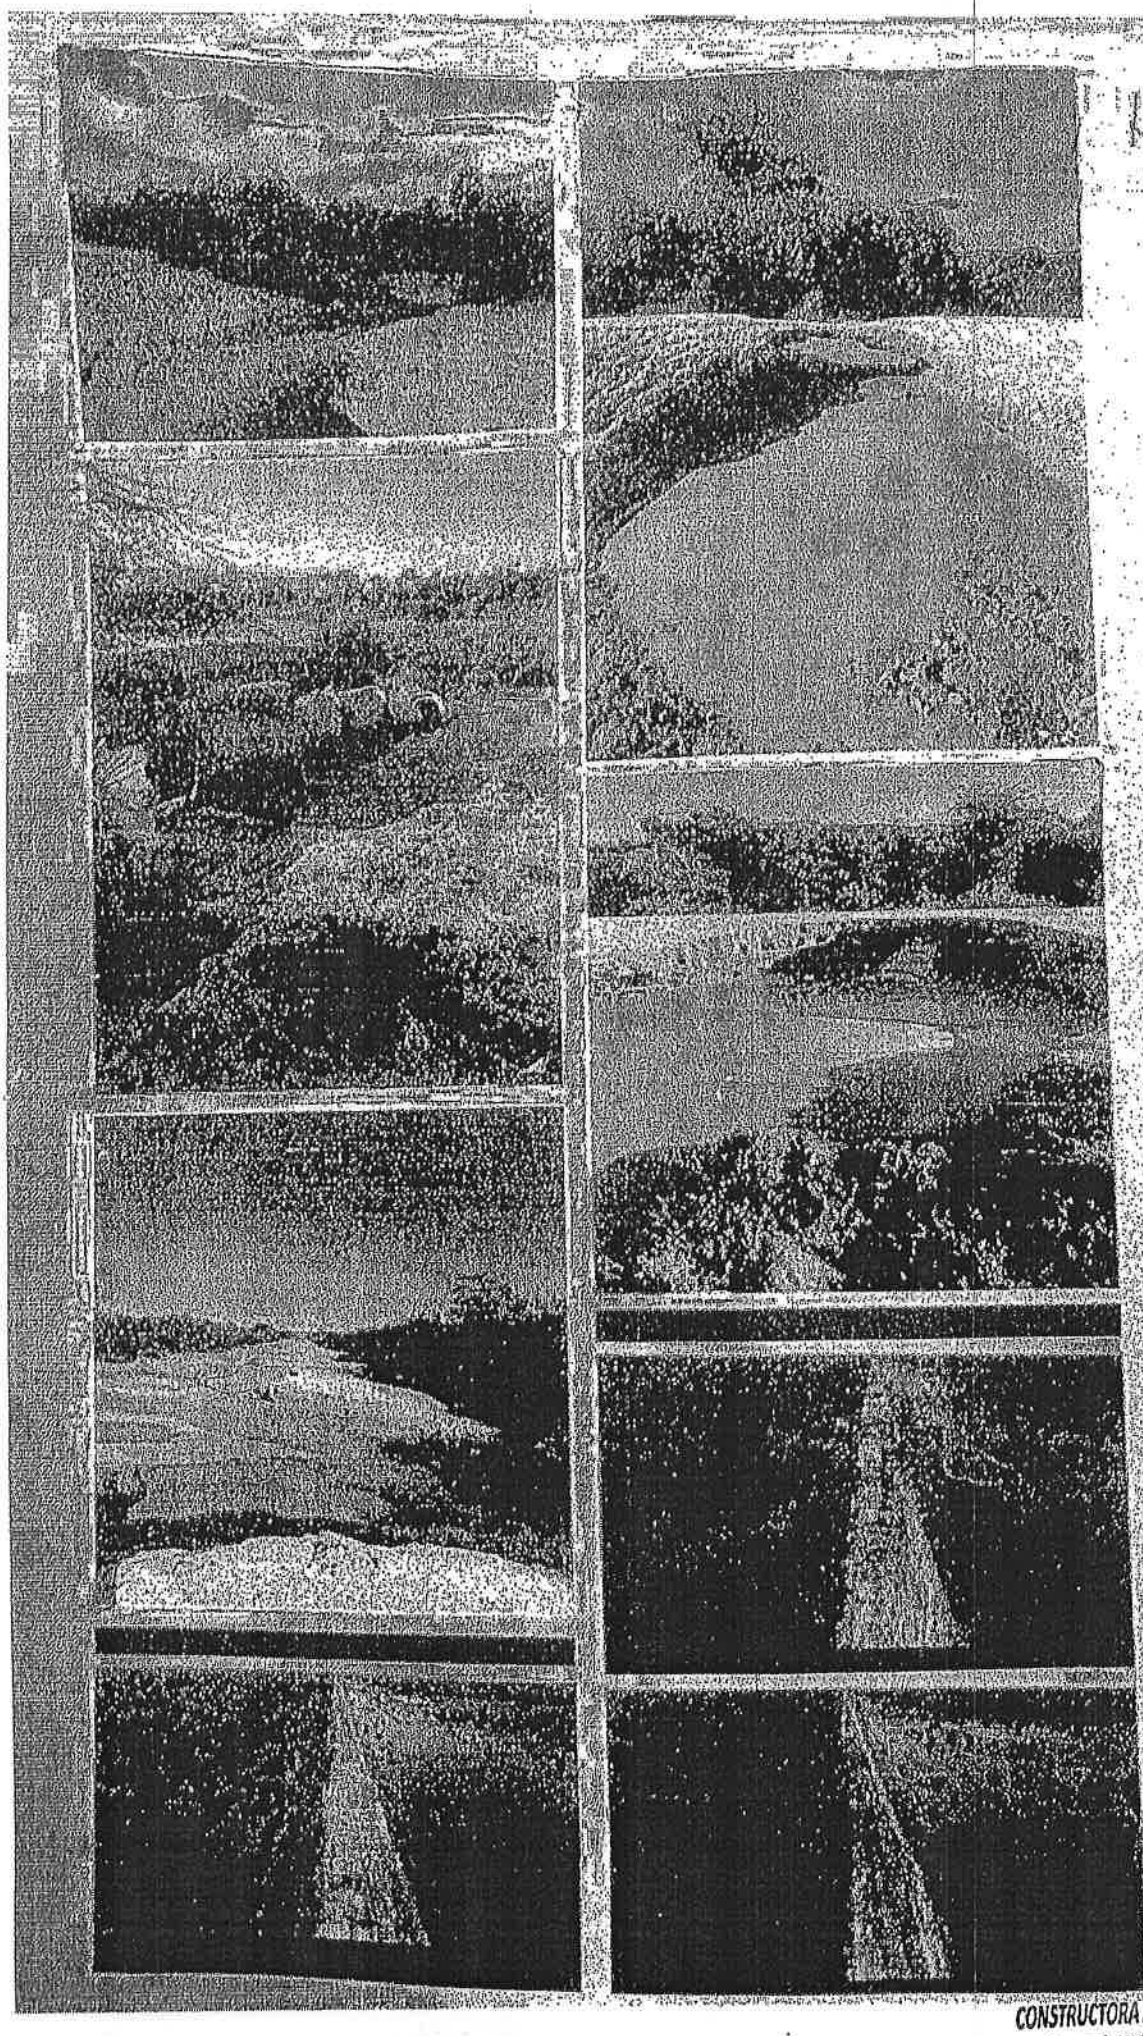

4.070

3/3

CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOC./32

Arq. José M. Díaz Benza

Representante Legal
