39 (treinta y nueve)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

MEMORÁNDUM UEP BID - DV N° 240 /2025

PARA: **ING. RENE ALEJANDRO PERALBO GONZALEZ**, DIRECTOR DE VIALIDAD
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

DE: **ING. ALEJANDRO BORDÓN BOGADO**, COORDINADOR
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV

REFERENCIA: PR-L1145. LLAMADO MOPC N° 46/2020 - CONTRATO SG MINISTRO N° 416/2020 "OBRAS DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS LOTE N° 4" ID 382545

OBJETO: Dar respuesta a memorándum UOC N°192/2025 - Nota DNC N°325/2025 (Exp. MEU N°48.701/2023)

FECHA: 19 / 02 / 25

En atención a la observación comunicada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por medio de la nota DNC N°325/2025, a través del memorándum UOC N°192/2025 la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) referente a la prórroga otorgada a la Contratista TOCSA S.A.. A continuación, se respuesta a la misma.

1. Se requiere remitir el libro de Obras en el cual se evidencie los dias en los que no han podido realizar los trabajos como consecuencia de las lluvias manifestada en las documentaciones remitidas, atendiendo a lo dispuesto en la Res. DNCP N°1807/2022 art. 2°: "El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al período durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables".

En atención a lo establecido en el articulo 2° de la Resolución 1807/2022, se remite libro de obras N°338 de fecha 03/02/2025 conforme al siguiente detalle:

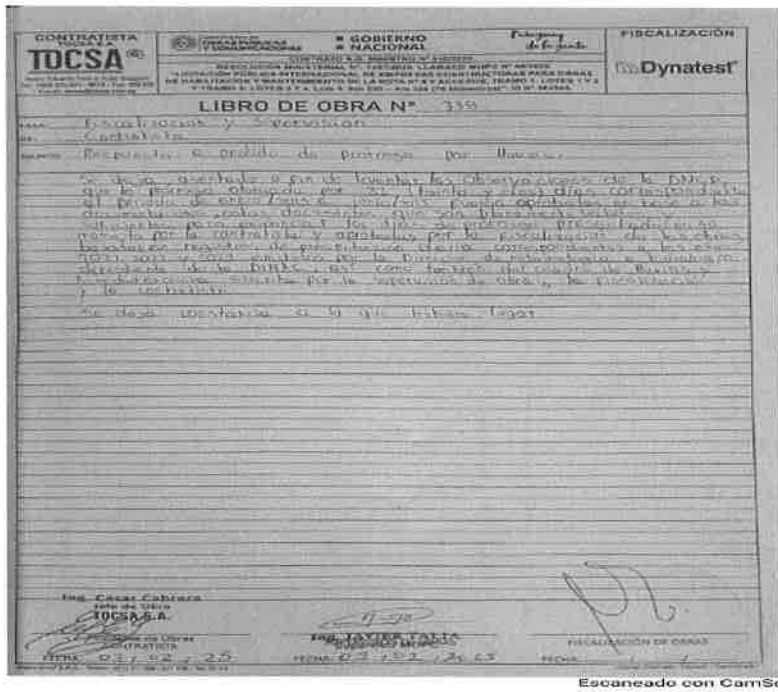
CONTRATISTA TOCSA — GOBIERNO NACIONAL — FISCALIZACIÓN Dynatest

LIBRO DE OBRA N° 338

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE UEP BID - DV N° 6318/2024

Abg. Martin Elias Jara Grance 17/02/2025 11:53:22

Se solicita la remisión del expediente a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), para los fines pertinentes de comunicación y consecuente publicación de la prórroga de plazo a cargo de la DNCP.

.....

Ing. Alejandro Bordón Bogado
COORDINADOR
UEP BID - DV

Abg. Martin Elias Jara Grance 17/02/2025 11:53:22

CONTRATISTA
TOCSA S.A.
TOCSA
Mayor Eduardo Vera c/ Avda. Boggiani
Tel.: +595 (21) 611 - 867/8 - Fax: 520 370
E-mail: tocsa@tocsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
■ GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN
Dynatest®

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 418/2020.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº: 1497/2020. LLAMADO MOPC Nº 46/2020 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y ACCESOS, TRAMO 1: LOTES 1 Y 2 Y TRAMO 2: LOTES 3 Y 4. Lote 4: Km 250 – Km 326 (76 kilómetros)". ID Nº 382545.

LIBRO DE OBRA Nº 338

PARA: Fiscalizacion y Supervision

DE: Contratista

ASUNTO: Respuesta a pedido de prórroga por lluvias.

Se deja asentado a fin de levantar las Observaciones de la DNCP que la prórroga otorgado por 32 (treinta y dos) días correspondiente al periodo de enero/2023 a junio/2023 fueron aprobados en base a los documentaciones, estos documentos que son plenamente válidos y suficientes para evidenciar los días de prorroga presentados en su momento por la contratista y aprobados por la fiscalizacion de las obras, basados en registros de precipitacion diario correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023 emitidos por la Direccion de meteorologia e hidrologia dependiente de la DINAC, así como tambien del cuadro de lluvias y humedad excesiva suscrito por la supervisión de obras, la fiscalización y la contratista.

Se deja constancia a lo que hubiere lugar.

Ing. César Cabrera
Jefe de Obra
TOCSA S.A.
Residente de Obras
CONTRATISTA
FECHA: 03/02/25

Ing. JAVIER TALIA
SUPERVISIÓN DE OBRAS
Supervisor MOPC
FECHA: 03/02/2025

FISCALIZACIÓN DE OBRAS
FECHA: ...../...../.....

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 906 / 527 296 - Tal. 50 x 4

Original - Duplicado - Triplicado - Cuadruplicado

Escaneado con CamScanner
