CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 10
Asunción, Paraguay - Teléfono: +595 21 604 798

Asunción, 05 de julio de 2024

Nota O156-20240705-151

Atención:

Ing. Claudia Centurión, Ministra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Ing. Julio Ríos
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva entre Alberdi y 14 de Mayo, Edificio Ex – LAP
Asunción, Paraguay.

RECIBIDO 05 JUL 2024 14:00

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 21/2022 "LLAMADO MOPC N° 69/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 2DA TANDA. ID 400.854"

Asunto: Comunicación de Estado Actual de Zona de Obra Mes de Junio

De nuestra consideración;

En representación del CONSORCIO PUENTE PARAGUAY, nos dirigimos a usted, y por su intermedio a quien corresponda con relación al contrato indicado en el tema de referencia a fin de manifestar cuanto sigue:

En el mes de mayo se registró una crecida fluvial significativa debido a los 224 mm de lluvia que se registraron en la zona lo que obligó al equipo a evacuar la zona debido al aumento del nivel del Río Monday.

El descenso del nivel del río se inició en la segunda semana de junio, permitiendo que el equipo retornara al área de obrador con la maquinaria y camiones que se encontraban en la zona de obra.

No obstante, el área de trabajo del puente permaneció inundada, impidiendo abordar las tareas de terraplén de avance o excavación en la zona de las pilas para llevar a cabo el enrocado de protección de los estribos.

Ya en la segunda quincena de junio, específicamente los días 16 y 17, se registraron lluvias intensas de 96 mm, según los registros pluviométricos del mes, lo que impidió que el nivel del Río siguiera descendiendo.

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

Contacto:
Lic. Clara Turo Cel. 0981 587 005 Correo: cturo@saceem.com

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 10
Asunción, Paraguay - Teléfono: +595 21 604 798

Posteriormente, el 23 de junio se presentó una tormenta en la zona de Dr. Juan León Mallorquín, con una precipitación de 47 mm, lo que provocó que el 25 de junio fuera necesario desalojar nuevamente la zona del obrador debido a las crecidas del Río Monday, alcanzando una cota de 196,50 metros, lo que conllevó a que el área del obrador quedara inundada, como se aprecia en las fotografías adjuntas.

En consecuencia, no se pudo ejecutar ninguna actividad en la zona de obra durante el mes de junio de 2024.

- Imágenes captadas en la zona del puente.

Contacto:
Lic. Clara Turo Cel. 0981 587 005 Correo: cturo@saceem.com

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 10
Asunción, Paraguay - Teléfono: +595 21 604 798

- Situación del obrador con la crecida del Rio Monday

El acceso por el lado de Juan León Mallorquín se encuentra debilitado en la zona de la progresiva 10+000 lugar en donde se encuentra el alcantarillado.

Como se puede observar en las fotos tomadas el 27 de junio, sólo con vehículo liviano puede transitar con precaución sobre el acceso.

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

Contacto:
Lic. Clara Turo Cel. 0981 587 005 Correo: cturo@saceem.com

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

15 (Quince)

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 10
Asunción, Paraguay - Teléfono: +595 21 604 798

A la fecha estas son las fotos actualizadas al día 30 de junio Las fotos son tomadas por el encargado de la seguridad del puente que se encuentra siempre en la zona.

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

Contacto:
Lic. Clara Turo Cel. 0981 587 005 Correo: cturo@saceem.com

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 10
Asunción, Paraguay - Teléfono: +595 21 604 798

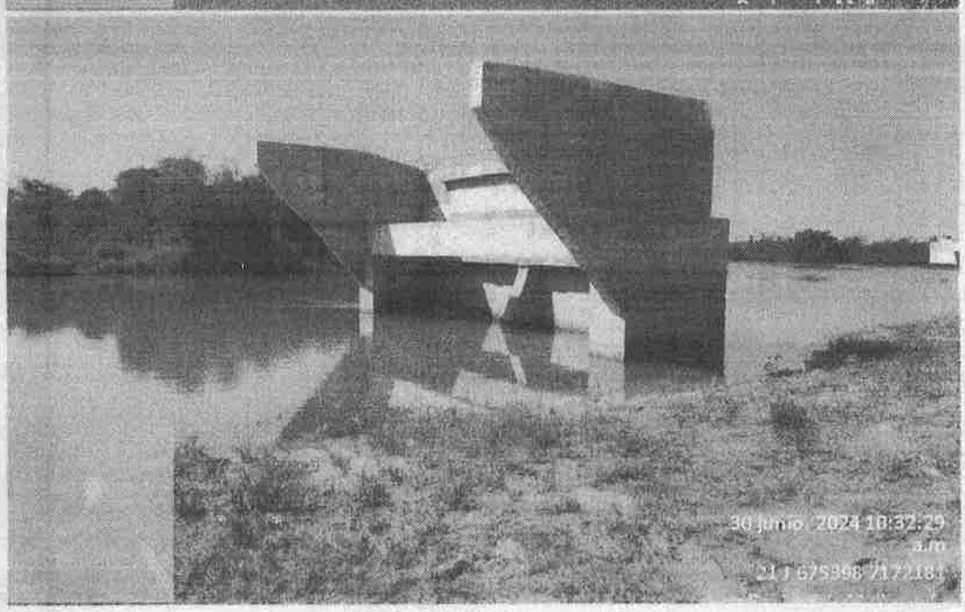

A continuación, se deja constancia de las precipitaciones registradas en el mes de Junio/2024:

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

Contacto:
Lic. Clara Turo Cel. 0981 587 005 Correo: cturo@saceem.com

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 10
Asunción, Paraguay - Teléfono: +595 21 604 798

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Opto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANI" MINGA GUAZU	25° 27' 21.02"	54° 50' 20.21"	247 m s.n.m.m

Mes / Dia	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0.0						
2						0.0						
3						0.0						
4						0.0						
5						0.0						
6						0.0						
7						0.0						
8						0.0						
9						0.0						
10						0.0						
11						0.0						
12						0.0						
13						0.0						
14						0.0						
15						3.5						
16						48.0						
17						9.4						
18						2.4						
19						3.0						
20						0.0						
21						0.0						
22						0.0						
23						18.2						
24						7.5						
25						0.0						
26						T						
27						0.0						
28						5.8						
29						0.0						
30						0.0						
31												
Total						97.3						
Max 24h						48						
Dia Max						16						

Referencias: 0,0 sin precipitaciones; T precipitacion no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1300 e/ De la Conquista
Email: [illegible]
Tel. 021-4361192
Asuncion - Paraguay

Sin otro particular, le expreso mi cordial saludo.

Ing. Adrián Sclavi
Representante Legal
CONSORCIO PUENTES PARAGUAY

Contacto:
Lic. Clara Turo Cel. 0981 587 005 Correo: cturo@saceem.com

Ing. Adrian Sclavi
Consorcio
Puentes Py.
