Plazo Contractual Original de Concremat - Detalles

Orden de Inicio de Obra: 23 - 01 – 2019
Fecha de Culminación de Obra: Febrero/2022
Plazo de Ejecución de las Obras: 34 Meses

MES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2
	feb/19	mar/19	abr/19	may/19	jun/19	jul/19	ago/19	sept/19	oct/19	nov/19	dic/19	ene/20	feb/20	mar/20	abr/20	may/20	jun/20	jul/20	ago/20	sept/20	oc
	23/01 inicio Concremat																				
Etapa de Informe Inicial -->	2 meses																				
		Pago 1																			
			08/04 inicio Contratista												30 meses de Fiscalización de obra						
		Pagos -->		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1
Etapa de Fiscalización --------->				Cert1	Cert2	Cert3	Cert4	Cert5	Cert6	Cert7	Cert8	Cert9	Cert10	Cert11	Cert12	Cert13	Cert14	Cert15	Cert16	Cert17	Ce
			Pagos 2 a 29																		
Etapa de Cierre de Contrato ---------->																					

Nuevo Plazo Contractual de Concremat - Detalles

Orden de Inicio de Obra: 23 - 01 – 2019
Fecha de Culminación de Obra: Febrero/2022
Plazo de Ejecución de las Obras: 34 Meses

MES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2
	feb/19	mar/19	abr/19	may/19	jun/19	jul/19	ago/19	sept/19	oct/19	nov/19	dic/19	ene/20	feb/20	mar/20	abr/20	may/20	jun/20	jul/20	ago/20	sept/20	oc
	23/01 inicio Concremat																				
Etapa de Informe Inicial -->	2 meses																				
		Pago 1																			
			08/04 inicio Contratista												30 meses de Fiscalización de obra						
Etapa de Fiscalización --------->		Pagos -->		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1
				Cert1	Cert2	Cert3	Cert4	Cert5	Cert6	Cert7	Cert8	Cert9	Cert10	Cert11	Cert12	Cert13	Cert14	Cert15	Cert16	Cert17	Ce
			Pagos 2 a 39																		
Etapa de Cierre de Contrato ---------->																					

ATISTA – ACCIONA AGUA S.A.
le Inicio de Obra: 08 - 04 – 2019
e Culminación de Obra: Octubre/2021
e Ejecución de las Obras: 30 Meses

23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
dic/20	ene/21	feb/21	mar/21	abr/21	may/21	jun/21	jul/21	ago/21	sept/21	oct/21	nov/21
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Cert20	Cert21	Cert22	Cert23	Cert24	Cert25	Cert26	Cert27	Cert28			
								4 meses			
											Pago 30

ATISTA – ACCIONA AGUA S.A.
le Inicio de Obra: 08 - 04 – 2019
e Culminación de Obra: Octubre/2021
e Ejecución de las Obras: 30 Meses

23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
dic/20	ene/21	feb/21	mar/21	abr/21	may/21	jun/21	jul/21	ago/21	sept/21	oct/21	nov/21	dic/21	ene/22	feb/22	mar/22	abr/22	may/22	jun/22	jul/22	ago/22	sept/22	oct/22
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
Cert20	Cert21	Cert22	Cert23	Cert24	Cert25	Cert26	Cert27	Cert28	Cert29	Cert30	Cert31	Cert32	Cert33	Cert34	Cert35	Cert36	Cert37	Cert38	Cert39			
																			4 meses			
																						Pago 41

Ing. Eduardo Edson Safady
Representante Legal
CONCRETMAT
engenharia e tecnologia S.A.

CONCREMAT engenharia e tecnologia

Una empresa del grupo 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

Formulario TECH - 5: Cronograma de los trabajo

N°	SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN
D.2	4.2 INFORME MENSUAL Nº 1 - Enlace
D.2.1	FUNCIONES DE LA FISCALIZACIÓN conforme al Numeral 8.2 Descriptas en la propuesta Técnica. Fiscalización de la Obras, Funciones o actividades a ser realizadas. Conforme A los Terminos de Referencia.
D.3	4.2 INFORME MENSUAL Nº 2
D.3.1	FUNCIONES DE LA FISCALIZACIÓN conforme al Numeral 8.2 Descriptas en la propuesta Técnica. Fiscalización de la Obras, Funciones o actividades a ser realizadas. Conforme A los Terminos de Referencia.
D.4	4.2 INFORME MENSUAL Nº 3
D.4.1	FUNCIONES DE LA FISCALIZACIÓN conforme al Numeral 8.2 Descriptas en la propuesta Técnica. Fiscalización de la Obras, Funciones o actividades a ser realizadas. Conforme A los Terminos de Referencia.
D.5	4.2 INFORME MENSUAL Nº 4
D.5.1	FUNCIONES DE LA FISCALIZACIÓN conforme al Numeral 8.2 Descriptas en la propuesta Técnica. Fiscalización de la Obras, Funciones o actividades a ser realizadas. Conforme A los Terminos de Referencia.
D.6	4.2 INFORME MENSUAL Nº 5
D.6.1	FUNCIONES DE LA FISCALIZACIÓN conforme al Numeral 8.2 Descriptas en la propuesta Técnica. Fiscalización de la Obras, Funciones o actividades a ser realizadas. Conforme A los Terminos de Referencia.
D.7	4.2 INFORME MENSUAL Nº 6
D.7.1	FUNCIONES DE LA FISCALIZACIÓN conforme al Numeral 8.2 Descriptas en la propuesta Técnica. Fiscalización de la Obras, Funciones o actividades a ser realizadas. Conforme A los Terminos de Referencia.
D.8	4.2 INFORME MENSUAL Nº 7
D.8.1	FUNCIONES DE LA FISCALIZACIÓN conforme al Numeral 8.2 Descriptas en la propuesta Técnica. Fiscalización de la Obras, Funciones o actividades a ser realizadas. Conforme A los Terminos de Referencia.
D.9	4.2 INFORME MENSUAL Nº 8
D.9.1	FUNCIONES DE LA FISCALIZACIÓN conforme al Numeral 8.2 Descriptas en la propuesta Técnica. Fiscalización de la Obras, Funciones o actividades a ser realizadas. Conforme A los Terminos de Referencia.
D.10	4.2 INFORME MENSUAL Nº 9
D.10.1	FUNCIONES DE LA FISCALIZACIÓN conforme al Numeral 8.2 Descriptas en la propuesta Técnica. Fiscalización de la Obras, Funciones o actividades a ser realizadas. Conforme A los Terminos de Referencia.
D.11	4.2 INFORME MENSUAL Nº 10
D.11.1	FUNCIONES DE LA FISCALIZACIÓN conforme al Numeral 8.2 Descriptas en la propuesta Técnica. Fiscalización de la Obras, Funciones o actividades a ser realizadas. Conforme A los Terminos de Referencia.
D.12	4.2 INFORME MENSUAL Nº 11
D.12.1	FUNCIONES DE LA FISCALIZACIÓN conforme al Numeral 8.2 Descriptas en la propuesta Técnica. Fiscalización de la Obras, Funciones o actividades a ser realizadas. Conforme A los Terminos de Referencia.
D.13	4.3 INFORME FINAL
D.13.1	Resumen de todos los informes mensuales y extraordinarios, e incluya una evaluación retrospectiva y final sobre los aspectos asociados al tema ambiental de la obra y del Contratista.
D.15	4.4 OTROS INFORMES
Informes adicionales referentes a puntos específicos de la ejecución de la obra.	
Informes a la Direccion de Gestion Socio Ambiental y a la Supervicion Ambiental y Social Externa	
D.16.1	4.5 Informes Mensuales
D.16.2	4.6 Informes Extraordinarios
D.16.3	4.7 Informe Final

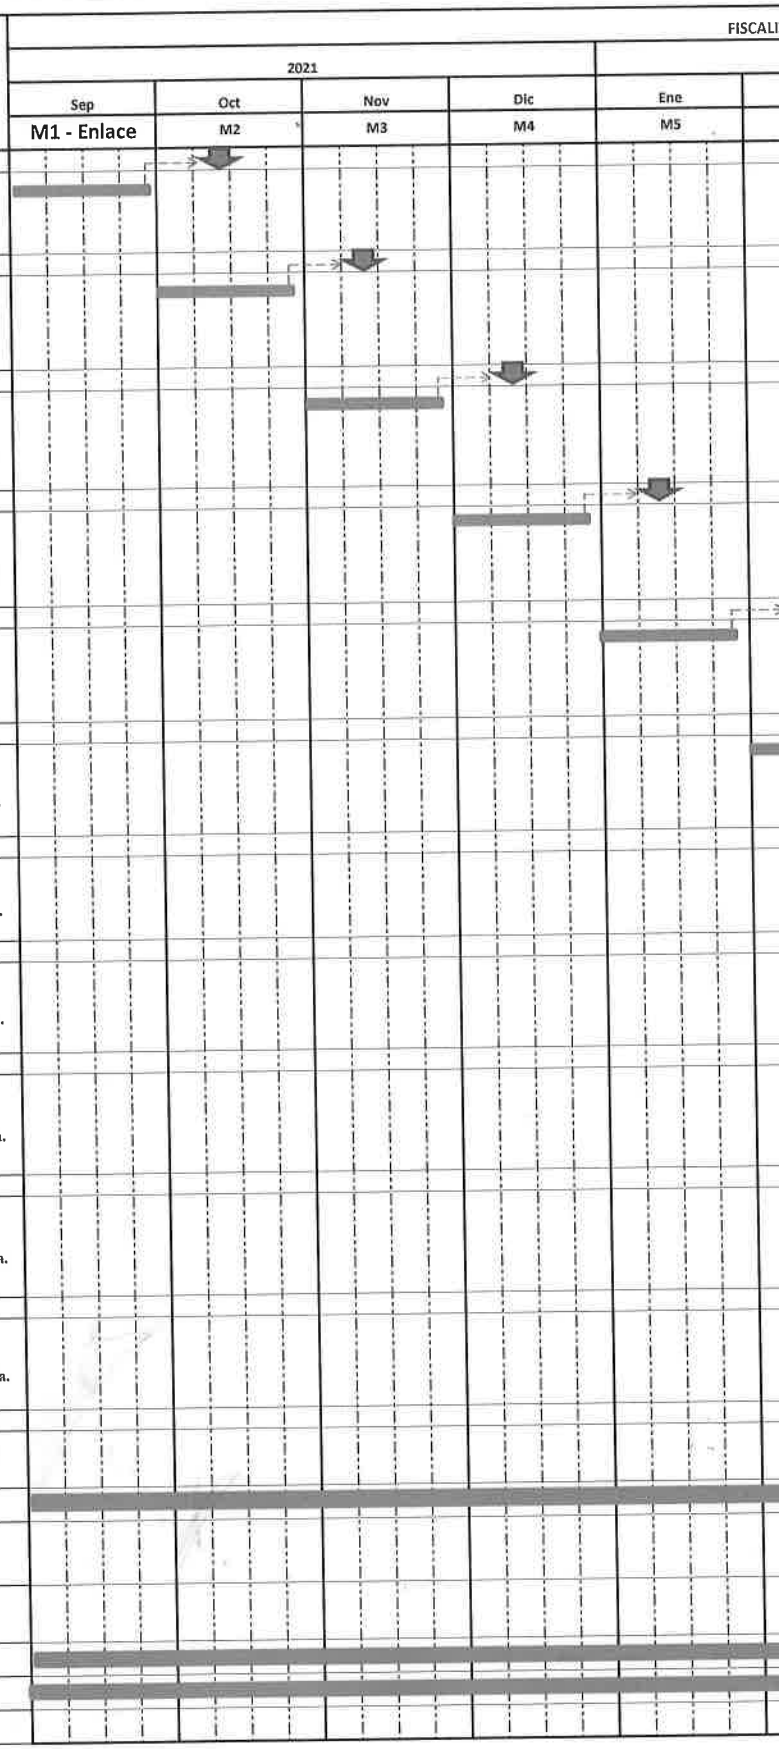

DURACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENTREGABLE

REMISIÓN DE ENTREGABLE

anificación de entregables

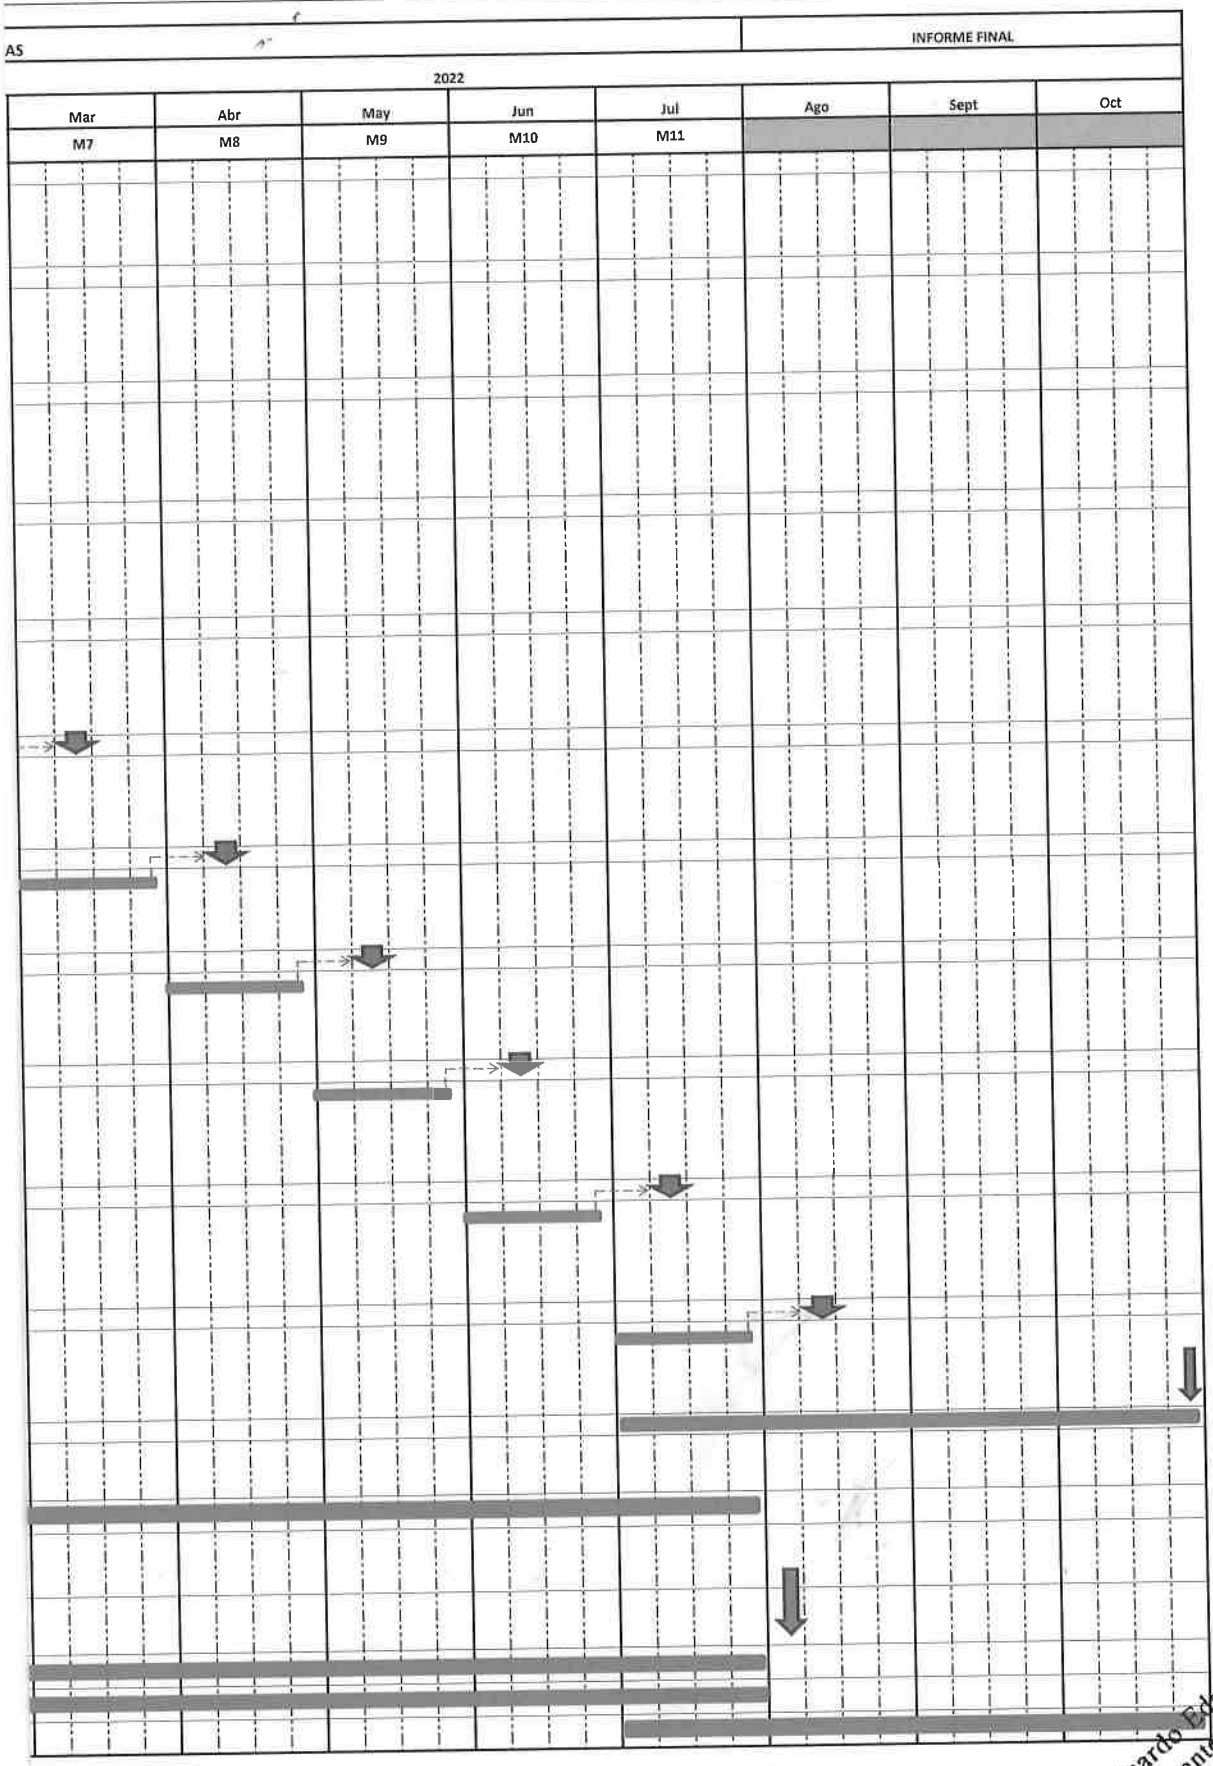

Ing. Eduardo Edson Safady
Representante Legal
CONCREMAT
engenharia e tecnologia S.A.

CONCREMAT
engenharia e tecnologia

Una empresa del grupo
中国交建
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

FORMULARIO TECH-6: COMPOSICIÓN DEL EQUIPO,

Nº	Nombre		Insumos de profesional (en			
			D.1 Enlace	D.2	D.3	D.4
	Experto Clave		FISCALIZACIÓN TECNICA Y AMBIENTAL DE ME			
K-1	**xxxx** Gerente de Fiscalización	Base				
		Campo				
K-2	**Ing. Sergio Chividini** Jefe de Ingeniería / Ingeniero Fiscal de PT	Base	1,000	1,000	1,000	1,000
		Campo				
K-3	**Dr. Marcelo Marques** Ingeniero Hidráulico	Base	1,000	1,000	1,000	1,000
		Campo				
K-4	**Ing. Sonia Chavez** Ingeniero Fiscal Ambiental/Social	Base	0,200	0,200	0,200	0,200
		Campo	0,800	0,800	0,800	0,800
K-5	**Ing. Fernando Blanco** Ingeniero Fiscal Electromecanico	Base	1,000	1,000	1,000	1,000
		Campo				
K-6	**Ing. Akira Gushiken** Asesor Estructural	Base	0,400	0,400	0,400	0,400
		Campo				
K-7	**Ing. Jose Pavón** Asesor Geotecnico	Base	0,200	0,200	0,200	0,200
		Campo	0,200	0,200	0,200	0,200
K-8	**Arq. Sergio Fanego** Asesor en Arquitectura	Base	0,400	0,400	0,400	0,400
		Campo	0,200	0,200	0,200	0,200
	Experto No Clave					
N-1	Ingeniero Asistente de Campo (Adicional)	Base				
		Campo	1,000	1,000	1,000	1,00
N-2	Ingeniero Asistente de Informes (Adicional)	Base				
		Campo	1,000	1,000	1,000	1,00
N-3	Tecnico en Seguridad en Obras (Adicional)	Base				
		Campo	1,000	1,000	1,000	1,00
N-4	Tecnico Ambiental (Adicional)	Base				
		Campo	1,000	1,000	1,000	1,00
N-5	Tecnicos Social	Base				
		Campo	1,000	1,000	1,000	1,00
N-6	Topógrafo	Base				
		Campo	1,000	1,000	1,000	1,00
N-7	Laboratorista de Suelo	Base				
		Campo	1,000	1,000	1,000	1,00
N-8	Ayudante de Topografia	Base				
		Campo				
N-9	Técnico Electricista/Mecánico	Base				
		Campo				
N-10	Cadista 1	Base				
		Campo	1,000	1,000	1,000	1,0
N-11	Administrador de Contrato 1	Base	1,000	1,000	1,000	1,0
		Campo				
N-12	Secretaria	Base				
		Campo	1,000	1,000	1,000	1,0
N-13	Chofer	Base				
		Campo	1,000	1,000	1,000	1,0

Insumo tiempo completo

Insumo tiempo parcial

BAJO E INSUMOS DE EXPERTOS CLAVE

na/mes) por cada Entregable (que figure en TECH-5)							Total tiempo - insumo (en meses)		
CALIZACIÓN DE OBRAS									
5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	D.11	Base	Campo	Total
BRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN TRAMOS NO DOS DE LA REGIÓN ORIENTAL.									
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,000		11,000
1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8,000		8,000
0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	2,200		11,000
0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800		8,800	
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,000		11,000
0,400	0,400	0,400	0,400	0,200			3,400		3,400
0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	2,200		4,000
0,200	0,200	0,200	0,200	0,200				1,800	
0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,200	0,200	4,000		6,000
0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200			2,000	
							41,800	12,600	54,400

1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		11,000	11,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		11,000	11,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		11,000	11,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		11,000	11,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		11,000	11,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		11,000	11,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		11,000	11,000
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		6,000	6,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		11,000	11,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,000		11,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		11,000	11,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		11,000	11,000
							11,000	116,000	127,000
							52,800	128,600	181,400

Ing. Eduardo Edson Safady
Representante Legal
CONCRETMAT
engenharia e tecnologia S.A.

CONCREMAT engenharia e tecnologia

Una empresa del grupo 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

FORMULARIO FIN-3 DESGLOSE POR REMUNERACION

A Remuneración: **FISCALIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO BELLA VISTA**

Nº	Nombre	Cargo (como en TECH-6)	Tarifa remuneración persona-mes		Insumo tiempo en (persona / mes)	Precio [Guaranies]
	Experto Clave					
K-1	xxxx	Gerente de Fiscalización	[Sede]	40.579.000 Gs		
			[Campo]	40.579.000 Gs		
K-2	**Ing. Sergio Chividini**	Jefe de Ingeniería / Ingeniero Fiscal de PT	[Sede]	31.416.000 Gs	11,000	345.576.000 Gs
			[Campo]	31.416.000 Gs		
K-3	**Dr. Marcelo Marques**	Ingeniero Hidráulico	[Sede]	31.416.000 Gs	8,000	251.328.000 Gs
			[Campo]	31.416.000 Gs		
K-4	**Ing. Sonia Chavez**	Ingeniero Fiscal Ambiental/Social	[Sede]	28.798.000 Gs	2,200	63.355.600 Gs
			[Campo]	28.798.000 Gs	8,800	253.422.400 Gs
K-5	**Ing. Fernando Blanco**	Ingeniero Fiscal Electromecanico	[Sede]	28.798.000 Gs	11,000	316.778.000 Gs
			[Campo]	28.798.000 Gs		
K-6	**Ing. Akira Gushiken**	Asesor Estructural	[Sede]	31.416.000 Gs	3,400	106.814.400 Gs
			[Campo]	31.416.000 Gs		
K-7	**Ing. Jose Pavón**	Asesor Geotecnico	[Sede]	30.107.000 Gs	2,200	66.235.400 Gs
			[Campo]	30.107.000 Gs	1,800	54.192.600 Gs
K-8	**Arq. Sergio Fanego**	Asesor en Arquitectura	[Sede]	27.489.000 Gs	4,000	109.956.000 Gs
			[Campo]	27.489.000 Gs	2,000	54.978.000 Gs
-	**Experto no Clave**					
N-1		Ingeniero Asistente de Campo (Adicional)	[Sede]	15.708.000 Gs		
			[Campo]	15.708.000 Gs	11,000	172.788.000 Gs
N-2		Ingeniero Asistente de Informes (Adicional)	[Sede]	15.708.000 Gs		
			[Campo]	15.708.000 Gs	11,000	172.788.000 Gs
N-3		Tecnico en Seguridad en Obras (Adicional)	[Sede]	9.163.000 Gs		
			[Campo]	9.163.000 Gs	11,000	100.793.000 Gs
N-4		Tecnico Ambiental (Adicional)	[Sede]	9.163.000 Gs		
			[Campo]	9.163.000 Gs	11,000	100.793.000 Gs
N-5		Tecnicos Social	[Sede]	9.163.000 Gs		
			[Campo]	9.163.000 Gs	11,000	100.793.000 Gs
N-6		Topógrafo	[Sede]	8.996.400 Gs		
			[Campo]	8.996.400 Gs	11,000	98.960.400 Gs
N-7		Laboratorista de Suelo	[Sede]	8.996.400 Gs		
			[Campo]	8.996.400 Gs	11,000	98.960.400 Gs
N-8		Ayudante de Topografia	[Sede]	3.748.500 Gs		
			[Campo]	3.748.500 Gs		
N-9		Técnico Electricista/Mecánico	[Sede]	3.748.500 Gs		
			[Campo]	3.748.500 Gs	6,000	22.491.000 Gs
N-10		Cadista 1	[Sede]	6.545.000 Gs		
			[Campo]	6.545.000 Gs	11,000	71.995.000 Gs
N-11		Administrador de Contrato 1	[Sede]	7.854.000 Gs	11,000	86.394.000 Gs
			[Campo]	7.854.000 Gs		
N-12		Secretaria	[Sede]	3.748.500 Gs		
			[Campo]	3.748.500 Gs	11,000	41.233.500 Gs
N-13		Chofer	[Sede]	3.748.500 Gs		
			[Campo]	3.748.500 Gs	11,000	41.233.500 Gs
		TOTAL DE PRECIO				**2.731.859.200 Gs**

Ing. Eduardo Edson Safady
Representante Legal
CONCREMAT engenharia e tecnologia S.A.

07(siete)

CONCREMAT
engenharia e tecnologia

Una empresa del grupo
中国交建
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

FORMULARIO FIN-4 DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

B. *Reembolsable:* FISCALIZACION PTAR					
N°	Descripción	Unidad	Precio Unitario (Guaranies)	Cantidad	Precio (Guaranies)
1	Viáticos Director (incluido pasajes)	mes	4.000.000 Gs		
2	Viáticos Especialistas	mes	12.000.000 Gs	11	132.000.000 Gs
3	Viáticos (Técnicos)	mes	4.200.000 Gs	11	46.200.000 Gs
4	Gastos de Comunicación e Internet	mes	3.000.000 Gs	11	33.000.000 Gs
5	Preparación y reproducción de informe mensual	mes	2.500.000 Gs	11	27.500.000 Gs
6	Preparación y reproducción de informe final	unidad	10.000.000 Gs		
7	Insumos de Oficina	mes	2.500.000 Gs	11	27.500.000 Gs
8	Computadoras	unidad	5.000.000 Gs		
9	Alquiler de Vehiculos 1	mes	4.000.000 Gs	11	44.000.000 Gs
10	Alquiler de Vehiculos 2	mes	4.000.000 Gs	11	44.000.000 Gs
11	Mantenimiento de Vehiculos (2)	unidad	2.000.000 Gs	11	22.000.000 Gs
12	Combustible	mes	3.000.000 Gs	11	33.000.000 Gs
13	Alquiler Oficina de Campo 1	mes	1.000.000 Gs		
14	Alquiler Oficina Central	mes	3.000.000 Gs	11	33.000.000 Gs
15	Gastos de escribanía	mes	2.873.740 Gs		
16	Renovacion y/o Ampliacion de Liciencia Ambiental	global	25.000.000 Gs		
17	Seguros (responsabilidad y vehículos)	global	2.500.000 Gs	11	27.500.000 Gs
			Costos Totales		**469.700.000 Gs**

Ing. Eduardo Edson Safady
Representante Legal
CONCREMAT
engenharia e tecnologia S.A.

06 (seis)

CONCREMAT
engenharia e tecnologia

Una empresa del grupo
中国交建
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

PLANILLA CONVENIO MODIFICATORIO

SALARIOS BASE DE COSTO COSTO	Nome Profesional	Meses	Tarifa Remuneración	Total Remuneración
Gerente de Fiscalización	no Aplica	-	40.579.000	
Jefe de Ingeniería / Ingeniero Fiscal de PT	Ing. Sergio Chividini	11,0	31.416.000	345.576.000
Ingeniero Hidráulico	Dr. Marcelo Marques	8,0	31.416.000	251.328.000
Ingeniero Fiscal Ambiental/Social	Ing. Sonia Chavez	11,0	28.798.000	316.778.000
Ingeniero Fiscal Electromecanico	Ing. Fernando Blanco	11,0	28.798.000	316.778.000
Asesor Estructural	In. Akira Gushiken	3,4	31.416.000	106.814.400
Asesor Geotecnico	Ing. Jose Pavon	4,0	30.107.000	120.428.000
Asesor en Arquitectura	Arq. Sergio Fanego	6,0	27.489.000	164.934.000
Ingeniero Asistente de Campo (Adicional)		11,0	15.708.000	172.788.000
Ingeniero Asistente de Informes (Adicional)		11,0	15.708.000	172.788.000
Tecnico en Seguridad en Obras (Adicional)		11,0	9.163.000	100.793.000
Tecnico Ambiental (Adicional)		11,0	9.163.000	100.793.000
Tecnicos Social		11,0	9.163.000	100.793.000
Topógrafo		11,0	8.996.400	98.960.400
Laboratorista de Suelo		11,0	8.996.400	98.960.400
Ayudante de Topografia			3.748.500	-
Técnico Electricista/Mecánico		6,0	3.748.500	22.491.000
Administrador de Contrato		11,0	7.854.000	86.394.000
Cadista 1		11,0	6.545.000	71.995.000
Secretaria		11,0	3.748.500	41.233.500
Chofer		11,0	3.748.500	41.233.500
			TOTAL	2.731.859.200

05 (cinco)

Ing. Eduardo Edson Safady
Representante Legal
CONCREMAT

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

04 (cuatro)
Paraguay de la gente

NOTA CAPSOH Nº 675 /2021

Asunción, 13 de octubre de 2021

Señor
LIC. DANIEL HETER. Representante legal
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
Avda. Aviadores del Chaco 2050
WTC –Torre 4 – Piso 15 – Oficina C
Presente

COPIA

Ref.: PRESTAMOS N° 3393/OC-PR y 3394/BL-PR.
Contrato S.G. Ministro Nº 332/2018. "Contratación de Firma Consultora Especializada en la Fiscalización de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Bella Vista de la Ciudad de Asunción".

Asunto: Respuesta Meu N° 25.295/2021 – SOLICITUD DE CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 DEL 16/06/2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a la Nota FISCALIZACIÓN CS-CSPY-N°051/2021, ingresada via Meu N° 25295/2021 en fecha 16 de junio de 2021, en donde solicitan Convenio Modificatorio N° 2 al contrato vigente, en este sentido, indicamos que estamos de acuerdo con lo solicitado en la Nota de Referencia e iniciaremos los tramites contractuales pertinentes.

Por otro lado, informamos que el contrato S.G. Ministro N° 461/2017 Construcción de Planta Residual Ptar Bella Vista, cuya fiscalización están realizando, ha sufrido una modificación a través del convenio modificatorio 2, en el sentido de que ha sido ampliado en su vigencia hasta 52 meses, que sería hasta octubre del año 2022.

En ese sentido, y conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato clausula 14.1. que dice: "…El Plazo estimado de Ejecución del Servicio de Consultoría es de 34 meses, que incluye: (i) revisión del proyecto ejecutivo igual a 2 meses; (ii) fiscalización de Obras igual a 30 meses; (iii) 2 meses de cierre de contrato, preparación y aprobación del Informe final y pago de remanentes…", "…Si algunos de los Contratos de las Obras a fiscalizar se prorrogaran o se acortaran, sufriesen algunos ajustes en sus plazos de ejecuciones, el Contrato de fiscalización ajustará su duración y monto…". Y a lo establecido también en la cláusula 16.1. de las Condiciones Especiales del Contrato que dice: "…Toda modificación o variación a los términos y condiciones de este Contrato, incluida cualquier modificación o variación del alcance de los Servicios, solo podrá hacerse mediante acuerdo escrito entre las Partes. Sin embargo, cada una de las Partes considerará debidamente cualquier propuesta de modificación o variación que haga la otra Parte…", "…16.2 En casos de modificaciones o variaciones sustanciales, se requerirá el previo consentimiento escrito del Banco…".

CONCREMAT Engenharia e tecnologia S.A.
Recibido por: Lic. Richard Fernández

DIA	MES	AÑO	HORA
13	10	21	11:04

ADCG

Informamos que incluiremos en el Convenio Modificatorio N° 2 modificaciones al respecto de la vigencia del Contrato de Fiscalización, en ese sentido, solicitamos que preparen propuesta de distribución de personal y costo que implicará la ampliación de la vigencia contractual para poder realizar la fiscalización de las obras que también fueron modificadas en su vigencia.

De la misma forma y considerando que para la etapa de las operaciones y mantenimiento de la planta de tratamiento, será imprescindible contar con información clara y precisa sobre el comportamiento de los Sistemas Hidráulicos del Registro 23 de la Tubería de Ingreso, que el proyecto original no contempla, conforme a las reuniones técnicas entre la contratista, contratante y fiscalización donde se establecieron estas situaciones, y en virtud a la minuta de la última reunión de fecha 18 de agosto de 2021, esta administración solicita que remitan una propuesta técnico-económica de Proyecto del Sistema Hidráulico y Comportamiento del Registro 23 en épocas de crecidas a causa de lluvias, de acuerdo a los términos de referencia que se adjuntan a la presente nota.

Por lo tanto, aguardamos lo solicitado, en la mayor brevedad posible. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Econ. Alberto Sanchez Aquino
Coordinador Interino
Coordinación de Agua Potable
Saneamiento y Obras Hidráulicas
CAPSOH - MOPC

ADCG
