Curva de avance físico financiero - CONSTRUMAQ SUR S.R.L. - Certificado N°: 20 - Diciembre/2023

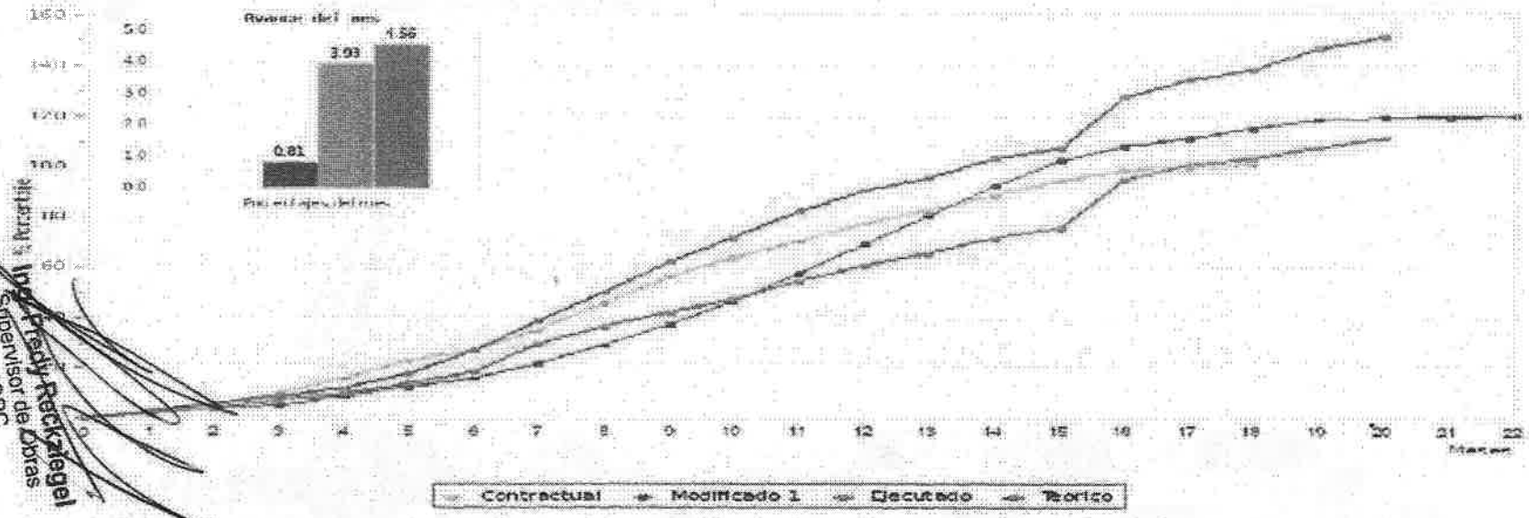

Porcentajes acumulados

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Contr. Parcial	1,71 %	3,25 %	4,47 %	5,96 %	7,01 %	4,34 %	8,09 %	10,49%	10,25%	7,46 %	6,93 %	6,79 %	5,56 %	6,02 %	5,46 %	4,07 %	1,52 %	0,62 %				
Contr. Acum.	1,71 %	4,96 %	9,43 %	15,39%	22,40%	26,74%	34,83%	45,32%	55,57%	63,03%	69,96%	76,75%	82,31%	88,33%	93,79%	97,86%	99,38%	100,00%				
Mod. Parcial	1,60 %	1,83 %	0,95 %	3,96 %	3,69 %	3,40 %	5,51 %	7,58 %	8,31 %	8,74 %	11,54%	11,22%	11,52%	11,97%	10,21%	5,41 %	3,31 %	3,85 %	3,51 %	0,81 %	0,60 %	0,35 %
Mod. Acum.	1,60 %	3,43 %	4,38 %	8,34 %	12,03%	15,43%	20,94%	28,52%	36,83%	45,57%	57,11%	68,33%	79,85%	91,82%	102,03%	107,44%	110,75%	114,60%	118,11%	118,92%	119,52%	119,87%
[illegible]	1,57 %	2,11 %	2,93 %	2,44 %	4,33 %	4,46 %	10,95%	7,23 %	5,76 %	4,82 %	7,35 %	6,35 %	4,66 %	6,19 %	3,88 %	1,95 %	5,67 %	2,40 %	4,41 %	3,93 %		
[illegible]	1,57 %	3,68 %	5,04 %	9,05 %	13,38%	17,84%	28,79%	36,02%	41,78%	46,60%	52,95%	60,30%	64,96%	71,15%	75,03%	94,57%	100,24%	102,64%	107,05%	110,98%		
[illegible]	2,11 %	3,00 %	2,93 %	3,52 %	5,61 %	9,13 %	11,91%	11,45%	11,87%	9,40 %	10,66%	8,47 %	4,94 %	7,78 %	4,14 %	19,79%	7,02 %	4,33 %	8,24 %	4,56 %		
[illegible]	2,11 %	5,11 %	5,93 %	11,56%	17,17%	26,32%	38,23%	49,68%	61,55%	70,95%	81,61%	90,08%	95,02%	102,80%	106,94%	126,73%	133,75%	138,08%	146,32%	150,88%		

Obs: El porcentaje programado modificado se tiene en cuenta desde el certificado N° 16

ING. FREDY JAVIER RECKZIEGEL SEGOVIA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FREYDBER FERNANDO CHAVEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSTRUMAQ SUR S.R.L.

ING. MARIANO ZARATE VILLASANTI
RESIDENTE DE FISCALIZACION
CONSORCIO CG

Ing. Fredy Reckziegel
Supervisor de Obras
MOPC

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

Ing. Freydber Fernando Chavez González
Representante Legal
CONSTRUMAQ SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

25 Cuarenta y cinco
33 (treinta y tres)
19 (diecinueve)
