Fernando Moreno Martínez
Ingeniero Civil
Email:morenoconstructora@gmail.com

Asunción, 9 de Diciembre de 2020.-

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 7124
Recibido por: Jaura

DIA	MES	AÑO	HORA
10	12	2020	11:15

Señor
Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

Ref.: Contrato N° 09/19 – LOTE N° 1 - Contratación Vía Excepción N° 01/2019- Construcción de espacios de desarrollo infantil con técnicas alternativas constructivas mixtas Plurianual - ID N° 356937 – Ministerio de Educación y Ciencias.-

De mi consideración:

Por la presente, me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia, a los efectos de presentar, para su verificación, aprobación; la solicitud de **PRORROGA POR DIAS DE LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS**, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE/2020 (del 01 al 30).-**

Se presenta en anexo:
- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias ocurridas en el mes de Noviembre/2020 (01/11/2020 al 30/11/2020).-
- Informe de DINAC-ORIGINAL: Dptos. de Concepción (Aeródromo de Concepción); Caaguazú (Coronel Oviedo); San Pedro (San Pedro de Ycuamandyju); Pdte. Hayes (se adopta la Estación Pluviométrica del Aeropuerto Silvio Pettirossi).-
- Copia de los Libros de Obra correspondientes al mes de Noviembre/2020, de las 4 Instituciones Educativas (de los días asentados como lluvia).-

Fundamentados en las CEC, clausula CGC 22.1, y en las CGC., ítem C, clausula 24 y sus anexos, solicitamos (conforme lo demostrado en los Libros de obra, planilla anexa e informe de la DINAC) los siguientes días de Prorroga por lluvia y sus efectos:

- **Escuela Básica N° 592-San Juan Bosco-Dpto. de Concepción: 14 DÍAS.-**
- **Escuela Básica N° 1251-San Francisco de Asís-Dpto. de Caaguazú: 12 DÍAS.-**
- **Escuela Básica N° 568-Las Residentas-Dpto. de San Pedro: 15 DÍAS.-**
- **Escuela Básica N° 182-Dr. Antolín Garcete-Dpto. de Pdte. Hayes: 17 DÍAS.-**

Atentamente.-

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Ing. Fernando Moreno
PROPIETARIO

Fernando Moreno Martínez
Ingeniero Civil
Email:morenoconstructora@gmail.com

==========

Asunción, 04 de Diciembre de 2020.-

Señora
Arq. Patricia Sánchez
Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP-MEC
Presente

Ref.: Contrato N° 09/19 – LOTE N° 1 - Contratación Vía Excepción N° 01/2019- Construcción de espacios de desarrollo infantil con técnicas alternativas constructivas mixtas Plurianual - ID N° 356937 – Ministerio de Educación y Ciencias.-

De mi consideración:

Por la presente, me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia, a los efectos de presentar, para su verificación, aprobación; la solicitud de **PRORROGA POR DIAS DE LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS**, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE/2020 (del 01 al 30).-**

Se presenta en anexo:
- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias ocurridas en el mes de Noviembre/2020 (01/11/2020 al 30/11/2020).-
- Informe de DINAC-ORIGINAL: Dptos. de Concepción (Aeródromo de Concepción); Caaguazú (Coronel Oviedo); San Pedro (San Pedro de Ycuamandyju); Pdte. Hayes (se adopta la Estación Pluviométrica del Aeropuerto Silvio Pettirossi).-
- Copia de los Libros de Obra correspondientes al mes de Noviembre/2020, de las 4 Instituciones Educativas (de los días asentados como lluvia).-

Fundamentados en las CEC, clausula CGC 22.1, y en las CGC., ítem C, clausula 24 y sus anexos, solicitamos (conforme lo demostrado en los Libros de obra, planilla anexa e informe de la DINAC) los siguientes días de Prorroga por lluvia y sus efectos:

- **Escuela Básica N° 592-San Juan Bosco-Dpto. de Concepción: 14 DÍAS.-**
- **Escuela Básica N° 1251-San Francisco de Asís-Dpto. de Caaguazú: 12 DÍAS.-**
- **Escuela Básica N° 568-Las Residentas-Dpto. de San Pedro: 15 DÍAS.-**
- **Escuela Básica N° 182-Dr. Antolín Garcete-Dpto. de Pdte. Hayes: 17 DÍAS.-**

Atentamente.-

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. N°:
Recibido por:

DIA	MES	AÑO	HORA
07	12	2020	10:00

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Ing. Fernando Moreno
PROPIETARIO

ESCUELA BASICA N° 592 SAN JUAN BOSCO-CONCEPCION

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

ESCUELA BASICA N° 1251 SAN FRANCISCO DE ASIS-CAAGUAZU

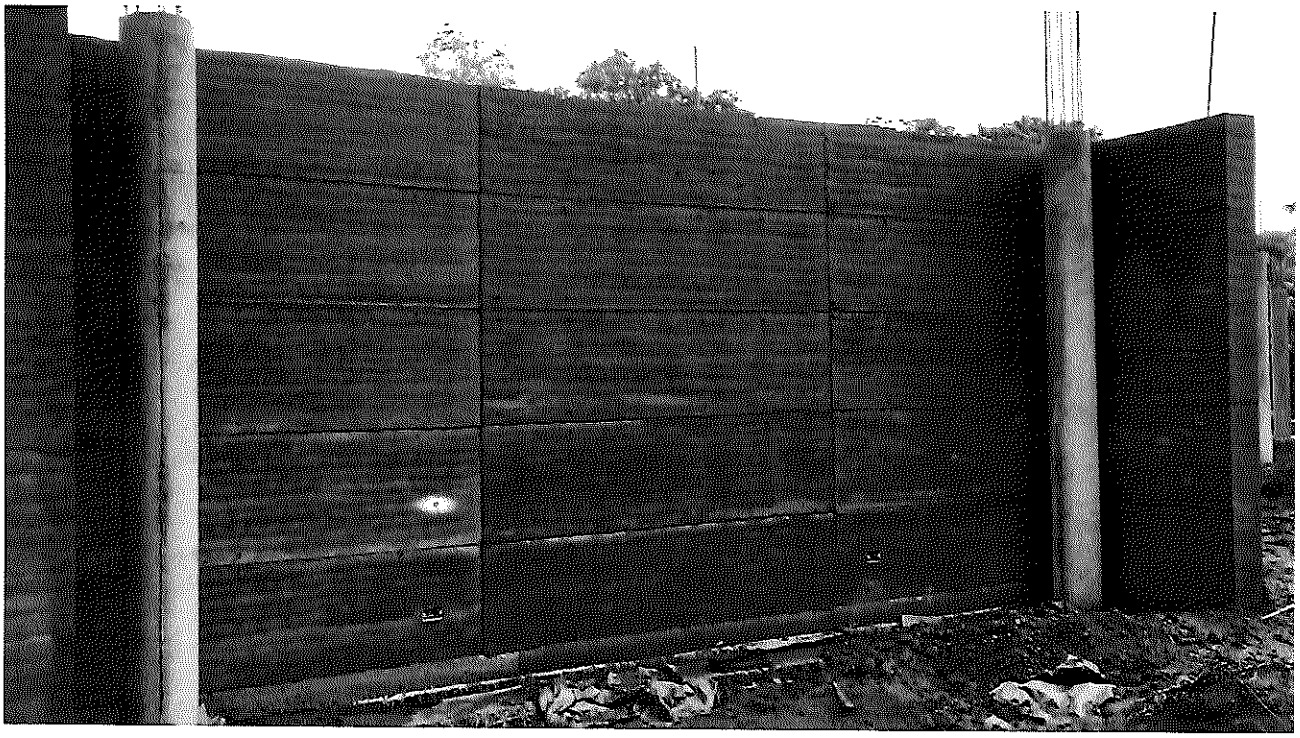

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

ESCUELA BASICA N° 1251 SAN FRANCISCO DE ASIS-CAAGUAZU

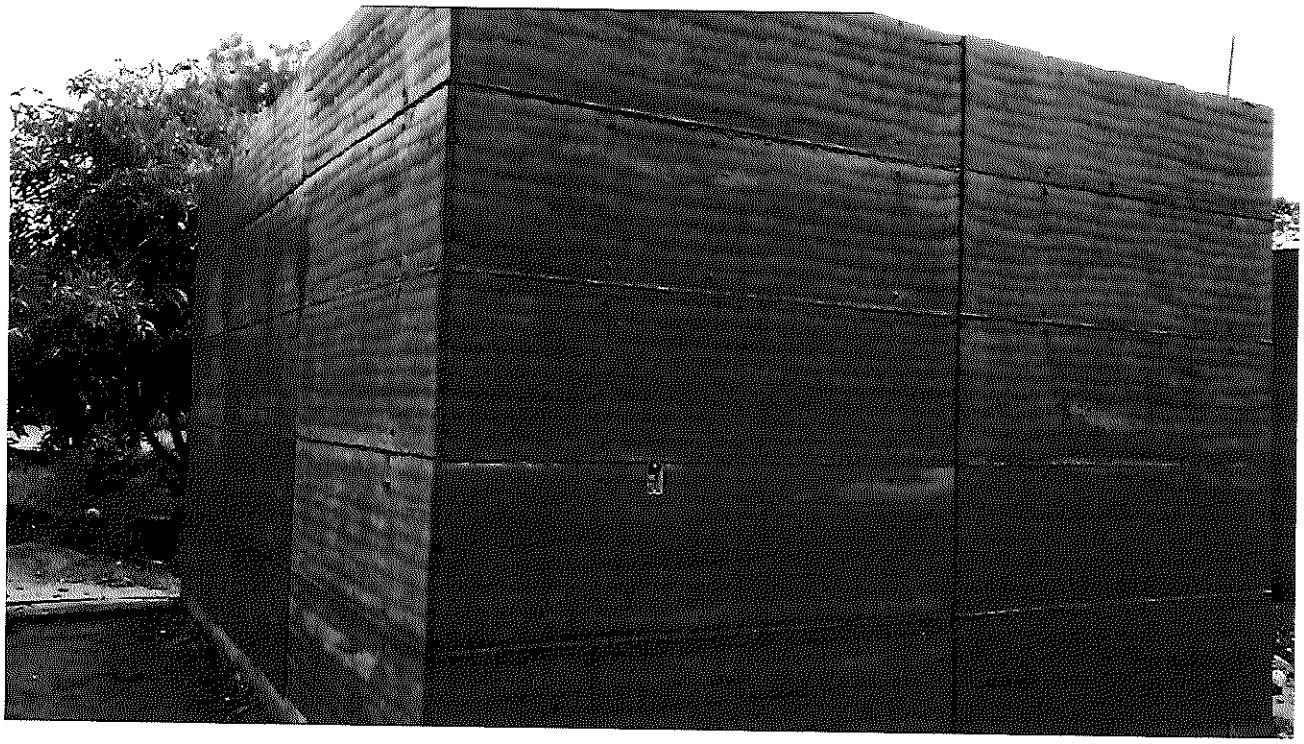

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

ESCUELA BASICA N° 568 LAS RESIDENTAS-SAN PEDRO

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

ESCUELA BASICA N° 568 LAS RESIDENTAS-SAN PEDRO

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

ESCUELA BASICA N° 182 DR. ANTOLIN GARCETE-PDTE. HAYES

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

ESCUELA BASICA N° 182 DR. ANTOLIN GARCETE-PDTE. HAYES

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 592-SAN JUAN BOSCO-CONCEPCION

DIA	MES DE NOVIEMBRE-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/11/20		
02/11/20		
03/11/20		
04/11/20		
05/11/20		
06/11/20		
07/11/20		
08/11/20	1	
09/11/20	1	
10/11/20	1	
11/11/20		
12/11/20		
13/11/20		
14/11/20	1	
15/11/20	1	
16/11/20		1
17/11/20	1	
18/11/20	1	
19/11/20		1
20/11/20		1
21/11/20		
22/11/20		
23/11/20		
24/11/20		
25/11/20		
26/11/20	1	
27/11/20		1
28/11/20		
29/11/20	1	
30/11/20		1
TOTAL	**9**	**5**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	14

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 1251-SAN FRANCISCO DE ASIS-CAAGUAZU

DIA	MES DE NOVIEMBRE-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/11/20		
02/11/20		
03/11/20		
04/11/20		
05/11/20		
06/11/20		
07/11/20		
08/11/20	1	
09/11/20	1	
10/11/20		1
11/11/20		1
12/11/20		
13/11/20		
14/11/20	1	
15/11/20		1
16/11/20		
17/11/20		
18/11/20		
19/11/20		
20/11/20		
21/11/20		
22/11/20		
23/11/20		
24/11/20		
25/11/20	1	
26/11/20	1	
27/11/20		1
28/11/20		1
29/11/20	1	
30/11/20	1	
TOTAL	**7**	**5**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	12

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 568-LAS RESIDENTAS-SAN PEDRO

DIA	MES DE NOVIEMBRE-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/11/20		
02/11/20		
03/11/20		
04/11/20		
05/11/20		
06/11/20		
07/11/20		
08/11/20	1	
09/11/20		1
10/11/20	1	
11/11/20		1
12/11/20		
13/11/20		
14/11/20	1	
15/11/20	1	
16/11/20		1
17/11/20	1	
18/11/20	1	
19/11/20		1
20/11/20		1
21/11/20		
22/11/20		
23/11/20		
24/11/20		
25/11/20		
26/11/20	1	
27/11/20		1
28/11/20		
29/11/20	1	
30/11/20	1	
TOTAL	**9**	**6**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	15

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 182-DR. ANTOLIN GARCETE-PDTE. HAYES

DIA	MES DE NOVIEMBRE-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/11/20		
02/11/20		
03/11/20		
04/11/20		
05/11/20		
06/11/20		
07/11/20		
08/11/20	1	
09/11/20	1	
10/11/20	1	
11/11/20		1
12/11/20		1
13/11/20		1
14/11/20	1	
15/11/20	1	
16/11/20		1
17/11/20	1	
18/11/20		1
19/11/20		
20/11/20		
21/11/20		
22/11/20		
23/11/20		
24/11/20		
25/11/20	1	
26/11/20	1	
27/11/20		1
28/11/20		1
29/11/20	1	
30/11/20	1	
TOTAL	**10**	**7**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	17

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CONCEPCIÓN	23° 26' 29,51"	57° 25' 48,67"	75 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1											0,0	
2											0,0	
3											0,0	
4											0,0	
5											0,0	
6											0,0	
7											0,0	
8											11,2	
9											9,0	
10											10,8	
11											0,0	
12											0,0	
13											0,0	
14											52,6	
15											27,8	
16											1,0	
17											17,8	
18											10,8	
19											0,0	
20											0,0	
21											0,0	
22											0,0	
23											0,0	
24											0,0	
25											0,0	
26											5,4	
27											0,0	
28											0,0	
29											14,6	
30											0,0	
31												
Total											161	
Máx.24h											52,6	
Día Máx.											14	

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	25° 29' 01,48"	56° 22' 39,87"	159 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1											0,0	
2											0,0	
3											0,0	
4											0,0	
5											0,0	
6											0,0	
7											0,0	
8											25,4	
9											5,0	
10											1,1	
11											0,0	
12											0,0	
13											0,0	
14											39,0	
15											0,0	
16											0,0	
17											1,6	
18											0,0	
19											0,0	
20											0,0	
21											0,0	
22											0,0	
23											0,0	
24											0,0	
25											10,4	
26											35,9	
27											0,0	
28											0,0	
29											20,4	
30											5,0	
31												
Total											147	
Máx, 24h											39	
Día Máx,											14	

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1											0,0	
2											0,0	
3											0,0	
4											0,0	
5											0,0	
6											0,0	
7											0,0	
8											22,5	
9											0,0	
10											7,8	
11											0,0	
12											0,0	
13											0,0	
14											24,0	
15											28,0	
16											1,0	
17											20,0	
18											18,3	
19											0,0	
20											0,0	
21											0,0	
22											0,0	
23											0,0	
24											0,0	
25											0,0	
26											28,2	
27											0,0	
28											0,0	
29											3,0	
30											7,0	
31												
Total											160	
Máx.24h											28,2	
Día Máx.											26	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												
2											0,0	
3											0,0	
4											0,0	
5											0,0	
6											0,0	
7											0,0	
8											T	
9											33,3	
10											10,7	
											6,0	
11												
12											0,0	
13											0,0	
14											0,0	
15											62,3	
16											3,9	
17											0,0	
18											4,0	
19											0,0	
20											0,0	
											0,0	
21												
22											0,0	
23											0,0	
24											0,0	
25											0,0	
26											37,0	
27											20,4	
28											0,0	
29											T	
30											28,7	
31											15,7	
Total											222	
Máx. 24h											62,3	
Día Máx.											14	

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay
