“INFORME DE EJECUCIÓN TE N° 2”

Consultor: FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A
Para:
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MITIC)

Ciudad: Asunción – Paraguay
2024

Detalles de la Documentación

Tipo de Documentación:	Informe de Ejecución
Cliente:	MITIC
Interesados:	MITIC
Autores:	Freelancers del Paraguay
Fecha de Entrega:	01/10/2024

Versiones y Modificaciones

Versión	Fecha	Autor	Modificaciones
1.0	01/10/2024	Freelancers del Paraguay	Inicio

SISTEMA CONVERGENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HAMBRE CERO

Diagrama de Gantt **3**

Horas Ejecutadas **4**

Tareas Ejecutadas **5**

1. TE #14773 Implementación Hambre Cero Geoportal p1 Distritos y Escuelas. 5
2. TE #14749 Pantalla Gestión de Proyecto - Actualización de validaciones. 6
3. TE #14678 Módulo de Usuarios y Roles. Actualización de gobernación y nutricionista. 7
4. TE #14744 Aprobaciones. Nota Autorización y Remisión a CONAE - Nota de Gobernación. 8
5. TE #14746 Proyectos - Flujo de Cambios de Estado. 10
6. TE #14750 Pantalla de Licitaciones. 13
7. TE #14939 Reunión 26/07/2024. 15
8. TE #14619 Creación de Proyecto por departamento + Modificación de precio referencial por departamento. 16
9. TE #14620 Redacción Informe de estado Hambre Cero fase 2. 17
10. TE #14753 Menú Cíclico Mejoras. 18
11. TE #14940 Reunión 16/08/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC. 19
12. TE #14756 Módulos Lotes Actualizaciones. 20
13. TE #14758 Reporte de instituciones por matrículas, distritos, departamentos. 22
14. TE #14944 Reunión 21/08/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC MDS DNCP. 23
15. TE #14755 Reporte del estado de las convocatorias. por grupos por tipo de proyectos por cada proceso del sistema. 24
16. TE #14941 Reunión 23/08/2024 Equipo Técnico H0 - MITIC. 25
17. TE #14774 Implementación Hambre Cero en Geoportal - Puntos Escuelas IGEP, HIS. 26
18. TE #14787 Carga de Proyectos de Alimentación según últimas versiones. 27
19. TE #14788 Control de Listado de instituciones según PDF de Resolución de Conae vs Sistema. 28
20. TE #14772 Mejora en impresiones de proyectos de alimentación. 30
21. TE #14834 Gestión de proyectos. Modificación de precios referenciales a tablas, campos de cantidades de instituciones y matriculados. 31
22. TE #14942 Reunión 30/08/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC. 32
23. TE #14949 Impresión Menú Cíclico. Impresiones de Proyecto total. 33
24. TE #14964 Reporte por año conformación de los presupuestos por departamentos, por distrito, por matrícula, raciones. 34
25. TE #14935 Proyectos Generados. Modificación de presupuestos. 36
26. TE #14931 Geoportal para hambre Cero - Verificación de performance. Verificación de archivos de traducciones e implementación de geoprocesamiento. 38
27. TE #14936 Geoportal - Carga de datos de pruebas, poligonales y procesamiento de buffer e intersección. Reunión con Viceministro para muestra de funcionalidades. 39
28. TE #14970 Generación de órdenes de trabajo. Licitaciones. Adecuación de Impresión de Excel 40
29. TE #14943 Reunión 06/09/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC. 41
30. TE #14946 Grupos. Cambio de lógica de selección de instituciones. 42

31. TE #14950 Costos por Insumos. Corrección lógica de Insumos. Impresión y generación de archivo .CSV 43
32. TE #14947 Dictámenes. Modificaciones en lógica. 46
33. TE #14976 Confección de presentación de SIAE. Videos demostrativos. Presentación oficial 16 gobernaciones 13/09/2024. 47
34. TE #15018 Lógica de Cierre de grupos. 48
35. TE #15053 Resolución CONAE. Dinamizar la pantalla de creación de un dictamen. Se solicita que todos los textos sean editables, no solo ciertas variables. 49
36. TE #15047 Redacción y modificación de informe para Diputados. 50
37. TE #15046 Reunión 20/09/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC. 51
38. TE #15049 Histórico de Proyectos Generados y Licitaciones. 52
39. TE #15052 Desarrollo Modal Histórico de Proyectos 53
40. TE #15054 Histórico de Aprobaciones 54

Diagrama de Gantt

Diagrama exportado del sistema Redmine , sistema de Gestión de Proyectos del MITIC.

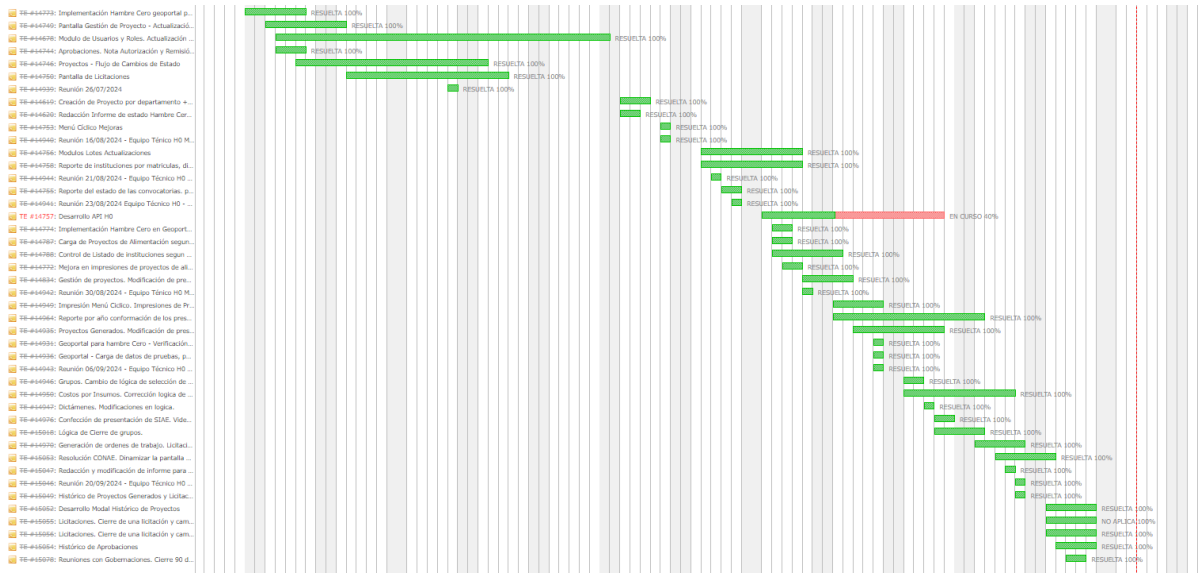

Horas Ejecutadas

Las horas totales ejecutadas a la fecha 01/10/2024 son de **1098 horas.**

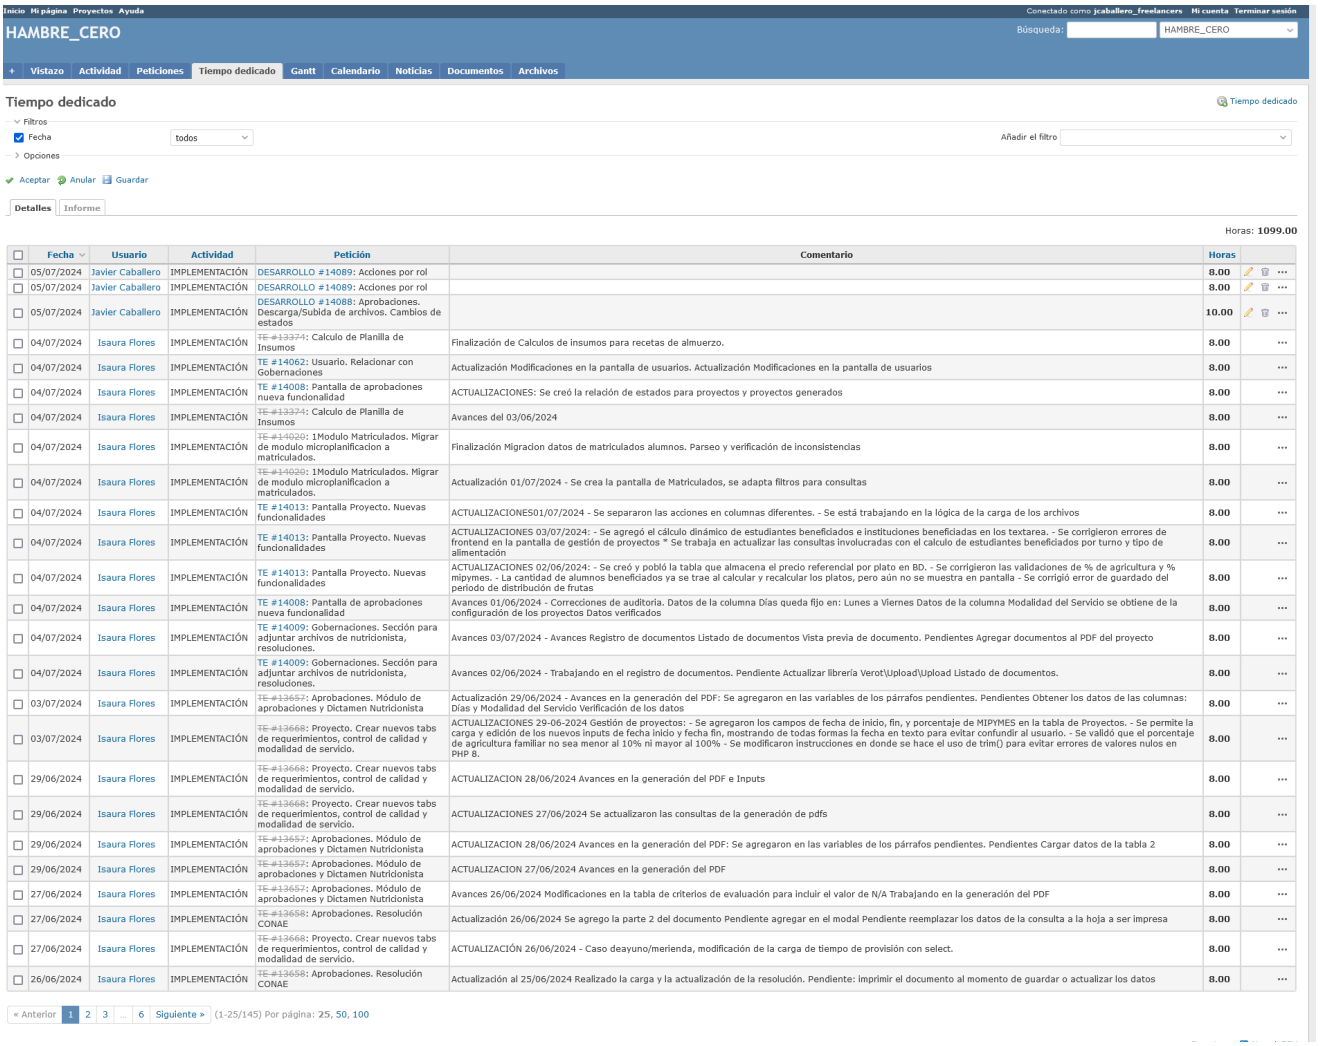

Inicio Mi página Proyectos Ayuda — Conectado como jcaballero_freelancers Mi cuenta Terminar sesión

HAMBRE_CERO — Búsqueda: HAMBRE_CERO

+ | Vistazo | Actividad | Peticiones | Tiempo dedicado | Gantt | Calendario | Noticias | Documentos | Archivos

Tiempo dedicado — Tiempo dedicado

Filtros — Fecha: todos — Añadir el filtro

Opciones

Aceptar | Anular | Guardar

Detalles | Informe

Horas: 1099.00

Fecha	Usuario	Actividad	Petición	Comentario	Horas
05/07/2024	Javier Caballero	IMPLEMENTACIÓN	DESARROLLO #14089: Accdones por rol		8.00
05/07/2024	Javier Caballero	IMPLEMENTACIÓN	DESARROLLO #14089: Accdones por rol		8.00
05/07/2024	Javier Caballero	IMPLEMENTACIÓN	DESARROLLO #14088: Aprobaciones. Descarga/Subida de archivos. Cambios de estados		10.00
04/07/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #13374~~: Calculo de Planilla de Insumos	Finalización de Calculos de insumos para recetas de almuerzo.	8.00
04/07/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	TE #14062: Usuario. Relacionar con Gobernaciones	Actualización Modificaciones en la pantalla de usuarios. Actualización Modificaciones en la pantalla de usuarios	8.00
04/07/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	TE #14008: Pantalla de aprobaciones nueva funcionalidad	ACTUALIZACIONES: Se creó la relación de estados para proyectos y proyectos generados	8.00
04/07/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #13374~~: Calculo de Planilla de Insumos	Avances del 03/06/2024	8.00
04/07/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #14020~~: 1Modulo Matriculados. Migrar de modulo microplanificacion a matriculados.	Finalización Migracion datos de matriculados alumnos. Parseo y verificación de inconsistencias	8.00
04/07/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #14020~~: 1Modulo Matriculados. Migrar de modulo microplanificacion a matriculados.	Actualización 01/07/2024 - Se crea la pantalla de Matriculados, se adapta filtros para consultas	8.00
04/07/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	TE #14013: Pantalla Proyecto. Nuevas funcionalidades	ACTUALIZACIONES01/07/2024 - Se separaron las acciones en columnas diferentes. - Se está trabajando en la lógica de la carga de los archivos	8.00
04/07/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	TE #14013: Pantalla Proyecto. Nuevas funcionalidades	ACTUALIZACIONES 03/07/2024: - Se agregó el cálculo dinámico de estudiantes beneficiados e instituciones beneficiadas en los textarea. - Se corrigieron errores de frontend en la pantalla de gestión de proyectos * Se trabaja en actualizar las consultas involucradas con el calculo de estudiantes beneficiados por turno y tipo de alimentación	8.00
04/07/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	TE #14013: Pantalla Proyecto. Nuevas funcionalidades	ACTUALIZACIONES 02/06/2024: - Se creó y pobló la tabla que almacena el precio referencial por plato en BD. - Se corrigieron las validaciones de % de agricultura y % mipymes. - La cantidad de alumnos beneficiados ya se trae al calcular y recalcular los platos, pero aún no se muestra en pantalla - Se corrigió error de guardado del período de distribución de frutas	8.00
04/07/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	TE #14008: Pantalla de aprobaciones nueva funcionalidad	Avances 01/06/2024 - Correcciones de auditoría. Datos de la columna Días queda fijo en: Lunes a Viernes Datos de la columna Modalidad del Servicio se obtiene de la configuración de los proyectos Datos verificados	8.00
04/07/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	TE #14009: Gobernaciones. Sección para adjuntar archivos de nutricionista, resoluciones.	Avances 03/07/2024 - Avances Registro de documentos Listado de documentos Vista previa de documento. Pendientes Agregar documentos al PDF del proyecto	8.00
04/07/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	TE #14009: Gobernaciones. Sección para adjuntar archivos de nutricionista, resoluciones.	Avances 02/06/2024 - Trabajando en el registro de documentos. Pendiente Actualizar librería Verot\Upload\Upload Listado de documentos.	8.00
03/07/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #13657~~: Aprobaciones. Módulo de aprobaciones y Dictamen Nutricionista	Actualización 29/06/2024 - Avances en la generación del PDF: Se agregaron en las variables de los párrafos pendientes. Pendientes Obtener los datos de las columnas: Días y Modalidad del Servicio Verificación de los datos	8.00
03/07/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #13668~~: Proyecto. Crear nuevos tabs de requerimientos, control de calidad y modalidad de servicio.	ACTUALIZACIONES 29-06-2024 Gestión de proyectos: - Se agregaron los campos de fecha de inicio, fin, y porcentaje de MIPYMES en la tabla de Proyectos. - Se permite la carga y edición de los nuevos inputs de fecha inicio y fecha fin, mostrando de todas formas la fecha en texto para evitar confundir al usuario. - Se validó que el porcentaje de agricultura familiar no sea menor al 10% ni mayor al 100% - Se modificaron instrucciones en donde se hace el uso de trim() para evitar errores de valores nulos en PHP 8.	8.00
29/06/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #13668~~: Proyecto. Crear nuevos tabs de requerimientos, control de calidad y modalidad de servicio.	ACTUALIZACION 28/06/2024 Avances en la generación del PDF e Inputs	8.00
29/06/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #13668~~: Proyecto. Crear nuevos tabs de requerimientos, control de calidad y modalidad de servicio.	ACTUALIZACIONES 27/06/2024 Se actualizaron las consultas de la generación de pdfs	8.00
29/06/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #13657~~: Aprobaciones. Módulo de aprobaciones y Dictamen Nutricionista	ACTUALIZACION 28/06/2024 Avances en la generación del PDF: Se agregaron en las variables de los párrafos pendientes. Pendientes Cargar datos de la tabla 2	8.00
29/06/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #13657~~: Aprobaciones. Módulo de aprobaciones y Dictamen Nutricionista	ACTUALIZACION 27/06/2024 Avances en la generación del PDF	8.00
27/06/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #13657~~: Aprobaciones. Módulo de aprobaciones y Dictamen Nutricionista	Avances 26/06/2024 Modificaciones en la tabla de criterios de evaluación para incluir el valor de N/A Trabajando en la generación del PDF	8.00
27/06/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #13658~~: Aprobaciones. Resolución CONAE	Actualización 26/06/2024 Se agrego la parte 2 del documento Pendiente agregar en el modal Pendiente reemplazar los datos de la consulta a la hoja a ser impresa	8.00
27/06/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #13668~~: Proyecto. Crear nuevos tabs de requerimientos, control de calidad y modalidad de servicio.	ACTUALIZACIÓN 26/06/2024 - Caso deayuno/merienda, modificación de la carga de tiempo de provisión con select.	8.00
26/06/2024	Isaura Flores	IMPLEMENTACIÓN	~~TE #13658~~: Aprobaciones. Resolución CONAE	Actualización al 25/06/2024 Realizado la carga y la actualización de la resolución. Pendiente: imprimir el documento al momento de guardar o actualizar los datos	8.00

« Anterior 1 2 3 ... 6 Siguiente » (1-25/145) Por página: 25, 50, 100

Tareas Ejecutadas

1. TE #14773 Implementación Hambre Cero Geoportal p1 Distritos y Escuelas.

HAMBRE_CERO - TE #14773

Implementación Hambre Cero geoportal p1 Distritos y Escuelas

28/08/2024 14:00 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	06/07/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	11/07/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	32.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	32.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 28/08/2024 14:03 - Isaura Flores

- Añadido Fichero Distritos_Paraguay_Codigos_DGEEC.xlsx

- Fecha de inicio cambiado de 05/07/2024 a 06/07/2024

#2 - 28/08/2024 14:04 - Isaura Flores

- Añadido Fichero establecimientos_20240708.csv

- Añadido Fichero esta1.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

#3 - 28/08/2024 14:06 - Isaura Flores

- Añadido Fichero Lista2.csv

- Añadido Fichero mec.csv

- Estado cambiado de SIN INICIAR a EN CURSO

- % Realizado cambiado de 0 a 60

#4 - 28/08/2024 14:09 - Isaura Flores

- Añadido Fichero geo2.png

- Añadido Fichero geo1.png

- Añadido Fichero geo3.png

- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 60 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 32.00 h:
- Implementación Hambre cero geoportal p1 Distritos y Escuelas.
- Tiempo dedicado: 32.00 h:
- Actualizaciones 06-07-2014 - Reunión de Planificación de muestras de distritos. Generación de listado de distritos y limpieza de datos.
- Actualización 08-07-2024 - Obtención de datos de establecimientos del MEC limpieza y parseo.
- Actualizaciones al 10-07-2024 Reunión de limpieza de datos, muestra de funcionamiento y carga MITIC - Estandarización de formatos de carga y generación de archivo MEC según estándar.
- Actualización 11-07-2024 - Carga y actualización en Geoportal.

2. TE #14749 Pantalla Gestión de Proyecto - Actualización de validaciones.

HAMBRE_CERO - TE #14749

Pantalla Gestión de Proyecto - Actualización de validaciones

26/08/2024 11:11 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	08/07/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	15/07/2024
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	40.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	40.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 26/08/2024 11:20 - Isaura Flores
- Añadido Fichero pr3.png
- Añadido Fichero pr2.png
- Añadido Fichero pr1.png
- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR
- % Realizado cambiado de 0 a 10

#2 - 26/08/2024 11:23 - Isaura Flores
- Añadido Fichero bn5.png
- Añadido Fichero bn4.png
- Añadido Fichero bn3.png
- Añadido Fichero bn2.png
- Añadido Fichero bn1.png
- % Realizado cambiado de 10 a 20

#3 - 26/08/2024 11:25 - Isaura Flores
- Añadido Fichero imp3.png
- Añadido Fichero imp2.png
- Añadido Fichero imp1.png
- Estado cambiado de SIN INICIAR a EN CURSO
- % Realizado cambiado de 20 a 30

#4 - 26/08/2024 11:27 - Isaura Flores
- Añadido Fichero val2.png
- Añadido Fichero val1.png
- Fecha fin cambiado de 12/07/2024 a 17/07/2024
- Tiempo estimado cambiado de 32.00 h a 48.00 h

#5 - 26/08/2024 11:28 - Isaura Flores
- Añadido Fichero men3.png
- Añadido Fichero men2.png
- Añadido Fichero men1.png

#6 - 26/08/2024 11:30 - Isaura Flores
- Fecha fin cambiado de 17/07/2024 a 15/07/2024
- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

23/09/2024 *1/2*

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 40.00 h:
- Pantalla Gestión de Proyecto - Actualización de validaciones.
- Tiempo dedicado: 40.00 h:
- Actualización 08/07/2024 - Se separó el cálculo de desayuno y merienda basando la lógica de tipo de alimentación en el turno_id de cada matriculado.
- Se trabaja en el cálculo durante la fusión para guardar los datos en el proyecto generado y no tener que volver a calcular los campos.
- Actualización 09/07/2024 - La cantidad de beneficiados ya se guardan en BD una vez fusionados en un proyecto generado. - Los pdfs que muestran esta información

también fueron actualizados. En la impresión en Aprobaciones aún queda pendiente solo usar los datos guardados en vez de los calculados.

- Actualizaciones 10/07/2024 - Se agregó la firma del gobernador y la nutricionista en el footer de la última hoja del proyecto generado. - Se corrigieron las consultas de cálculo de platos necesarios por año y se actualizaron los PDF.
- Actualización 12/07/2024 - Se agregaron validaciones en la pantalla de menú cíclico: 1- Carne vacuna 1 o dos veces a la semana máximo no consecutivos 2- Carne de pollo 1 o dos veces a la semana máximo, no consecutivos 3- Carne de chancho 1 o dos veces a la semana máximo, no consecutivos 4- Cuando la comida tiene legumbre, el postre si o si debe ser una fruta cítrica (editado) También se agregaron validaciones en el desayuno/merienda.
- Actualización 15/08/2024 - Se corrigieron las validaciones en la carga de menú cíclico y ya se validan los desayunos/merienda para que no sean cargados de manera consecutiva y que existan al menos 3 sólidos diferentes en la semana.

3. TE #14678 Módulo de Usuarios y Roles. Actualización de gobernación y nutricionista.

HAMBRE_CERO - TE #14678

Modulo de Usuarios y Roles. Actualización de gobernación y nutricionista

20/08/2024 10:21 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	09/07/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	10/08/2024
Asignado a:	Daniel Insaurralde	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	16.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	16.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 26/08/2024 10:11 - Isaura Flores

- Añadido Fichero d2.png

- Añadido Fichero d1.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 50

Actualización

- Se modificó la pantalla de usuario para que la gobernación no sea requerida. Si se asigna una gobernación a un usuario, los datos serán filtrados.
- Se validaron las acciones de las columnas Proyecto, Dictamen Técnico, Nota Autorización, Resolución CONAE segun el rol del usuario:
  Presidente CONAE: Resolución CONAE
  Director DGAE: Nota Autorización
  Nutricionista DGAE: Dictamen

#2 - 26/08/2024 10:14 - Isaura Flores

- Añadido Fichero n1.png

- Añadido Fichero n4.png

- Añadido Fichero n3.png

- Añadido Fichero n2.png

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 50 a 100

Actualización

Se agregó el campo Registro Profesional para los usuarios de tipo Nutricionista

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 16.00 h:
- Módulo de Usuarios y Roles. Actualización de gobernación y nutricionista.
- Tiempo dedicado: 16.00 h:
- Actualización 09/07/2024 -Pantalla usuario y validaciones en columnas proyecto, dictamen, nota y resolución.
- Actualización 10/07/2024 - Rol Nutricionista.

4. TE #14744 Aprobaciones. Nota Autorización y Remisión a CONAE - Nota de Gobernación.

HAMBRE_CERO - TE #14744

Aprobaciones. Nota Autorización y Remisión a CONAE - Nota de Gobernación

26/08/2024 10:16 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	09/07/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	11/07/2024
Asignado a:	Angel Ojeda	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	24.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	24.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 26/08/2024 10:19 - Isaura Flores

- Añadido Fichero nota1.png

- Añadido Fichero nota3.png

- Añadido Fichero nota2.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 30

#2 - 26/08/2024 10:21 - Isaura Flores

- Añadido Fichero gober5.png

- Añadido Fichero gober4.png

- Añadido Fichero gober3.png

- Añadido Fichero gober2.png

- Añadido Fichero gober1.png

- Estado cambiado de SIN INICIAR a EN CURSO

#3 - 26/08/2024 10:24 - Isaura Flores

- Añadido Fichero pd4.png

- Añadido Fichero pd3.png

- Añadido Fichero pd2.png

- Añadido Fichero pd1.png

- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 30 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 24.00 h:
- Aprobaciones. Nota Autorización y Remisión a CONAE - Nota de Gobernación.
- Tiempo dedicado: 24.00 h:
- Actualización 09/07/2024 - Se realizan modificaciones a la estructura de la nota de aprobación. Se unifican los colores a gris de los campos a completar.
- Actualización 10/07/2024 - Se realizaron funciones de agregar y editar nota de gobernación. Pendiente subir pdf.
- Actualización 11/07/2024 - Se realizó la subida de pdf en nota de autorización.

5. TE #14746 Proyectos - Flujo de Cambios de Estado.

HAMBRE_CERO - TE #14746

Proyectos - Flujo de Cambios de Estado

26/08/2024 10:28 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	11/07/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	29/07/2024
Asignado a:	Daniel Insaurralde	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	72.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	72.00 horas
NRO_TE:	2		

Descripción

Realizar el seguimiento de aprobación o rechazo de los proyectos de alimentación

Histórico

#1 - 26/08/2024 10:31 - Isaura Flores

- Añadido Fichero f4.png

- Añadido Fichero f3.png

- Añadido Fichero f2.png

- Añadido Fichero f1.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- Fecha de inicio cambiado de 12/07/2024 a 11/07/2024

- % Realizado cambiado de 0 a 10

#2 - 26/08/2024 10:33 - Isaura Flores

- Añadido Fichero doc3.png

- Añadido Fichero doc2.png

- Añadido Fichero doc1.png

- Añadido Fichero video_detalle.mp4

- % Realizado cambiado de 10 a 20

#3 - 26/08/2024 10:34 - Isaura Flores

- Añadido Fichero h3.png

- Añadido Fichero h2.png

- Añadido Fichero h1.png

- Estado cambiado de SIN INICIAR a EN CURSO

- % Realizado cambiado de 20 a 30

#4 - 26/08/2024 10:36 - Isaura Flores

- Añadido Fichero a5.png

- Añadido Fichero a4.png

- Añadido Fichero a3.png

- Añadido Fichero a2.png

- Añadido Fichero a1.png

- % Realizado cambiado de 30 a 40

Pendientes

Historial de estados e historial de estados al cambiar de estado a En curso en cualquiera de los pasos
Validaciones al momento de realizar el cambio de estado a En curso en cualquiera de los pasos
Al rechazar el proyecto, cambiar la columna id en la tabla proyectos y guardar los datos en la tabla proyectos_generados_historicos

#5 - 26/08/2024 11:00 - Isaura Flores

- Añadido Fichero his3.png

- Añadido Fichero his2.png

- Añadido Fichero his1.png

#6 - 26/08/2024 11:01 - Isaura Flores

- Añadido Fichero ap2.png

- Añadido Fichero ap1.png

#7 - 26/08/2024 11:03 - Isaura Flores

- Añadido Fichero ges4.png

- Añadido Fichero ges3.png

- Añadido Fichero ges2.png

- Añadido Fichero ges1.png

- % Realizado cambiado de 40 a 50

Aprobaciones

Ver PDF: En las columnas Dictamen Técnico, Nota Autorización, Resolución CONAE mostrar pdf cargado si está disponible
Corregir error al editar el dictamen
Gestión de proyectos

Cambiar la columna estado y filtros con los nuevos valores
Permitir la modificación de proyectos con estado Borrador, Dictamen Rechazado y Retornado por CONAE

#8 - 26/08/2024 11:06 - Isaura Flores

- Añadido Fichero pf2.png

- Añadido Fichero pf1.png

- Fecha fin cambiado de 29/09/2024 a 29/07/2024

- % Realizado cambiado de 50 a 80

- Tiempo estimado cambiado de 88.00 h a 72.00 h

Tareas

Aprobaciones

Al rechazar el proyecto, cambiar la columna id en la tabla proyectos y guardar los datos en la tabla proyectos_generados_historicos
Ver PDF: En las columnas Dictamen Técnico, Nota Autorización, Resolución CONAE mostrar pdf cargado si está disponible
Corregir error al editar el dictamen

Gestión de proyectos

Cambiar la columna estado y filtros con los nuevos valores
Permitir la modificación de proyectos con estado Borrador, Dictamen Rechazado y Retornado por CONAE
En la acción de Revertir dejar el proyecto generado como histórico

#9 - 26/08/2024 11:08 - Isaura Flores

- Añadido Fichero fl3.png

- Añadido Fichero fl2.png

- Añadido Fichero fl1.png

- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 80 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 72.00 h:
- Proyectos - Flujo de Cambios de Estado.
- Tiempo dedicado: 72.00 h:
- Actualización 11/07/2024 - Se deshabilitan los botones hasta que el paso anterior esté finalizado, Tabla proyectos_generados_historicos creada Trabajando en actualización de estados.
- Actualización 12/07/2024 - Secuencia de cambios de estado video_detalle.mp4 Pendientes Validaciones para el cambio de estado Historial de estados.

- Actualización 15/07/2024 Trabajando en validaciones para el cambio de estado Pendientes Historial de estados.
- Actualización 16/07/2024 Se agregó la columna acciones para el rol Administrador (Id: 1), el cual permite modificar a cualquier estado. Se implementó auditoría e historial de estados al momento de realizar el cambio de estado Validaciones al momento de realizar el cambio de estado.
- Actualización 24/07/2024 - Historial de estados e historial de estados al cambiar de estado a En curso en cualquiera de los pasos -Validaciones al momento de realizar el cambio de estado a En curso en cualquiera de los pasos.
- Actualización 25/07/2024 Aprobaciones No permitir actualización a los estados Borrador, Dictamen Rechazado y Retornado por CONAE desde la acción actualizar estado. No permitir cambio de estado sin tener documento adjunto.
- Actualización 26/07/2024 - Modificaciones en Aprobaciones y Gestión de proyectos.
- Actualización 25/07/2024 -Flujo de rechazo aprobaciones y gestión de proyectos
- Actualización 29/07/2024 - Aprobaciones Al rechazar el proyecto, cambiar la columna id en la tabla proyectos y guardar los datos en la tabla proyectos_generados_historicos Gestión de proyectos En la acción de Revertir dejar el proyecto generado como histórico.

6. TE #14750 Pantalla de Licitaciones.

HAMBRE_CERO - TE #14750

Pantalla de Licitaciones

26/08/2024 11:32 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	16/07/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	31/07/2024
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	80.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	80.00 horas
NRO_TE:	2		

Descripción

Histórico

#1 - 26/08/2024 11:34 - Isaura Flores

- Añadido Fichero li4.png

- Añadido Fichero li3.png

- Añadido Fichero li2.png

- Añadido Fichero li1.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 10

#2 - 26/08/2024 11:35 - Isaura Flores

- Añadido Fichero lot6.png

- Añadido Fichero lot5.png

- Añadido Fichero lot4.png

- Añadido Fichero lot3.png

- Añadido Fichero lot2.png

- Añadido Fichero lot1.png

- % Realizado cambiado de 10 a 20

#3 - 26/08/2024 11:40 - Isaura Flores

- Añadido Fichero l3.png

- Añadido Fichero l2.png

- Añadido Fichero l1.png

- Estado cambiado de SIN INICIAR a EN CURSO

- % Realizado cambiado de 20 a 30

#4 - 26/08/2024 11:46 - Isaura Flores

- Añadido Fichero l3.png

- Añadido Fichero l2.png

- Añadido Fichero l1.png

- Añadido Fichero lo1.png

#5 - 26/08/2024 11:49 - Isaura Flores

- Añadido Fichero dis3.png

- Añadido Fichero dis2.png

- Añadido Fichero dis1.png

Los lotes ya se guardan:

Durante el guardado se valida :
- Que la modalidad de servicio seleccionada en el lote corresponda a una modalidad relacionada al proyecto Aprobado. Para el caso en que el proyecto solo trate desayuno / merienda se podrá seleccionar cualquier modalidad de servicio
- Que se selecciones al menos un distrito relacionado

- Que exista el proyecto generado y los proyectos relacionados al mismo
- Que la licitación esté actica y el proyecto aprobado
- Que el lote aún no exista dentro de la licitación

#6 - 26/08/2024 11:52 - Isaura Flores

- Añadido Fichero lic5.png

- Añadido Fichero lic4.png

- Añadido Fichero lic3.png

- Añadido Fichero lic2.png

- Añadido Fichero lic1.png

- % Realizado cambiado de 30 a 40

Todas las acciones ya se realizan correctamente:
- Carga, edición, filtrado y cambio de estado de licitación
- Carga, edición, eliminación de Lotes y sus correspondientes distritos
- Queda pendiente la impresión del XLS de Licitación

#7 - 26/08/2024 11:54 - Isaura Flores

- Añadido Fichero av2.png

- Añadido Fichero av1.png

Se creó la consulta que lista el detalle de los lotes en el excel
- Se agregó la librería phpoffice/phpspreadsheet
- Se corrigió la consulta de distritos por lote

#8 - 26/08/2024 11:57 - Isaura Flores

- Añadido Fichero lici2.png

- Añadido Fichero lici1.png

#9 - 26/08/2024 11:59 - Isaura Flores

- Añadido Fichero ins4.png

- Añadido Fichero ins3.png

- Añadido Fichero ins2.png

- Añadido Fichero ins1.png

- Se corrigió el cálculo de raciones por institución basándose en:
[Total de alumnos de la institución] * [Cantidad de tipo de alimentación] * [Suma de días de los años involucrados]
- Se agregó la auditoría a la carga, edición y cambio de estado de licitación.
- Se agregó la auditoría a la carga y edición de lotes

#10 - 26/08/2024 12:01 - Isaura Flores

- Añadido Fichero fn5.png

- Añadido Fichero fn3.png

- Añadido Fichero fn2.png

- Añadido Fichero fn1.png

- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 40 a 100

- Se culminó la implementación de la auditoria en la pantalla de Licitaciones
- Se corrigió el ordenamiento en todas las consultas que lo requieren
Para el efecto se implementó una lista blanca de campos ordenables que cumple con la función de verificar que el parámetro recibido por Request sea realmente un campo válido en la consulta.
Con esta actualización queda listo para pruebas la pantalla de Licitaciones.

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 80.00 h:
- Pantalla de Licitaciones.
- Tiempo dedicado: 80.00 h:
- Actualización 16/07/2024 - Se creó la estructura para el manejo de Licitaciones - Las licitaciones ya pueden ser cargadas.
- Actualización 17/07/2024 - Creación de pantalla de lote.
- Actualización 22/07/2024 - Se actualizaron las funcionalidades a la sintaxis para PostgreSQL.
- Actualización 23/07/2024 - Ya se visualizan los distritos relacionados al proyecto, sin repetir los ya seleccionados - Se listan las modalidades que se relacionan a los proyectos.
- Actualizaciones 24/07/2024 - Confección de modalidad en lotes.
- Actualización 25/07/2024 - Carga de licitaciones y dentro lotes.
- Actualización 26/07/2024 - Lista de detalles de lotes.
- Actualización 29/07/2024 - Se genera el excel de lotes de la licitación. Queda pendiente verificar los cálculos.
- Actualización 30/07/2024 - Pantalla instituciones descarga.
- Actualizaciones 31/07/2024 - Finalización pantalla licitaciones.

7. TE #14939 Reunión 26/07/2024.

HAMBRE_CERO - TE #14939

Reunión 26/07/2024

10/09/2024 15:42 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	26/07/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	26/07/2024
Asignado a:	Juan Carlos López	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	3.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	3.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 10/09/2024 15:43 - Isaura Flores

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 100

#2 - 10/09/2024 15:43 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 3.00 h:
- Reunión 26/07/2024.
- Tiempo dedicado: 3.00 h:
- Reunión realizada en las oficinas del MITIC con el Equipo Técnico.

8. TE #14619 Creación de Proyecto por departamento + Modificación de precio referencial por departamento.

HAMBRE_CERO - TE #14619

Creación de Proyecto por departamento + Modificiación de precio referencial por departamento

12/08/2024 18:16 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	12/08/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	14/08/2024
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	16.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	16.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 12/08/2024 18:20 - Isaura Flores

- Añadido Fichero precioref1.png

- Añadido Fichero precioref2.png

- Se actualizó la tabla de precios referenciales para tener en cuenta la modalidad servicio
- Se trabaja en hacer que los proyectos se relacionen a un departamento para poder hacer uso de los precios referenciales.

#2 - 12/08/2024 18:23 - Isaura Flores

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

#3 - 12/08/2024 18:23 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a EN CURSO

#4 - 26/08/2024 12:11 - Isaura Flores

- Añadido Fichero vl6.png

- Añadido Fichero vl5.png

- Añadido Fichero vl4.png

- Añadido Fichero vl3.png

- Añadido Fichero vl2.png

- Añadido Fichero vl1.png

- % Realizado cambiado de 10 a 20

- Se actualizó gestión de proyectos para manejar los precios referenciales por departamento, modificando la creación de proyectos por gobernación, a creación de proyectos por departamento.
- Se validó el precio máximo por departamento de acuerdo a la tabla de precios referenciales
-Se trabaja en mejorar el hint de los errores para no impedir la acción pero advertir al usuario.

#5 - 26/08/2024 12:11 - Isaura Flores

- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 20 a 100

- Tiempo estimado cambiado de 24.00 h a 16.00 h

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 16.00 h:
- Creación de Proyecto por departamento + Modificación de precio referencial por departamento.
- Tiempo dedicado: 16.00 h:
- Modificación tabla precios + inicio creación de proyectos por departamento.
- Actualización 14/08/2024 - Validaciones sobre precios referenciales y validaciones en menú cíclico.

9. TE #14620 Redacción Informe de estado Hambre Cero fase 2.

HAMBRE_CERO - TE #14620

Redacción Informe de estado Hambre Cero fase 2

12/08/2024 18:22 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	12/08/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	13/08/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	16.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	16.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 20/08/2024 10:17 - Isaura Flores

- Añadido Fichero InformeSistemaH0.docx.pdf

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 100

- Tiempo estimado cambiado de 24.00 h a 16.00 h

#2 - 20/08/2024 10:17 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 16.00 h:
- Redacción Informe de estado Hambre Cero fase 2.
- Tiempo dedicado: 16.00 h:
- Desarrollo de Informe sobre sistema hambre Cero para presentación en diputados.

10. TE #14753 Menú Cíclico Mejoras.

HAMBRE_CERO - TE #14753

Menú Cíclico Mejoras

26/08/2024 12:13 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	16/08/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	16/08/2024
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	8.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	8.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 26/08/2024 12:15 - Isaura Flores

- Añadido Fichero valida1.png

- Añadido Fichero valida3.png

- Añadido Fichero valida2.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 100

ACTUALIZACIONES
- Se corrigió el buscador de comidas en el menú ciclicio.
- Se Modificaron las validaciones para que sean solo informativas... En los errores específicos se resaltan los campos y en los más generales se lanza un Alert toast con duración de 10 segundos.

#2 - 26/08/2024 12:15 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a EN CURSO

#3 - 26/08/2024 12:16 - Isaura Flores

- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 8.00 h:
- Menú Cíclico Mejoras.
- Tiempo dedicado: 8.00 h:
- Actualización 16/08/2024 - Actualización de menú cíclico según solicitud MDS.

11. TE #14940 Reunión 16/08/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC.

HAMBRE_CERO - TE #14940

Reunión 16/08/2024 - Equipo Ténico H0 MITIC

10/09/2024 15:46 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	16/08/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	16/08/2024
Asignado a:	Juan Carlos López	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	3.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	3.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 10/09/2024 15:46 - Isaura Flores

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 100

#2 - 10/09/2024 15:46 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 3.00 h:
- Reunión 16/08/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC.
- Tiempo dedicado: 3.00 h:
- Reunión Equipo Técnico H0 Presencial en las oficinas del MITIC.

12. TE #14756 Módulos Lotes Actualizaciones.

HAMBRE_CERO - TE #14756

Modulos Lotes Actualizaciones

26/08/2024 16:54 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	20/08/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	29/08/2024
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	64.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	64.00 horas
NRO_TE:	2		

Descripción

Los lotes deben tener el detalle de las instituciones para consultar. Además al seleccionar los lotes se debe colocar como un campo de cantidad máxima la cantidad total de platos y la mínima corresponde al 50% de la misma. Mismo tema con los montos.

Campos necesarios:

Cantidad Mínima
Cantidad Máxima
Monto Mínimo
Monto Máximo
Los lotes se deben poder tener items

Item 1- Desayuno

Item 2- Almuerzo

Item 3- Merienda

Item 4 - Cena/ Colación

Dependiendo del proyecto de Alimentación

Histórico

#1 - 26/08/2024 16:56 - Isaura Flores

- Añadido Fichero lotes4.png

- Añadido Fichero lotes3.png

- Añadido Fichero lotes2.png

- Añadido Fichero lotes1.png

- % Realizado cambiado de 0 a 20

#2 - 26/08/2024 16:58 - Isaura Flores

- Añadido Fichero di4.png

- Añadido Fichero di3.png

- Añadido Fichero di2.png

- Añadido Fichero di1.png

- % Realizado cambiado de 20 a 30

#3 - 26/08/2024 17:00 - Isaura Flores

- Añadido Fichero c3.png

- Añadido Fichero c2.png

- Añadido Fichero c1.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- Fecha de inicio cambiado de 20/07/2024 a 20/08/2024

- % Realizado cambiado de 30 a 40

#4 - 26/08/2024 17:04 - Isaura Flores

- Añadido Fichero co3.png

- Añadido Fichero co2.png

- Añadido Fichero co1.png

- Estado cambiado de SIN INICIAR a EN CURSO

#5 - 26/08/2024 17:06 - Isaura Flores

- Añadido Fichero lc4.png

- Añadido Fichero lc3.png

- Añadido Fichero lc2.png

- Añadido Fichero lc1.png

#6 - 28/08/2024 13:44 - Isaura Flores

- Añadido Fichero dep4.png

- Añadido Fichero dep3.png

- Añadido Fichero dep2.png

- Añadido Fichero dep1.png

#7 - 28/08/2024 19:11 - Isaura Flores

- Añadido Fichero lo3.png

- Añadido Fichero lo2.png

- Añadido Fichero lo1.png

ACTUALIZACIÓN
Se completaron los cálculos por distrito que influirán en las cantidades mínimas y máximas en la tabla de ítems...
Queda pendiente:
- Guardar los ítems al guardar el lote.
- Dinamizar el frontend para manejar correctamente el flujo de cambios de cantidades al checkear distintos distritos

#8 - 03/09/2024 10:55 - Isaura Flores

- Añadido Fichero acti3.png

- Añadido Fichero acti2.png

- Añadido Fichero acti1.png

- Tiempo estimado cambiado de 64.00 h a 88.00 h

#9 - 03/09/2024 10:56 - Isaura Flores

- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 40 a 100

- Tiempo estimado cambiado de 88.00 h a 64.00 h

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 64.00 h:
- Módulos Lotes Actualizaciones.
- Tiempo dedicado: 64.00 h:
- Actualización 20/07/2024 - Se agregó una tabla en la que se cargan los tipos de alimentación relacionados al lote. - Se planea que la edición de los datos de esta tabla solo se guarden al presionar el botón de guardar - Aún queda pendiente definir bien la lógica de relación de los ítems con los lotes para realizar los cálculos correctamente. - Los ítems del select de items aún son estáticos.
- Actualización 21/07/2024 Se pueden visualizar las instituciones de cada distrito
- Actualización 22/07/2024 - Se crearon las tablas: - CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE ALIMENTACIÓN, LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS y otra de TOTAL DE BENEFICIADOS POR DISTRITO. Que facilitarán los cálculos futuros sobre los proyectos generados.
- Actualización 23/08/2024 -ACTUALIZACIÓN: - Se culminó la consulta de cálculo de beneficiados por distrito, tipos de alimentación, por institución... Queda pendiente su implementación en la fusión de proyectos.

- Actualizaciones 26/08/2024: - Se completaron los scripts que guardarán el cálculo de beneficiados al momento de fusionar. - Se trabaja en listar las instituciones en licitaciones en base a las nuevas tablas de cálculos creadas - Se cargó el item por defecto en licitaciones.
- Actualizaciones 27-08-2024 Departamentos, usuarios, generación de pdf y guardado de datos del proyecto en carga manual.
- Actualizaciones en lotes maximo y minimo.
- Actualizaciones 29/08/2024 - Se modificaron los eventos de check y de carga de tablas para manejar el cambio de cantidades al cambiar los distritos seleccionados.

13. TE #14758 Reporte de instituciones por matrículas, distritos, departamentos.

HAMBRE_CERO - TE #14758

Reporte de instituciones por matriculas, distritos, departamentos

26/08/2024 17:17 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	20/08/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	29/08/2024
Asignado a:	Javier Caballero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	32.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	32.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 26/08/2024 17:18 - Isaura Flores

- Añadido Fichero bd1.png

- % Realizado cambiado de 0 a 10

#2 - 26/08/2024 17:21 - Isaura Flores

- Añadido Fichero bd2.png

- Añadido Fichero bd1.png

Se editan reporte-proyecto-aprobados.php y reporte-proyecto-aprobados.js para la visualización en la página web

#3 - 26/08/2024 17:22 - Isaura Flores

- Añadido Fichero reo1.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

#4 - 28/08/2024 13:48 - Isaura Flores

- Añadido Fichero Proyectos Aprobados.csv

- Añadido Fichero rep3.png

- Añadido Fichero rep2.png

- Añadido Fichero rep1.png

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 10 a 100

- Tiempo estimado cambiado de 64.00 h a 32.00 h

Ya están funcionando todos los filtros y también la generación del archivo .csv el archivo esta ordenado por nombre de la gobernación y el tipo de alimentación.

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 32.00 h:
- Reporte de instituciones por matrículas, distritos, departamentos.
- Tiempo dedicado: 32.00 h:
- Actualización 20/07/2024 - Pude realizar el código SQL también puede ser ordenado por Grupo, Gobernación, Distrito, Proyecto de Alimentación, Tipos de alimentación.
- Actualizaciones 23/08/2024 - Después de realizar los cambios a las sentencias SQL y solo traer un registro por distrito también se comentó la columna de nombre del proyecto para una mejor visualización de la cantidad de alumnos e instituciones que pertenecen a proyectos aprobados.
- Se trabajan en los filtros del reporte.
- Actualizaciones 27-08-2024 Finalización Reporte.

14. TE #14944 Reunión 21/08/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC MDS DNCP.

HAMBRE_CERO - TE #14944

Reunión 21/08/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC MDS DNCP

10/09/2024 16:05 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	21/08/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	21/08/2024
Asignado a:	Juan Carlos López	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	3.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	3.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 10/09/2024 16:05 - Isaura Flores

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

#2 - 10/09/2024 16:05 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 3.00 h:
- Reunión 21/08/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC MDS DNCP
- Tiempo dedicado: 3.00 h:
- Reunión Equipo Técnico H0 Presencial en las oficinas de la DNCP.

15. TE #14755 Reporte del estado de las convocatorias. por grupos por tipo de proyectos por cada proceso del sistema.

HAMBRE_CERO - TE #14755

Reporte del estado de las convocatorias. por grupos por tipo de proyectos por cada proceso del sistema.

26/08/2024 16:47 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	22/08/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	23/08/2024
Asignado a:	Daniel Insaurralde	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	16.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	16.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 26/08/2024 16:49 - Isaura Flores

- Añadido Fichero repo4.png

- Añadido Fichero repo3.png

- Añadido Fichero repo2.png

- Añadido Fichero repo1.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

#2 - 26/08/2024 16:51 - Isaura Flores

- Añadido Fichero Proyectos.csv

- Añadido Fichero re3.png

- Añadido Fichero re2.png

- Añadido Fichero re1.png

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

El listado se filtra automáticamente si el usuario tiene asignado una gobernación (mismo funcionamiento que Proyectos -> Gestión de Proyectos y Proyectos -> Aprobaciones)
Se genera el archivo CSV

#3 - 26/08/2024 16:52 - Isaura Flores

- Asunto cambiado de TE2- Reporte del estado de las convocatorias. por grupos por tipo de proyectos por cada proceso del sistema. a Reporte del estado de las convocatorias. por grupos por tipo de proyectos por cada proceso del sistema.

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 16.00 h:
- Reporte del estado de las convocatorias. por grupos por tipo de proyectos por cada proceso del sistema.
- Tiempo dedicado: 16.00 h:
- Actualizaciones 23/08/2024 Reporte Finalizado.

16. TE #14941 Reunión 23/08/2024 Equipo Técnico H0 - MITIC.

HAMBRE_CERO - TE #14941

Reunión 23/08/2024 Equipo Técnico H0 - MITIC

10/09/2024 15:48 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	23/08/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	23/08/2024
Asignado a:	Juan Carlos López	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	3.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	3.00 horas
NRO_TE:	2		

Descripción

Histórico

#1 - 10/09/2024 15:48 - Isaura Flores

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

#2 - 10/09/2024 15:48 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 3.00 h:
- Reunión 23/08/2024 Equipo Técnico H0 - MITIC.
- Tiempo dedicado: 3.00 h:
- Reunión Equipo Técnico H0 Presencial en las oficinas del MITIC.

17. TE #14774 Implementación Hambre Cero en Geoportal - Puntos Escuelas IGEP, HIS.

HAMBRE_CERO - TE #14774

Implementación Hambre Cero en Geoportal - Puntos Escuelas IGEP, HIS

28/08/2024 14:12 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	27/08/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	28/08/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	12.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	12.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 28/08/2024 18:39 - Isaura Flores

- Añadido Fichero igep1.0.png

- Añadido Fichero igep1.5.png

- Añadido Fichero igep2.0.png

- Añadido Fichero igep1.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 50

#2 - 28/08/2024 18:44 - Isaura Flores

- Añadido Fichero filtrosenmapas.png

- Añadido Fichero his1.png

#3 - 28/08/2024 18:45 - Isaura Flores

- Fecha fin cambiado de 29/08/2024 a 28/08/2024

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 50 a 100

- Tiempo estimado cambiado de 16.00 h a 12.00 h

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 12.00 h:
- Implementación Hambre Cero en Geoportal - Puntos Escuelas IGEP, HIS.
- Tiempo dedicado: 12.00 h:
- Limpieza y Carga de datos en Geoportal de puntos IGEP, creación de Mapa de Escuelas y Puntos IGEP.
- Limpieza y carga de datos en geoportal de puntos HIS y RNFO.

18. TE #14787 Carga de Proyectos de Alimentación según últimas versiones.

HAMBRE_CERO - TE #14787

Carga de Proyectos de Alimentación segun ultimas versiones

28/08/2024 18:54 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	27/08/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	28/08/2024
Asignado a:	Alberto Aquino	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	16.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	16.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 28/08/2024 18:56 - Isaura Flores

- % Realizado cambiado de 0 a 50

#2 - 28/08/2024 18:57 - Isaura Flores

- Añadido Fichero proyectos.png

- Añadido Fichero proyecto-hambre0-28_08_2024-1724885736.pdf

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 50 a 100

#3 - 28/08/2024 18:58 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 16.00 h:
- Carga de Proyectos de Alimentación según últimas versiones.
- Tiempo dedicado: 16.00 h:
- Actualizaciones 27-08-2024. Modificaciones y control de menú de proyectos de Amambay, Guairá, San Pedro, Paraguarí, Ñeembucú,Cordillera,Canindeyú.
- Carga de Proyectos de Alimentación restantes.

19. TE #14788 Control de Listado de instituciones según PDF de Resolución de Conae vs Sistema.

HAMBRE_CERO - TE #14788

Control de Listado de instituciones segun PDF de Resolución de Conae vs Sistema.

28/08/2024 19:00 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	27/08/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	02/09/2024
Asignado a:	Leonardo Fernandez	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	40.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	40.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 28/08/2024 19:02 - Isaura Flores

- Añadido Fichero casos especiales.png

- Añadido Fichero proyecto-hambre0-28_08_2024-1724885736.pdf

#2 - 28/08/2024 19:02 - Isaura Flores

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

#3 - 28/08/2024 19:02 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a EN CURSO

#4 - 03/09/2024 11:21 - Isaura Flores

- Añadido Fichero Altoparaguay_sistema_desayuno.pdf

- Añadido Fichero Altoparaguay_sistema_almuerzo.pdf

- Añadido Fichero AltoParana_sistema_desayuno.pdf

- Añadido Fichero AltoParana_sistema_almuerzo.pdf

- Añadido Fichero Amambay_sistema_desayuno.pdf

- Añadido Fichero Amambay_sistema_almuerzo.pdf

- % Realizado cambiado de 10 a 30

#5 - 03/09/2024 11:29 - Isaura Flores

- Añadido Fichero Boqueron_sistema_desayuno.pdf

- Añadido Fichero Boqueron_sistema_almuerzo.pdf

- Añadido Fichero Caaguazu_sistema_desayuno.pdf

- Añadido Fichero Caaguazu_sistema_almuerzo.pdf

- Añadido Fichero Canindeyu_sistema_desayuno.pdf

- Añadido Fichero Canindeyu_sistema_almuerzo.pdf

- Añadido Fichero Caazapa_sistema_desayuno.pdf

- Añadido Fichero Caazapa_sistema_almuerzo.pdf

#6 - 09/09/2024 14:07 - Isaura Flores

- Añadido Fichero Itapua_sistema_almuerzo.pdf

- Añadido Fichero Itapua_sistema_desayuno.pdf

- Añadido Fichero Guaira_sistema_almuerzo.pdf

- Añadido Fichero Guaira_sistema_desayuno.pdf

- Añadido Fichero Coordillera_sistema_ayuno.pdf

- Añadido Fichero Coordillera_sistema_desayuno.pdf

- Añadido Fichero Concepción_sistema_almuerzo.pdf
- Añadido Fichero Concepción_sistema_desayuno.pdf
- Añadido Fichero Central_sistema_almuerzo.pdf
- Añadido Fichero Central_sistema_desayuno.pdf
- Fecha fin cambiado de 30/08/2024 a 02/09/2024
- % Realizado cambiado de 30 a 70
- Tiempo estimado cambiado de 32.00 h a 40.00 h

#7 - 09/09/2024 14:08 - Isaura Flores

- Añadido Fichero Capital_sistema_desayuno.pdf
- Añadido Fichero Capital_sistema_colación.pdf

#8 - 09/09/2024 14:36 - Isaura Flores

- Añadido Fichero Misiones_sistema_desayuno.pdf
- Añadido Fichero Misiones_sistema_almuerzo.pdf
- Añadido Fichero Neembucu_sistema_colacion.pdf
- Añadido Fichero Neembucu_sistema_desayuno.pdf
- Añadido Fichero Neembucu_sistema_almuerzo.pdf
- Añadido Fichero Paraguarí_sistema_desayuno.pdf
- Añadido Fichero Paraguarí_sistema_almuerzo.pdf
- Añadido Fichero PHayes_sistema_desayuno.pdf
- Añadido Fichero PHayes_sistema_almuerzo.pdf
- Añadido Fichero SPedro_sistema_desayuno.pdf
- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA
- % Realizado cambiado de 70 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 40.00 h:
- Control de Listado de instituciones según PDF de Resolución de Conae vs Sistema.
- Tiempo dedicado: 40.00 h:
- Actualización 27-08-2024- Se verificó en Amambay y Guairá la totalidad de las instituciones, se registraron los casos especiales.
- Actualización 29/08/2024 - Limpieza y parseo de datos, 90 priorizados, Alto Paraguay - Almuerzo y Desayuno, Alto Paraná - Almuerzo y Desayuno, Amambay - Almuerzo y Desayuno.
- Actualizaciones 30/08/2024 - Limpieza, corrección y pruebas Proyectos - Desayuno Almuerzo de Boqueron Caaguazu, Caazapa, Canindeyu
- Actualización 31/08/2024 - Control Proyectos de Alimentación Capital, Central, Cordillera, Concepción, Guairá e Itapúa.
- Actualización 02/09/2024 - Control, proyectos de alimentación Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

20. TE #14772 Mejora en impresiones de proyectos de alimentación.

HAMBRE_CERO - TE #14772

Mejora en impresiones de proyectos de alimentación

28/08/2024 13:57 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	28/08/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	29/08/2024
Asignado a:	Matias Vega	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	16.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	16.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 28/08/2024 20:02 - Isaura Flores

- Asignado a cambiado de Angel Ojeda a Matias Vega

#2 - 28/08/2024 20:05 - Isaura Flores

- Añadido Fichero imp2.png

- Añadido Fichero imp1.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 50

#3 - 09/09/2024 15:01 - Isaura Flores

- Añadido Fichero tablas2.png

- Añadido Fichero tablas1.png

- Añadido Fichero tabñas_dM.png

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 50 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 16.00 h:
- Mejora en impresiones de proyectos de alimentación.
- Tiempo dedicado: 16.00 h:
- Ahora en el PDF de Instituciones Seleccionadas en Gestión de Proyectos se puede visualizar el tipo de alimentación por cada institución, quedaría comprobar si coinciden los datos con el PDF proveído por las gobernaciones. Pendiente separar en dos tablas.
- Actualizaciones 29/08/2024 - Finalización separación de desayuno y merienda.

21. TE #14834 Gestión de proyectos. Modificación de precios referenciales a tablas, campos de cantidades de instituciones y matriculados.

HAMBRE_CERO - TE #14834

Gestión de proyectos. Modificación de precios referenciales a tablas, campos de cantidades de instituciones y matriculados

03/09/2024 10:58 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	30/08/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	03/09/2024
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	32.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	32.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 03/09/2024 11:01 - Isaura Flores

- Añadido Fichero pref3.png

- Añadido Fichero pref2.png

- Añadido Fichero pref1.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 50

#2 - 03/09/2024 11:06 - Isaura Flores

- Añadido Fichero total2.png

- Añadido Fichero total1.png

- Fecha fin cambiado de 31/08/2024 a 03/09/2024

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

- Tiempo estimado cambiado de 16.00 h a 32.00 h

#3 - 03/09/2024 11:08 - Isaura Flores

- Añadido Fichero to3.png

- Añadido Fichero to2.png

- Añadido Fichero to1.png

- Estado cambiado de RESUELTA a EN CURSO

#4 - 09/09/2024 15:19 - Isaura Flores

- Añadido Fichero ref3.png

- Añadido Fichero ref2.png

- Añadido Fichero ref1.png

- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 50 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 32.00 h:
- Gestión de proyectos. Modificación de precios referenciales a tablas, campos de cantidades de instituciones y matriculados.
- Tiempo dedicado: 32.00 h:
- Actualizaciones 30/08/2024 -Se modificó la estructura de los precios referenciales en la tabla proyectos dependiendo de la modalidad del servicio.

- Actualización 31/08/2024 - Se modificaron los campos de la tabla proyectos cantidades de instituciones y alumnos, se corrigieron las consultas que involucran dichos campos, se creó una nueva tabla de relación.
- Actualizaciones 02/09/2024 - Se consigue mostrar las cantidades calculadas en el pdf, se sigue buscando mostrar los campos ya guardados y no calculados - Se creó la tabla de presupuestos en BD pero aun no queda guardado - Se permite guardado de cantidades de beneficiados por proyecto.
- Actualización 03/09/2024 - Finalización modificación precio referencial.

22. TE #14942 Reunión 30/08/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC.

HAMBRE_CERO - TE #14942

Reunión 30/08/2024 - Equipo Ténico H0 MITIC

10/09/2024 15:49 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	30/08/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	30/08/2024
Asignado a:	Juan Carlos López	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	3.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	3.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 10/09/2024 15:49 - Isaura Flores

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 100

- Tiempo estimado establecido a 3.00 h

#2 - 10/09/2024 15:49 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 3.00 h:
- Reunión 30/08/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC.
- Tiempo dedicado: 3.00 h:
- Reunión Equipo Técnico H0 Presencial en las oficinas del MITIC.

23. TE #14949 Impresión Menú Cíclico. Impresiones de Proyecto total.

HAMBRE_CERO - TE #14949

Impresión Menú Ciclico. Impresiones de Proyecto total.

11/09/2024 09:23 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	02/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	06/09/2024
Asignado a:	Matias Vega	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	24.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	24.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 11/09/2024 09:25 - Isaura Flores

- Añadido Fichero imenu3.png

- Añadido Fichero imenu2.png

- Añadido Fichero imenu1.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 10

#2 - 11/09/2024 09:27 - Isaura Flores

- Añadido Fichero igrupo2.png

- Añadido Fichero igrupo.png

#3 - 11/09/2024 09:29 - Isaura Flores

- Añadido Fichero Reporte de Instituciones por Grupo.csv

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 10 a 100

- Tiempo estimado cambiado de 40.00 h a 24.00 h

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 24.00 h:
- Impresión Menú Cíclico. Impresiones de Proyecto total.
- Tiempo dedicado: 24.00 h:
- Actualizaciones 02/09/2024 - Actualización impresión menú cíclico.
- Actualización 03/09/2024 - Impresión grupos y correcciones menú cíclico.
- Actualizaciones 05/09/2024 - Finalización impresión de proyectos y reporte de grupos por instituciones (generación de archivo csv).

24. TE #14964 Reporte por año conformación de los presupuestos por departamentos, por distrito, por matrícula, raciones.

HAMBRE_CERO - TE #14964

Reporte por año conformación de los presupuestos por departamentos, por distrito, por matrícula, raciones

12/09/2024 15:35 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	02/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	16/09/2024
Asignado a:	Leonardo Fernandez	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	24.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	24.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 12/09/2024 15:47 - Isaura Flores

- Añadido Fichero Screenshot 2024-09-02 154124.png

#2 - 12/09/2024 15:49 - Isaura Flores

- Asignado a cambiado de Javier Caballero a Leonardo Fernandez

#3 - 13/09/2024 10:11 - Isaura Flores

- Añadido Fichero rc.png

#4 - 13/09/2024 11:42 - Isaura Flores

- Añadido Fichero aprov.png

#5 - 13/09/2024 11:48 - Isaura Flores

- Añadido Fichero presup.png

#6 - 13/09/2024 14:38 - Isaura Flores

- Añadido Fichero costo1.png

#7 - 13/09/2024 14:40 - Isaura Flores

- Añadido Fichero costo2.png

#8 - 16/09/2024 10:25 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (rc.png)

#9 - 16/09/2024 10:25 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (aprov.png)

#10 - 16/09/2024 10:26 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (presup.png)

#11 - 16/09/2024 10:26 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (costo1.png)

#12 - 16/09/2024 10:26 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (costo2.png)

#13 - 16/09/2024 10:28 - Isaura Flores

- Añadido Fichero repor1.png

#14 - 16/09/2024 10:30 - Isaura Flores
- Añadido Fichero repor2.png

#15 - 16/09/2024 10:43 - Isaura Flores
- Fichero eliminado (repor1.png)

#16 - 16/09/2024 10:43 - Isaura Flores
- Fichero eliminado (repor2.png)

#17 - 16/09/2024 11:25 - Isaura Flores
- Añadido Fichero costos1.png

#18 - 16/09/2024 11:28 - Isaura Flores
- Añadido Fichero presp.png
- Añadido Fichero inst.png

#19 - 16/09/2024 11:30 - Isaura Flores
- Añadido Fichero aprv.png

#20 - 16/09/2024 11:33 - Isaura Flores
- Añadido Fichero costos2.png

#21 - 16/09/2024 11:41 - Isaura Flores
- Añadido Fichero costo.png
- Añadido Fichero presp1.png

#22 - 16/09/2024 11:45 - Isaura Flores
- Añadido Fichero csto.png

#23 - 17/09/2024 08:04 - Isaura Flores
- Fichero eliminado (csto.png)

#24 - 17/09/2024 08:25 - Isaura Flores
- Añadido Fichero cost1.png
- Añadido Fichero cost2.png

#25 - 17/09/2024 16:15 - Isaura Flores
- Añadido Fichero filtros.png

#26 - 19/09/2024 09:55 - Isaura Flores
- Fecha fin cambiado de 13/09/2024 a 16/09/2024
- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR
- % Realizado cambiado de 0 a 100
- Tiempo estimado cambiado de 80.00 h a 24.00 h

#27 - 19/09/2024 09:55 - Isaura Flores
- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 24.00 h:
- Reporte por año conformación de los presupuestos por departamentos, por distrito, por matrícula, raciones.
- Tiempo dedicado: 24.00 h:
- Actualizaciones del 2/09/2024 - Es necesario realizar el cálculo de las asignaciones de raciones correspondientes a cada distrito.
- Actualizaciones del 6/09/2024 - La visualización de la tabla 'Aprobados' ahora calcula la cantidad de alumnos e instituciones utilizando los datos de la tabla 'Beneficiados por Distrito', que realiza previamente los cálculos. Se realizaron ajustes en el archivo para asegurar una correcta generación del archivo .csv, incluyendo la modificación de los filtros por departamento, distrito y tipo de alimentación, así como el cambio en la posición del filtro de tipo de alimentación.
- Actualizaciones del 9/09/2024 - Se ha añadido la columna 'Contador' a todos los reportes, así como se ha actualizado la vista del informe de costos por institución desglosado por año. Se finaliza la exportación.

25. TE #14935 Proyectos Generados. Modificación de presupuestos.

HAMBRE_CERO - TE #14935

Proyectos Generados. Modificación de presupuestos.

09/09/2024 16:24 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	04/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	12/09/2024
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	64.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	64.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 09/09/2024 16:26 - Isaura Flores

- Añadido Fichero fu.png

- Añadido Fichero fu1.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- Ya se muestran los montos de presupuesto guardados en los pdfs.
- Se corrigió el comportamiento de la edición y fusión de proyectos evitando errores de BD.
- Se corrigió la impresión del ítem 8... del menú cíclico en impresiones múltiples

#2 - 09/09/2024 16:28 - Isaura Flores

- Añadido Fichero la3.png

- Añadido Fichero la2.png

- Añadido Fichero la1.png

- Estado cambiado de SIN INICIAR a EN CURSO

- % Realizado cambiado de 0 a 30

#3 - 09/09/2024 16:29 - Isaura Flores

- Añadido Fichero ex2.png

- Añadido Fichero ex1.png

#4 - 11/09/2024 09:13 - Isaura Flores

- Añadido Fichero gl4.png

- Añadido Fichero gl3.png

- Añadido Fichero gl2.png

- Añadido Fichero gl1.png

- Añadido Fichero gl.png

- % Realizado cambiado de 30 a 40

#5 - 11/09/2024 09:15 - Isaura Flores

- Añadido Fichero lg4.png

- Añadido Fichero lg3.png

- Añadido Fichero lg2.png

- Añadido Fichero lg1.png

#6 - 12/09/2024 15:21 - Isaura Flores

- Añadido Fichero image.png

#7 - 12/09/2024 16:26 - Isaura Flores

- Añadido Fichero image (1).png

#8 - 12/09/2024 16:28 - Isaura Flores

- Añadido Fichero image (2).png

#9 - 12/09/2024 16:30 - Isaura Flores

- Añadido Fichero image (2).png

#10 - 12/09/2024 16:52 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (image (2).png)

#11 - 13/09/2024 10:28 - Isaura Flores

- Añadido Fichero prov.png

#12 - 13/09/2024 11:01 - Isaura Flores

- Añadido Fichero prov2.png

#13 - 13/09/2024 14:10 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (prov.png)

#14 - 13/09/2024 14:10 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (prov2.png)

#15 - 13/09/2024 14:30 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (prov5.png)

#16 - 16/09/2024 09:43 - Isaura Flores

- Tiempo estimado cambiado de 56.00 h a 64.00 h

#17 - 16/09/2024 09:56 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (prov4.png)

#18 - 16/09/2024 09:56 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (prov3.png)

#19 - 16/09/2024 10:01 - Isaura Flores

- Añadido Fichero prov3.png

#20 - 16/09/2024 10:06 - Isaura Flores

- Añadido Fichero al2.png

- Añadido Fichero al1.png

#21 - 16/09/2024 10:08 - Isaura Flores

- Añadido Fichero desay.png

#22 - 16/09/2024 10:20 - Isaura Flores

- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 40 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 64.00 h:
- Proyectos Generados. Modificación de presupuestos.
- Tiempo dedicado: 64.00 h:
- Actualizaciones 04/09/2024 - Se posibilitó el guardado de presupuestos por proyecto, permitiendo mostrar datos ya guardados y solo modificar su valor luego de seleccionar la opción de recalcular. El cálculo de alumnos beneficiados, instituciones

beneficiadas también se encuentran relacionados a cada proyecto. - Se trabaja en utilizar estos nuevos cálculos en los PDF y en la fusión.
- Actualizaciones 05/09/2024 - Actualizaciones en Licitaciones según proyectos generados.
- Actualizaciones 06/09/2024 - - Se posibilitó la carga y edición de los items por lote. - Se corrigió la consulta de exportación de licitación.
- Actualizaciones 09/09/2024 - Se agregó botón instituciones en proyecto. Exportación en archivo csv.
- Actualización 10/09/2024 - Licitaciones y gestión de proyectos. Se trabaja en lógica de lotes para seleccionar los distritos.
- Actualizaciones del 11/09/2024 - Se ha habilitado la capacidad para la carga y edición de instituciones por lotes.
- Actualizaciones del 12/09/2024 - Se ha modificado la funcionalidad de exportación a XLS para listar las instituciones seleccionadas de acuerdo con la nueva lógica de selección. Además, se ha ajustado el campo 'cantidad' a 'cantidad de raciones', multiplicando el número de matriculados beneficiados por la cantidad de días del período de provisión.
- Actualizaciones del 13/09/2024 - Se ha incorporado el detalle de beneficiarios por tipo de alimentación y por distrito, con el fin de mejorar el control de las cantidades finales.

26. TE #14931 Geoportal para hambre Cero - Verificación de performance. Verificación de archivos de traducciones e implementación de geoprocesamiento.

HAMBRE_CERO - TE #14931

Geoportal para hambre Cero - Verificación de performance. Verificación de archivos de traducciones e implementación de geoprocesamiento.

09/09/2024 14:54 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	06/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	06/09/2024
Asignado a:	Daniel Insaurralde	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	8.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	8.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 09/09/2024 14:54 - Isaura Flores

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 100

#2 - 09/09/2024 14:54 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 8.00 h:
- Geoportal para hambre Cero - Verificación de performance. Verificación de archivos de traducciones e implementación de geoprocesamiento.
- Tiempo dedicado: 8.00 h:
- Soporte Geoportal. Verificación de funcionamiento integral.

27. TE #14936 Geoportal - Carga de datos de pruebas, poligonales y procesamiento de buffer e intersección. Reunión con Viceministro para muestra de funcionalidades.

HAMBRE_CERO - TE #14936

Geoportal - Carga de datos de pruebas, poligonales y procesamiento de buffer e intersección. Reunión con Viceministro para muestra de funcionalidades

09/09/2024 16:39 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	06/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	06/09/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	8.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	8.00 horas
NRO_TE:	2		

Descripción

Histórico

#1 - 09/09/2024 16:40 - Isaura Flores

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

#2 - 09/09/2024 16:40 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

#3 - 09/09/2024 16:41 - Isaura Flores

- Añadido Fichero reuniongeoportal.png

Ficheros

reuniongeoportal.png	57,6 KB	09/09/2024	Isaura Flores

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 8.00 h:
- Geoportal - Carga de datos de pruebas, poligonales y procesamiento de buffer e intersección. Reunión con Viceministro para muestra de funcionalidades.
- Tiempo dedicado: 8.00 h:
- Ejecución de geoprocesamiento y muestra de funcionamiento.

28. TE #14970 Generación de órdenes de trabajo. Licitaciones. Adecuación de Impresión de Excel

HAMBRE_CERO - TE #14970

Generación de ordenes de trabajo. Licitaciones. Adecuación de Impresión de Excel.

13/09/2024 16:33 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	16/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	20/09/2024
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	56.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	56.00 horas
NRO_TE:	2		

Descripción

Histórico

#1 - 13/09/2024 16:36 - Isaura Flores

- Añadido Fichero pr1.png

- Tipo cambiado de GESTION a TE

- NRO_TE_SF eliminado (TE 2)

- NRO_TE establecido a 2

#2 - 13/09/2024 16:38 - Isaura Flores

- Añadido Fichero pr2.png

#3 - 13/09/2024 16:41 - Isaura Flores

- Añadido Fichero form.png

#4 - 13/09/2024 16:43 - Isaura Flores

- Añadido Fichero prov3.png

#5 - 13/09/2024 16:43 - Isaura Flores

- Tiempo estimado establecido a 80.00 h

#6 - 13/09/2024 16:45 - Isaura Flores

- Añadido Fichero prov4.png

#7 - 13/09/2024 16:48 - Isaura Flores

- Añadido Fichero benf.png

#8 - 13/09/2024 16:51 - Isaura Flores

- Añadido Fichero lt.png

#9 - 13/09/2024 16:53 - Isaura Flores

29. TE #14943 Reunión 06/09/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC.

HAMBRE_CERO - TE #14943

Reunión 06/09/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC

10/09/2024 15:51 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	06/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	06/09/2024
Asignado a:	Juan Carlos López	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	3.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	3.00 horas
NRO_TE:	2		

Descripción

Histórico

#1 - 10/09/2024 15:51 - Isaura Flores

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 100

#2 - 10/09/2024 15:52 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 3.00 h:
- Reunión 06/09/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC.
- Tiempo dedicado: 3.00 h:
- Reunión Equipo Técnico H0 Presencial en las oficinas del MITIC.

30. TE #14946 Grupos. Cambio de lógica de selección de instituciones.

HAMBRE_CERO - TE #14946

Grupos. Cambio de lógica de selección de instituciones.

11/09/2024 09:00 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	09/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	10/09/2024
Asignado a:	Daniel Insaurralde	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	16.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	16.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 11/09/2024 09:03 - Isaura Flores

- Añadido Fichero gr2.png

- Añadido Fichero gr1.png

- Asunto cambiado de 2Grupos. Cambio de lógica de selección de instituciones. a Grupos. Cambio de lógica de selección de instituciones.

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 20

#2 - 11/09/2024 09:08 - Isaura Flores

- Añadido Fichero gr5.png

- Añadido Fichero gr4.png

- Añadido Fichero gr3.png

- Fecha fin cambiado de 11/09/2024 a 10/09/2024

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 20 a 100

- Tiempo estimado cambiado de 24.00 h a 16.00 h

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 16.00 h:
- Grupos. Cambio de lógica de selección de instituciones.
- Tiempo dedicado: 16.00 h:
- Actualizaciones 09/09/2024 - Instituciones - Modalidad - Nivel / Cursos.
- Actualizaciones 10/09/2024 - Cambios en matriculados, cambios en numeración de grupos, cambios de validación en proyectos generados.

31. TE #14950 Costos por Insumos. Corrección lógica de Insumos. Impresión y generación de archivo .CSV

HAMBRE_CERO - TE #14950

Costos por Insumos. Corrección logica de Insumos. Impresión y generación de archivo .CSV

11/09/2024 09:31 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	09/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	19/09/2024
Asignado a:	Matias Vega	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	40.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	40.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 11/09/2024 09:37 - Isaura Flores

- Añadido Fichero insumos3.png

- Añadido Fichero insumos2.png

- Añadido Fichero insumos1.png

- % Realizado cambiado de 0 a 20

#2 - 11/09/2024 09:37 - Isaura Flores

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

#3 - 11/09/2024 09:37 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a EN CURSO

#4 - 12/09/2024 16:35 - Isaura Flores

- Añadido Fichero image (3).png

#5 - 12/09/2024 16:37 - Isaura Flores

- Añadido Fichero image (4).png

- Fecha fin cambiado de 11/09/2024 a 13/09/2024

#6 - 13/09/2024 08:30 - Isaura Flores

- Añadido Fichero image (7).png

#7 - 16/09/2024 10:13 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (ins3.png)

#8 - 16/09/2024 10:13 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (ins2.png)

#9 - 16/09/2024 10:13 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (ins1.png)

#10 - 16/09/2024 14:33 - Isaura Flores

- Añadido Fichero datos.png

#11 - 16/09/2024 14:36 - Isaura Flores

- Añadido Fichero cons.png

#12 - 16/09/2024 14:39 - Isaura Flores

- Añadido Fichero rep2.png

- Añadido Fichero rep1.png

#13 - 16/09/2024 14:40 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (rep1.png)

#14 - 16/09/2024 14:40 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (rep2.png)

#15 - 16/09/2024 15:05 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (datos.png)

#16 - 16/09/2024 15:05 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (cons.png)

#17 - 16/09/2024 15:10 - Isaura Flores

- Añadido Fichero datos.png

#18 - 16/09/2024 15:12 - Isaura Flores

- Añadido Fichero cons.png

#19 - 16/09/2024 16:23 - Isaura Flores

- Fecha fin cambiado de 13/09/2024 a 16/09/2024

- Tiempo estimado cambiado de 24.00 h a 40.00 h

#20 - 16/09/2024 16:26 - Isaura Flores

- Añadido Fichero insumos2.png

- Añadido Fichero insumos1.png

#21 - 17/09/2024 08:30 - Isaura Flores

- Añadido Fichero rpins.png

#22 - 17/09/2024 08:31 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (rpins.png)

#23 - 17/09/2024 09:18 - Isaura Flores

- Añadido Fichero rpins.png

#24 - 18/09/2024 09:48 - Isaura Flores

- Añadido Fichero reporte.png

#25 - 18/09/2024 14:38 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (reporte.png)

#26 - 18/09/2024 15:48 - Isaura Flores

- Añadido Fichero reporte.png

#27 - 19/09/2024 09:06 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (reporte.png)

#28 - 19/09/2024 10:07 - Isaura Flores

- Fecha fin cambiado de 16/09/2024 a 19/09/2024

- % Realizado cambiado de 20 a 80

#29 - 23/09/2024 08:53 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (rpins.png)

#30 - 23/09/2024 08:53 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (insumos1.png)

#31 - 23/09/2024 08:53 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (insumos2.png)

#32 - 23/09/2024 08:56 - Isaura Flores

- Añadido Fichero insumos2.png

- Añadido Fichero insumos1.png

#33 - 23/09/2024 08:57 - Isaura Flores

- Añadido Fichero rpins.png

#34 - 24/09/2024 13:28 - Isaura Flores

- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 80 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 40.00 h:
- Costos por Insumos. Corrección lógica de Insumos. Impresión y generación de archivo .CSV
- Tiempo dedicado: 40.00 h:
- Actualización 10/09/2024 - Actualización cambio de consulta. Utilización de campos nuevos de proyecto. Cantidades de alumnos por tipo de alimentación.
- Actualizaciones del 11/09/2024 - Se trabaja en la corrección de algunas uniones en la base de datos para que la consulta del reporte de insumos funcione correctamente, ya que actualmente está produciendo datos incorrectos.
- Actualizaciones del 12/09/2024 - Se está corrigiendo las consultas y subconsultas del reporte de insumos para obtener datos precisos.Inicialmente se tenía previsto un reporte Anual por semanas del proyecto. Pero esto ocasiona incongruencias en las fechas de inicio y fin. del proyecto. Lo ideal es mostrar de forma anual por el total de días anuales.
- Actualizaciones del 13/09/2024 - Se ha avanzado en el desarrollo de la consulta y queda por añadir los filtros necesarios para completar la misma.
- Actualizaciones del 16/09/2024 - El reporte está casi terminado, solo falta corregir un error relacionado con la merienda escolar, mientras que la función de exportación a CSV ya está funcionando correctamente.

32. TE #14947 Dictámenes. Modificaciones en lógica.

HAMBRE_CERO - TE #14947

Dictámenes. Modificaciones en logica.

11/09/2024 09:09 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	11/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	11/09/2024
Asignado a:	Daniel Insaurralde	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	8.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	8.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 12/09/2024 16:50 - Isaura Flores

- Añadido Fichero image (5).png

#2 - 12/09/2024 16:59 - Isaura Flores

- Añadido Fichero image (6).png

#3 - 13/09/2024 10:05 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (image (5).png)

#4 - 13/09/2024 10:05 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (image (6).png)

#5 - 17/09/2024 15:13 - Isaura Flores

- Añadido Fichero dictamen.png

#6 - 19/09/2024 09:12 - Isaura Flores

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 100

#7 - 19/09/2024 09:12 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 8.00 h:
- Dictámenes. Modificaciones en lógica.
- Tiempo dedicado: 8.00 h:
- Actualizaciones del 11/09/2024 - Se han realizado cambios para editar el número de páginas del proyecto.

33. TE #14976 Confección de presentación de SIAE. Videos demostrativos. Presentación oficial 16 gobernaciones 13/09/2024.

HAMBRE_CERO - TE #14976

Confección de presentación de SIAE. Videos demostrativos. Presentación oficial 16 gobernaciones 13/09/2024

16/09/2024 09:52 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	12/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	13/09/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	24.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	24.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 16/09/2024 09:54 - Isaura Flores

- Añadido Fichero Presentación_borradorhambrecero (1).pptx

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

#2 - 16/09/2024 09:57 - Isaura Flores

- Añadido Fichero foto1.jpeg

- Añadido Fichero foto2.jpeg

- Añadido Fichero foto3.jpeg

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 24.00 h:
- Confección de presentación de SIAE. Videos demostrativos. Presentación oficial 16 gobernaciones 13/09/2024.
- Tiempo dedicado: 24.00 h:
- Redacción de documentos. Grabación de videos.
- Finalización de presentación. Edición de videos. Presentación Oficial.

34. TE #15018 Lógica de Cierre de grupos.

HAMBRE_CERO - TE #15018

Lógica de Cierre de grupos.

19/09/2024 09:21 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	12/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	16/09/2024
Asignado a:	Daniel Insaurralde	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	24.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	24.00 horas
NRO_TE:	2		

Descripción

Grupos debe tener un cierre en donde no se puede más editar los proyectos de ese grupo.
Pantalla grupos. Mostrar totales seleccionados
Cuando se ingresa con un usuario con rol gobernaciones, los botones de aprobar o rechazar, dictamen, nota y resolución conae aparecen. No deben aparecer. Solo a los roles correspondientes debe aparecer (Esto es solo al rol nutricionista DGAE le debe aparecer Dictamen. etc).

Histórico

#1 - 19/09/2024 10:05 - Isaura Flores

- Añadido Fichero orden2.png

#2 - 19/09/2024 10:14 - Isaura Flores

- Añadido Fichero cambiosinst.png

#3 - 19/09/2024 10:14 - Isaura Flores

- Fichero eliminado (orden2.png)

#4 - 19/09/2024 10:18 - Isaura Flores

- Añadido Fichero exportar.png

#5 - 19/09/2024 10:37 - Isaura Flores

- Añadido Fichero footer.png

#6 - 24/09/2024 13:32 - Isaura Flores

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 100

#7 - 24/09/2024 13:33 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 24.00 h:

- Lógica de Cierre de grupos.

- Tiempo dedicado: 24.00:

- Actualizaciones del 12/09/2024 - Se realizaron cambios en instituciones: cantidad de instituciones, instituciones seleccionadas, instituciones/modalidad-nivel, instituciones/modalidad - nivel seleccionadas.
- Actualizaciones del 13/09/2024 - Se han realizado cambios para exportar Instituciones en un documento CSV.
- Actualizaciones del 16/09/2024 - Se agregó una visualización en la sección Distritos, donde se observa el ítem "Totales".

35. TE #15053 Resolución CONAE. Dinamizar la pantalla de creación de un dictamen. Se solicita que todos los textos sean editables, no solo ciertas variables.

HAMBRE_CERO - TE #15053

Resolución CONAE. Dinamizar la pantalla de creación de un dictamen. Se solicita que todos los textos sean editables, no solo ciertas variables.

24/09/2024 15:46 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	18/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	23/09/2024
Asignado a:	Leonardo Fernandez	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	32.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	32.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 24/09/2024 15:49 - Isaura Flores

- Añadido Fichero resolucion.png

- Fecha fin establecido a 20/09/2024

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 20

#2 - 24/09/2024 15:53 - Isaura Flores

- Añadido Fichero modificacion_resolucion.png

- Estado cambiado de SIN INICIAR a EN CURSO

- % Realizado cambiado de 20 a 50

#3 - 24/09/2024 15:55 - Isaura Flores

- Añadido Fichero conaeimpresiones.png

- Fecha fin cambiado de 20/09/2024 a 23/09/2024

- Tiempo estimado cambiado de 24.00 h a 32.00 h

#4 - 24/09/2024 15:57 - Isaura Flores

- Añadido Fichero finconae2.png

- Añadido Fichero finconae.png

- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 50 a 100

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 32.00 h:
- Resolución CONAE. Dinamizar la pantalla de creación de un dictamen. Se solicita que todos los textos sean editables, no solo ciertas variables.
- Tiempo dedicado: 32.00:
- Actualización 18/09/2024 - Se eliminan las columnas correspondientes a la resolución inicial. Se crean los nuevos campos en base de datos.
- Actualización 19/09/2024 - El contenido de la Resolución ya puede ser completamente editado, se modificó la tabla proyectos_generados_conae para poder guardar el documento.

- Actualización al 20/08/2024 - El archivo pdf ya se guarda correctamente en la base de datos, faltan algunas modificaciones al código que genera el archivo pdf para poder tener correctamente alineado los títulos con el texto.
- Actualizaciones 23/09/2024 - Se realizaron cambios en las propiedades de estilo en el código para permitir una presentación organizada de la información.Finalización.

36. TE #15047 Redacción y modificación de informe para Diputados.

HAMBRE_CERO - TE #15047

Redacción y modificación de informe para Diputados.

24/09/2024 13:21 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	19/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	19/09/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	4.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	4.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 24/09/2024 13:24 - Isaura Flores

- % Realizado cambiado de 0 a 100

#2 - 24/09/2024 13:24 - Isaura Flores

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

#3 - 24/09/2024 13:24 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 4.00 h:
- Redacción y modificación de informe para Diputados.
- Tiempo dedicado: 4.00:
- Redacción de borrador versión 2 para base de informe a Diputados.

37. TE #15046 Reunión 20/09/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC.

HAMBRE_CERO - TE #15046

Reunión 20/09/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC

24/09/2024 13:14 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	20/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	20/09/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	3.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	3.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 24/09/2024 13:17 - Isaura Flores

- Asunto cambiado de Presentación Oficial Gobernaciones a Reunión 20/09/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- Tiempo estimado establecido a 3.00 h

#2 - 24/09/2024 13:18 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

#3 - 24/09/2024 13:19 - Isaura Flores

- Fecha fin cambiado de 13/09/2024 a 20/09/2024

- Fecha de inicio cambiado de 13/09/2024 a 20/09/2024

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 3.00 h:

- Reunión 20/09/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC.

- Tiempo dedicado: 3.00:

- Reunión presencial en oficinas de MITIC.

38. TE #15049 Histórico de Proyectos Generados y Licitaciones.

HAMBRE_CERO - TE #15049

Histórico de Proyectos Generados y Licitaciones.

24/09/2024 14:04 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	20/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	20/09/2024
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	8.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	8.00 horas
NRO_TE:	2		
Descripción			

Histórico

#1 - 24/09/2024 14:32 - Isaura Flores

- Añadido Fichero historico.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- Asignado a establecido a Robert Romero

- % Realizado cambiado de 0 a 100

#2 - 24/09/2024 14:32 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a RESUELTA

Detalle de horas.

- Tiempo estimado: 8.00 h:
- Histórico de Proyectos Generados y Licitaciones.
- Tiempo dedicado: 8.00:
- Se estudia la lógica de cambios de estado y se crea la tabla de histórico para relación de Proyectos Generados con Licitaciones. Para mantener el histórico de los cambios, previendo adendas.

39. TE #15052 Desarrollo Modal Histórico de Proyectos

HAMBRE_CERO - TE #15052

Desarrollo Modal Histórico de Proyectos

24/09/2024 15:27 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	23/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	27/09/2024
Asignado a:	Matias Vega	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	32.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	32.00 horas
NRO_TE:	2		

Descripción

Histórico

#1 - 24/09/2024 15:30 - Isaura Flores

- Añadido Fichero modalhistorico.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

- % Realizado cambiado de 0 a 20

Agregar un modal que muestre el histórico de los estados con la observación y el documento adjunto

Observaciones

Mostrar las columnas: id_proyecto_generado, fecha, estado, observación, documento
Consultar los datos de la tabla historial_estado_proyecto
El nombre de cada estado se cuentra en la tabla estados_proyectos
Utilizar id_proyecto para filtrar los datos
Ordenar los datos por fecha desc
Exportar en csv
Filtro por rango de fechas

#2 - 24/09/2024 15:30 - Isaura Flores

- Estado cambiado de SIN INICIAR a EN CURSO

#3 - 25/09/2024 11:51 - Isaura Flores

- Añadido Fichero historial.png

- Añadido Fichero proyectos.png

#4 - 26/09/2024 11:05 - Isaura Flores

- Añadido Fichero proyecto.png

#5 - 26/09/2024 13:31 - Isaura Flores

- Añadido Fichero colacion.png

- Añadido Fichero estado.png

#6 - 27/09/2024 11:52 - Isaura Flores

- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 20 a 100

- Tiempo estimado cambiado de 40.00 h a 32.00 h

Detalle de horas.
Tiempo estimado: 32.00 h:
Desarrollo Modal Histórico de Proyectos.
Tiempo dedicado: 32.00:
Actualización 23/09/2024 - Avance en la creación del modal de historial, faltaría el correcto funcionamiento del filtro de fecha y otras validaciones.
Actualizaciones del 24/09/2024 - Se agregó el botón para el modal historial por cada proyecto, se finalizaron las consultas y el filtro de fecha, así como también la función para exportar el documento CSV.

Actualizaciones del 25/09/2024 - Se visualiza correctamente el ID del Proyecto generado, correspondiente al ID_proyecto del proyecto seleccionado, también se puede visualizar cuando un proyecto cambia de ID Proyecto Generado cuando este lo requiera. Se modificaron algunas consultas para la correcta recolección de los datos del proyecto. Actualizaciones del 26/09/2024 - Se ha actualizado el título del Modal, especificando el número de Proyecto, la gobernación y el tipo de alimentación. También se actualizó el nombre del archivo csv con las mismas características.

40. TE #15054 Histórico de Aprobaciones

HAMBRE_CERO - TE #15054

Histórico de Aprobaciones

24/09/2024 16:04 - Isaura Flores

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	24/09/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	27/09/2024
Asignado a:	Leonardo Fernandez	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	32.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	32.00 horas
NRO_TE:	2		

Descripción

Guardar documento adjunto en el historial de estados del Proyecto y Proyecto Generado

Observaciones

Solo si el cambio de estado requiere un documento adjunto, realizar una copia de este en el servidor y guardar la ruta en la columna documento de la tabla historial_estado_proyecto
Utilizar la función de php copy
https://www.php.net/manual/es/function.copy.php
Realizar las modificaciones en la función actualizar_estado del archivo inc\proyectos-generados-data.php
En el modal de cambio de estado agregar un campo requerido para adjuntar un documento PDF
En el modal de cambio de estado el campo Observación debe ser obligatorio

Histórico

#1 - 26/09/2024 10:05 - Isaura Flores

- Añadido Fichero prueba.png

- Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR

#2 - 26/09/2024 10:18 - Isaura Flores

- Añadido Fichero gob3.png

- Añadido Fichero gob2.png

- Añadido Fichero gob1.png

#3 - 26/09/2024 10:50 - Isaura Flores

- Añadido Fichero modific3.png

- Añadido Fichero modific2.png

- Añadido Fichero modific1.png

#4 - 26/09/2024 10:56 - Isaura Flores

- Añadido Fichero archivo.png

- Añadido Fichero arreglos.png

#5 - 26/09/2024 11:00 - Isaura Flores

Firmado digitalmente por JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
Fecha: 2024.10.01 14:49:43 -04'00'
