GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

MEMORANDUN

A: LIC. SERGIO JAVIER RETAMOZO ROURA
AUDITOR INTERNO

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS

CUESTIÓN: **SOLICITUD DE DICTAMEN DE AUDITORIA;**
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2019 CONTRATO Nº 44/2019 AMPLIACION DEL PABELLON DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. O´LEARY - PLURIANUAL - ID Nº 368967, adjudicado por Resolución Nº 1.730 G.A.P

FECHA: 01 DE JUNIO DE 2020.-

Me dirijo a usted en representación de la Secretaria de Obras, a fin de solicitar el DICTAMEN DE AUDITORIA, de la Cuarta Certificación de Obras, asignado a la firma **REDOP**, en el cual solicito el pago por el monto de Guaraníes: **94.171.912 (Guaraníes Noventa y cuatro millones, ciento setenta y un mil, novecientos doce),** de la obra encomendada a la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2019, conforme a los términos del, , CONTRATO Nº 44/2019 AMPLIACION DEL PABELLON DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. O´LEARY - PLURIANUAL - ID Nº 368967, adjudicado por Resolución Nº 1.730 G.A.P.-

En espera de una favorable recepción, salúdale muy respetuosamente.

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

Lic. Miguel Ángel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación de Alto Paraná

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

MEMORANDUN

A: ABOG. ANTONIO DUARTE
SECRETARIO DE HACIENDA

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS

CUESTIÓN: **SOLICITUD DE PAGO DE CUARTA CERTIFICACION FINAL;** LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2019 CONTRATO Nº 44/2019 AMPLIACION DEL PABELLON DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. O´LEARY - PLURIANUAL - ID Nº 368967, adjudicado por Resolución Nº 1.730 G.A.P.

FECHA: 01 DE JUNIO DE 2020.-

Me dirijo a usted en representación de la Secretaria de Obras, a fin de derivar el Expediente en el cual se solicita el Pago por el CUARTO CERTIFICADO de Obras asignado a la firma **REDOP**, en el cual solicito al pago por el monto de Guaraníes: **94.171.912 (Guaraníes Noventa y cuatro millones, ciento setenta y un mil, novecientos doce)**, de la obra encomendada a la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2019, conforme a los términos del, , CONTRATO Nº 44/2019 AMPLIACION DEL PABELLON DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. O´LEARY - PLURIANUAL - ID Nº 368967, adjudicado por Resolución Nº 1.730 G.A.P.-

En espera de una favorable recepción, salúdale muy respetuosamente.

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

Lic. Miguel Ángel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación de Alto Paraná

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105

Ciudad del Este – República del Paraguay

www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

CIUDAD DEL ESTE, 01 DE JUNIO DE 2020.-

INFORME TECNICO

A: PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ.

C.C.: ABOG. ANTONIO DUARTE
SECRETARIA DE HACIENDA.

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS.

Referencia: CONTRATO Nº 44/2019 AMPLIACION DEL PABELLON DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. O´LEARY - PLURIANUAL - ID Nº 368967, adjudicado por Resolución Nº 1.730 G.A.P.-

Objeto: Dictamen de Certificación de Obra.

Se realizó la verificación y medición de la obra AMPLIACION DEL PABELLON DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. O´LEARY, que forma parte de la CONTRATO Nº 44/2019 AMPLIACION DEL PABELLON DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. O´LEARY - PLURIANUAL - ID Nº 368967, adjudicado por Resolución Nº 1.730 G.A.P, Adjudicado a la Empresa **REDOP,** representado por el **Sr. Emigdio Javier Monzón Martínez.**

El resultado de la medición, obran en el Acta de Medición Nº 4 Final y es refrendada en la Certificación de Obra Nº 4 Final en la cual se mencionan los montos de los rubros ya ejecutados, descuento por anticipo y las retención caucional que corresponde a la obra, y lo que corresponde al pago por parte de la Gobernación del Alto Paraná.

La fiscalización informa que los trabajos están siendo ejecutados en plazo y forma, conforme a las especificaciones técnicas y el pliego de bases y condiciones.

Es mi informe.

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

Lic. Miguel Ángel Restaino
Secretario de Obras

REDOP

De: Emigdio Javier Monzón Martínez
RUC: 1736766-2
(0983) 213.126
Hernandarias – Paraguay

CIUDAD DEL ESTE, 01 DE JUNIO DE 2020.-

Señor:
Prof. Dr. Roberto González Vaesken
Gobernador Alto Paraná
Presente.

Por la presente me dirijo a usted con relación al llamado a LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2019, a los efectos de PRESENTAR FACTURA Y SOLICITAR LA CUARTA CERTIFICACION FINAL DE OBRA del CONTRATO Nº 44/2019 del para la AMPLIACION DEL PABELLON DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. O´LEARY - PLURIANUAL - ID Nº 368967, adjudicado por Resolución Nº 1.730/2019.-

Sin otro motivo aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

.....

Emigdio Javier Monzón Martínez
Propietario – REDOP
Servicios Generales

Servicios Generales EJM REDOP RUC:1736766-2

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS – CORRESPONDE A LOS RUBROS EJECUTADOS EN EL AÑO 2020

DENOMINACION: *LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2019, conforme a los términos del, CONTRATO Nº 44/2019 AMPLIACION DEL PABELLON DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. O´LEARY - PLURIANUAL - ID Nº 368967, adjudicado por Resolución Nº 1.730 G.A.P.-*
ENTIDAD CONTRATANTE*: GOBERNACION DEL DECIMO DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANÁ.*
EMPRESA CONTRATISTA*: REDOP. -*

En Ciudad del Este, a los 01 días del mes de Junio del año dos mil veinte, se reúnen en representación de la Gobernación del Alto Paraná, el Secretario de Obras, **Lic. Miguel Ángel Restaino**, y en representación de la Empresa *REDOP*, su representante el ***Sr. Emigdio Javier Monzón Martínez*** contratista de la Obra *CONTRATO Nº 44/2019 AMPLIACION DEL PABELLON DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. O´LEARY - PLURIANUAL - ID Nº 368967, adjudicado por Resolución Nº 1.730 G.A.P*, que forma parte de la *LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2019*, ID Nº 340786, para labrar el **Acta de Recepción Definitiva**

El detalle de los trabajos adjudicados y ejecutados: *AMPLIACION DEL PABELLON DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. O´LEARY. -*

El representante, ***Sr. Emigdio Javier Monzón Martínez***, contratista, manifiesta que la obra fue ejecutado conforme a las especificaciones técnicas y las reglas del buen arte de la construcción.

El Fiscal de Obras de la Gobernación del Alto Paraná, el **Lic. Miguel Ángel Restaino**, manifiesta en este acto que la misma se realizó según lo acordado en el contrato de construcción de obras Nº 44/2019 celebrado en fecha 16 de Octubre de 2019.-

En prueba de lo actuado se labra la presente acta en 03 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. Emigdio Javier Monzón Martínez
Contratista
REDOP

Servicios Generales
Redop
RUC:1736766-2

Lic. Miguel Ángel Restaino
Secretario De Obras
Gobernación Alto Paraná

REDOP
De; Emigdio Javier Monzón Martínez
RUC: 1736766-2 Celular: (0983) 213.126
Hernandarias – Paraguay

PLANILLA DE CUARTA CERTIFICACION FINAL DE OBRA- FECHA 01/06/2020

Ítems del llamado AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. OLEARY - PLURIANUAL 2.020 con ID: 368967

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

PLANILLA DE COMPUTO METRICO CONTRACTUAL							CERTIFICADO Nº 1		CERTIFICADO Nº 2		CERTIFICADO Nº 3		CERTIFICADO Nº 4 FINAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio total	Cantidad	Precio total	Cantidad	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		2.197.800	1	2.197.800	0	-	0	-	0		-
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	549.450	2.197.800	4	2.197.800	0	-	0	-	0	549.450	-
2	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		2.853.144	1	2.853.144	0	-	0	-	0		-
2.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	238	11.988	2.853.144	238	2.853.144	0	-	0	-	0	11.988	-
3	70111503-002	Destronque de arbol	Unidad Medida Global	1		999.000	1	999.000	0	-	0	-	0		-
3.1		Derrivo, Destronque y retiro de arbol	Unidad Medida Global	1	999.000	999.000	1	999.000	0	-	0	-	0	999.000	-
4	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		11.600.000	1	11.600.000	0	-	0	-	0	-	-
4.1		Movimiento de suelo, RELLENO Y COMPACTACION DEI DESNIVEL	Metros cúbicos	145	80.000	11.600.000	145	11.600.000	0	-	0	-	0	80.000	-
5	72102507-003	Servicio de aislacion de pared	Unidad Medida Global	1		687.312	1	687.312	0	-	0	-	0		-
5.1		Derrumbe de pared para conexión a pabellon existente y Muralla	Metros cuadrados	16	42.957	687.312	16	687.312	0	-	0	-	0	42.957	-
6	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		1.995.620	1	1.995.620	0	-	0	-	0		-
6.1		Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	235	8.492	1.995.620	235	1.995.620	0	-	0	-	0	8.492	-
7	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		2.497.500	1	2.497.500	0	-	0	-	0		-
7.1		Vallado de obra	Unidad	1	2.497.500	2.497.500	1	2.497.500	0	-	0	-	0	2.497.500	-
8	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		2.251.746	1	2.251.746	0	-	0	-	0		-
8.1		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	23	97.902	2.251.746	23	2.251.746	0	-	0	-	0	97.902	-
9	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		50.307.642	1	50.307.642	0	-	0	-	0		-
9.1		Zapata de H°A° (1,00x1,00x35) cm	Metros cúbicos	8,69	2.097.900	18.230.751	8,69	18.230.751	0	-	0	-	0	2.097.900	-
9.2		Pilar de H°A° (15x30) cm	Metros cúbicos	5,69	2.097.900	11.937.051	5,69	11.937.051	0	-	0	-	0	2.097.900	-
9.3		Encadenado inferior H°A° (15x30) cm	Metros cúbicos	4,8	2.097.900	10.069.920	4,8	10.069.920	0	-	0	-	0	2.097.900	-
9.4		Encadenado superior HºAº (15x30) cm	Metros cúbicos	4,8	2.097.900	10.069.920	4,8	10.069.920	0	-	0	-	0	2.097.900	-
10	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		52.850.477	1	52.850.477	0	-	0	-	0		-
10.1		Mampostería de nivelación	Metros cuadrados	73,5	152.847	11.234.255	73,5	11.234.255	0	-	0	-	0	152.847	-
10.2		Mampostería elevación de 0.15 m con ladrillos hueco	Metros cuadrados	344,28	120.879	41.616.222	344,28	41.616.222	0	-	0	-	0	120.879	-
11	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		3.251.745	1	3.251.745	0	-	0	-	0		-
11.1		Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	108,5	29.970	3.251.745	108,5	3.251.745	0	-	0	-	0	29.970	-
12	72101607-006	Revoque de pared	Unidad Medida Global	1		42.626.451	0	-	0	-	1	42.626.451	0		-
12.1		Paredes interior y exterior	Metros cuadrados	820,56	51.948	42.626.451	0	-	0	-	820,56	42.626.451	0	51.948	-
13	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		43.000.956	0	-	1	14.846.139	0	28.154.817	0		-
13.1		Contrapiso esp. H° 7 cm	Metros cuadrados	193	44.955	8.676.315	0	-	193	8.676.315	0	-	0	44.955	-
13.2		Carpeta de nivelación esp. 3 cm	Metros cuadrados	193	31.968	6.169.824	0	-	193	6.169.824	0	-	0	31.968	-
13.3		Piso Cerámico (PI 5)	Metros cuadrados	138	140.859	19.438.542	0	-	0	-	138	19.438.542	0	140.859	-
13.4		Guarda obra de boldosones de H° (40x40) cm (incluye caminero para conexion al pabellon existente)	Metros cuadrados	65	124.875	8.116.875	0	-	0	-	65	8.116.875	0	124.875	-
13.5		Piso de goma ensector de conexión con pendiente	Metros cuadrados	10	59.940	599.400	0		0	-	10	599.400	0	59.940	-
14	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		6.026.468	1	6.026.468	0	-	0	-	0		-
14.1		LimpiezaZócalo cerámico (EMBUTIDO) y preparación del terreno	Metro lineal	158,75	37.962	6.026.468	158,75	6.026.468	0	-	0	-	0	37.962	-
15	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		1.198.800	0	-	1	1.198.800	0	-	0		-
15.1		Rampa para acceso de personas con capacidades diferentes	Unidad Medida Global	2	599.400	1.198.800		-	2	1.198.800	0	-	0	599.400	-
16	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		1.198.800		-	0	-	1	1.198.800	0		-
16.1		Pasa mano de caño de acero inoxidable	Metro lineal	10	119.880	1.198.800	0	-	0	-	10	1.198.800	0	119.880	-
17	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		59.460.480		-	1	59.460.480	0	-	0		-

Servicios Generales
EJM Redop
RUC:1736766-2

Gobernación Alto Paraná
Secretaría de Obras Públicas

Ing. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

17.1		Techo de chapa de zinc imitacion a teja pintado, con aislante 3cm, sobre estructura metálica	Metros cuadrados	240	247.752	59.460.480	0	-	240	59.460.480	0	-	0	247.752	-
18	72152605-001	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos	Unidad Medida Global	1		16.911.072	0	-	1	16.911.072	0	-	0		-
18.1		PVC (Incluye estructura para montaje de la misma)	Metros cuadrados	184	91.908	16.911.072	0	-	184	16.911.072	0	-	0	91.908	-
19	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		38.761.200	0	-	0	-	1	38.761.200	0		-
19.1		Puerta placa revestida de formica (0,80 x 2,10) mts con marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras	Unidad	9	1.548.450	13.936.050	0	-	0	-	9	13.936.050	0	1.548.450	-
19.2		Puerta tablero doble hoja de (1.20 x 2.10) mts con visor, marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras tipo van y ven	Unidad	7	3.546.450	24.825.150	0	-	0	-	7	24.825.150	0	3.546.450	-
20	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		2.997.000	0	-	1	2.997.000	0	-	0		-
20.1		Puerta metalica para acceso vehicular	Unidad	1	2.997.000	2.997.000	0	-	1	2.997.000	0	-	0	2.997.000	-
21	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		10.439.550	0	-	0	-	1	10.439.550	0		-
21.1		Ventana blindex de (2,00x0,90) mts	Unidad	2	1.278.720	2.557.440	0	-	0	-	2	2.557.440	0	1.278.720	-
21.2		Ventana blindex de (2,00x0,80) mts	Unidad	4	1.178.820	4.715.280	0	-	0	-	4	4.715.280	0	1.178.820	-
21.3		Ventana blindex de (1,10x1,50) mts	Unidad	1	849.150	849.150	0	-	0	-	1	849.150	0	849.150	-
21.4		Ventana blindex de (0,60x0,40) mts	Unidad	4	579.420	2.317.680	0	-	0	-	4	2.317.680	0	579.420	-
22	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		2.797.200	0	-	1	2.797.200	0	-	0		-
22.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE (Trifásico)	Unidad Medida Global	1	2.797.200	2.797.200	0	-	1	2.797.200	0	-	0	2.797.200	-
23	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		27.707.265	0	-	1	7.492.500	0	20.214.765	0		-
23.1		Tablero principal	Unidad Medida Global	1	3.496.500	3.496.500	0	-	1	3.496.500	0	-	0	3.496.500	-
23.2		Acometida a Tablero Principal	Unidad Medida Global	1	1.498.500	1.498.500	0	-	1	1.498.500	0	-	0	1.498.500	-
23.3		Tablero Seccional	Unidad	5	499.500	2.497.500	0	-	5	2.497.500	0	-	0	499.500	-
23.4		Luces y tomas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	85	210.789	17.917.065	0	-	0	-	85	17.917.065	0	210.789	-
23.5		Luz LED 25 x 25 cm	Unidad	10	229.770	2.297.700	0	-	0	-	10	2.297.700	0	229.770	-
24	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		9.090.900	0	-	0	-	1	9.090.900	0		-
24.1		Ventiladores	Unidad	14	649.350	9.090.900	0	-	0	-	14	9.090.900	0	649.350	-
25	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1		13.636.350	0	-	0	549.450	1	1.907.416	0		11.179.484
25.1		Registros, 40x40x40 cm	Unidad	5	549.450	2.747.250	0	-	1	549.450	3,47	1.907.416	0,528499	549.450	290.384
25.2		Inodoro con instalación y accesorios	Unidad	4	849.150	3.396.600	0	-	0	-	0	-	4	849.150	3.396.600
25.3		Bacha sobre mesada de granito	Unidad	5	1.498.500	7.492.500	0	-	0	-	0	-	5	1.498.500	7.492.500
26	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad	1		5.494.500	1	5.494.500	0	-	0	-	0		-
26.1		Pozo Ciego, diámetro 3 m y profundidad. 3 m	Unidad	1	5.494.500	5.494.500	1	5.494.500	0	-	0	-	0	5.494.500	-
27	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad	1		3.496.500	1	3.496.500	0	-	0	-	0		-
27.1		Cámara Séptica, 3.00x1,60x de profundidad 1,20 m	Unidad	1	3.496.500	3.496.500	1	3.496.500	0	-	0	-	0	3.496.500	-
28	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		1.998.000	0	1.998.000	1	-	0	-	0		-
28.1		Desagüe Cloacal	Unidad Medida Global	1	1.998.000	1.998.000	1	1.998.000	0	-	0	-	0	1.998.000	-
29	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	1	10.864.125	10.864.125	0	-	1	10.864.125	0	-	0	10.864.125	-
30	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad	1		12.987.000	0	-	1	12.987.000	0	-	0		-
30.1		Red de distribución interna de agua corriente	Unidad Medida Global	1	12.987.000	12.987.000	0	-	1	12.987.000	0	-	0	12.987.000	-
31	72152607-001	Servicio de instalación de canaletas de descarga	Unidad Medida Global	1		5.349.645	0	-	0	-	0	-	1		5.349.645
31.1		Canaletas y Bajadas	Metro lineal	63	84.915	5.349.645	0	-	0	-	0	-	63	84.915	5.349.645
32	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		75.586.218	0	-	0	-	0	-	1		75.586.218
32.1		Pared acrilico semi brillo lavable exterior y interior, con sellador, enduido, a dos manos	Metros cuadrados	736,56	97.902	72.110.697	0	-	0	-	0	-	736,56	97.902	72.110.697
32.2		Pintura acrilico semi brillo lavable para abertura	Metro lineal	35,5	97.902	3.475.521	0	-	0	-	0	-	35,5	97.902	3.475.521
33	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		4.015.980	0	-	0	-	0	-	1		4.015.980
33.1		Canaleta y bajada	Metro lineal	69	24.975	1.723.275	0	-	0	-	0	-	69	24.975	1.723.275
33.2		Pintura para piso	Metros cuadrados	45	50.949	2.292.705	0	-	0	-	0	-	45	50.949	2.292.705
34	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		7.991.882	0	-	0	4.994.882	0	-	1		2.997.000
34.1		Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.997.000	2.997.000	0	-	0	-	0	-	1	2.997.000	2.997.000
34.2		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	4.994.882	4.994.882	0	-	0	4.994.882	0	-	0	4.994.882	-
					Precio Total	535.128.328		148.507.453		135.098.648		152.393.899		Precio Total	99.128.328

MONTO CERTIFICADO	**99.128.328**
DESCUENTO DE RETENCION CAUCIONAL 5%	**4.956.416**
MONTO TOTAL A COBRAR POR CERTIFICADO	**94.171.912**

Firma REDOP - RUC Nº 1736766-2
Nombre: EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ
En calidad de: PROPIETARIO

Servicios Generales EJM Redop RUC:1736766-2

GOBERNACION ALTO PARANA * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Secretaría de Obras Públicas

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

ACTA DE MEDICION CERTIFICADO 4 FINAL

En la Ciudad del Este, a los 01 dias del mes de Junio del año 2020 se reunen el Lic. Miguel Angel Restaino, el Fiscal de la Obra de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2019, correspondiente al CONTRATO Nº 44/2019 del para la AMPLIACION DEL PABELLON DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. O´LEARY - PLURIANUAL - ID Nº 368967, adjudicado por Resolución Nº 1.730/2019, entre la Gobernacion del Alto Paraná y la Contratista de Obras, REDOP, representado por el SR. EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ, a efectos de realizar las mediciones del Certificado 4 Final, correspondiente a de la Obra: AMPLIACION DEL PABELLON DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. O´LEARY.

Item	Rubros	Unidad	Computo Contractual	Primera Certificacion	Segunda Certificacion	Tercera Certificacion	Cuarta Certificacion	% de Avance	Cant. Acumulada
1	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1	1	0	0	0	100%	1
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	4	0	0	0	100%	4
2	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1	0	0	0	100%	1
2.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	238	238	0	0	0	100%	238
3	Destronque de arbol	Unidad Medida Global	1	1	0	0	0	100%	1
3.1	Derrivo, Destronque y retiro de arbol	Unidad Medida Global	1	1	0	0	0	100%	1
4	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1	1	0	0	0	100%	1
4.1	Movimiento de suelo, RELLENO Y COMPACTACION DEl DESNIVEL	Metros cúbicos	145	145	0	0	0	100%	145
5	Servicio de aislacion de pared	Unidad Medida Global	1	1	0	0	0	100%	1
5.1	Derrumbe de pared para conexión a pabellon existente y Muralla	Metros cuadrados	16	16	0	0	0	100%	16
6	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	1	0	0	0	100%	1
6.1	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	235	235	0	0	0	100%	235
7	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1	1	0	0	0	100%	1
7.1	Vallado de obra	Unidad	1	1	0	0	0	100%	1
8	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1	1	0	0	0	100%	1
8.1	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	23	23	0	0	0	100%	23
9	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1	1	0	0	0	100%	1
9.1	Zapata de H°A° (1,00x1,00x35) cm	Metros cúbicos	8,69	8,69	0	0	0	100%	8,69
9.2	Pilar de H°A° (15x30) cm	Metros cúbicos	5,69	5,69	0	0	0	100%	5,69
9.3	Encadenado inferior H°A° (15x30) cm	Metros cúbicos	4,8	4,8	0	0	0	100%	4,8
9.4	Encadenado superior HºAº (15x30) cm	Metros cúbicos	4,8	4,8	0	0	0	100%	4,8
10	Mamposteria	Unidad Medida Global	1	1	0	0	0	100%	1
10.1	Mampostería de nivelación	Metros cuadrados	73,5	73,5	0	0	0	100%	73,5
10.2	Mampostería elevación de 0.15 m con ladrillos hueco	Metros cuadrados	344,28	344,28	0	0	0	100%	344,28
11	Aislacion	Unidad Medida Global	1	1	0	0	0	100%	1
11.1	Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	108,5	108,5	0	0	0	100%	108,5
12	Revoque de pared	Unidad Medida Global	1	-	0	1	0	100%	1
12.1	Paredes interior y exterior	Metros cuadrados	820,56	-	0	820,56	0	100%	820,56
13	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1	-	1	0	0	100%	1
13.1	Contrapiso esp. H° 7 cm	Metros cuadrados	193	-	193	0	0	100%	193
13.2	Carpeta de nivelación esp. 3 cm	Metros cuadrados	193	-	193	0	0	100%	193
13.3	Piso Cerámico (PI 5)	Metros cuadrados	138	-	0	138	0	100%	138
13.4	Guarda obra de boldosones de H° (40x40) cm (incluye caminero para conexion al pabellon existente)	Metros cuadrados	65	-	0	65	0	100%	65
13.5	Piso de goma ensector de conexión con pendiente	Metros cuadrados	10	-	0	10	0	100%	10
14	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1	1	0	0	0	100%	1
14.1	LimpiezaZócalo cerámico (EMBUTIDO) y preparación del terreno	Metro lineal	158,75	159	0	0	0	100%	158,75
15	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	-	1	0	0	100%	1
15.1	Rampa para acceso de personas con capacidades diferentes	Unidad Medida Global	2	-	2	0	0	100%	2
16	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1	-	0	1	0	100%	1
16.1	Pasa mano de caño de acero inoxidable	Metro lineal	10	-	0	10	0	100%	10
17	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1	-	1	0	0	100%	1
17.1	Techo de chapa de zinc imitacion a teja pintado, con aislante 3cm, sobre estructura metálica	Metros cuadrados	240	-	240	0	0	100%	240

Servicios Generales Redop RUC:1736766-2

GOBERNACION ALTO PARANA * SECCION FISCALES * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

18	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos	Unidad Medida Global	1	-	1	0	0	100%	1
18.1	PVC (Incluye estructura para montaje de la misma)	Metros cuadrados	184	-	184	0	0	100%	184
19	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1	-	0	1	0	100%	1
19.1	Puerta placa revestida de formica (0,80 x 2,10) mts con marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras	Unidad	9	-	0	9	0	100%	9
19.2	Puerta tablero doble hoja de (1.20 x 2.10) mts con visor, marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras tipo van y ven	Unidad	7	-	0	7	0	100%	7
20	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1	-	1	0	0	100%	1
20.1	Puerta metalica para acceso vehicular	Unidad	1	-	1	0	0	100%	1
21	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1	-	0	1	0	100%	1
21.1	Ventana blindex de (2,00x0,90) mts	Unidad	2	-	0	2	0	100%	2
21.2	Ventana blindex de (2,00x0,80) mts	Unidad	4	-	0	4	0	100%	4
21.3	Ventana blindex de (1,10x1,50) mts	Unidad	1	-	0	1	0	100%	1
21.4	Ventana blindex de (0,60x0,40) mts	Unidad	4	-	0	4	0	100%	4
22	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1	-	1	0	0	100%	1
22.1	Conexión a red interna según reglamento de ANDE (Trifásico)	Unidad Medida Global	1	-	1	0	0	100%	1
23	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1	-	1	0	0	100%	1
23.1	Tablero principal	Unidad Medida Global	1	-	1	0	0	100%	1
23.2	Acometida a Tablero Principal	Unidad Medida Global	1	-	1	0	0	100%	1
23.3	Tablero Seccional	Unidad	5	-	5	0	0	100%	5
23.4	Luces y tomas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	85	-	0	85	0	100%	85
23.5	Luz LED 25 x 25 cm	Unidad	10	-	0	10	0	100%	10
24	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1	-	0	1	0	100%	1
24.1	Ventiladores	Unidad	14	-	0	14	0	100%	14
25	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	-	0	1	0	100%	1
25.1	Registros, 40x40x40 cm	Unidad	5	-	1	3,47	0,53	100%	5,00
25.2	Inodoro con instalación y accesorios	Unidad	4	-	0	0	4	100%	4
25.3	Bacha sobre mesada de granito	Unidad	5	-	0	0	5	100%	5
26	Construccion de pozo ciego	Unidad	1	1	0	0	0	100%	1
26.1	Pozo Ciego, diámetro 3 m y profundidad. 3 m	Unidad	1	1	0	0	0	100%	1
27	Construccion de camara septica	Unidad	1	1	0	0	0	100%	1
27.1	Cámara Séptica, 3.00x1,60x de profundidad 1,20 m	Unidad	1	1	0	0	0	100%	1
28	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	-	1	0	0	100%	1
28.1	Desagüe Cloacal	Unidad Medida Global	1	1	0	0	0	100%	1
29	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	1	-	1	0	0	100%	1
30	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad	1	-	1	0	0	100%	1
30.1	Red de distribución interna de agua corriente	Unidad Medida Global	1	-	1	0	0	100%	1
31	Servicio de instalación de canaletas de descarga	Unidad Medida Global	1	-	0	0	1	100%	1
31.1	Canaletas y Bajadas	Metro lineal	63	-	0	0	63	100%	63
32	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1	-	0	0	1	100%	1
32.1	Pared acrilico semi brillo lavable exterior y interior, con sellador, enduido, a dos manos	Metros cuadrados	736,56	-	0	0	736,56	100%	736,56
32.2	Pintura acrilico semi brillo lavable para abertura	Metro lineal	35,5	-	0	0	35,5	100%	35,5
33	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	-	0	0	1	100%	1
33.1	Canaleta y bajada	Metro lineal	69	-	0	0	69	100%	69
33.2	Pintura para piso	Metros cuadrados	45	-	0	0	45	100%	45
34	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	-	0	0	1	100%	1
34.1	Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	-	0	0	1	100%	1
34.2	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	-	0	0	0	0%	0

REDOP
EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ
PROPIETARIO

Servicios Generales
REDOP
RUC:1736766-2

GOBERNACION ALTO PARANA
Obras Públicas
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría

GOBERNACION ALTO NACION ALTO NACION ALTO PARANÁ
ING. MIGUEL ANGEL REGUEL ANGEL REGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE ORETARIO DE ORETARIO DE OBRAS

Ítems del llamado AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. OLEARY - PLURIANUAL 2.020 con ID: 368967

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		2.197.800
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	549.450	2.197.800
2	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		2.853.144
2.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	238	11.988	2.853.144
3	70111503-002	Destronque de arbol	Unidad Medida Global	1		999.000
3.1		Derrivo, Destronque y retiro de arbol	Unidad Medida Global	1	999.000	999.000
4	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		11.600.000
4.1		Movimiento de suelo, RELLENO Y COMPACTACION DEI DESNIVEL	Metros cúbicos	145	80.000	11.600.000
5	72102507-003	Servicio de aislacion de pared	Unidad Medida Global	1		687.312
5.1		Derrumbe de pared para conexión a pabellon existente y Muralla	Metros cuadrados	16	42.957	687.312
6	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		1.995.620
6.1		Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	235	8.492	1.995.620
7	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		2.497.500
7.1		Vallado de obra	Unidad	1	2.497.500	2.497.500
8	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		2.251.746
8.1		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	23	97.902	2.251.746
9	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		50.307.642
9.1		Zapata de H°A° (1,00x1,00x35) cm	Metros cúbicos	8,69	2.097.900	18.230.751
9.2		Pilar de H°A° (15x30) cm	Metros cúbicos	5,69	2.097.900	11.937.051
9.3		Encadenado inferior H°A° (15x30) cm	Metros cúbicos	4,8	2.097.900	10.069.920
9.4		Encadenado superior HºAº (15x30) cm	Metros cúbicos	4,8	2.097.900	10.069.920
10	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		52.850.477
10.1		Mampostería de nivelación	Metros cuadrados	73,5	152.847	11.234.255
10.2		Mampostería elevación de 0.15 m con ladrillos hueco	Metros cuadrados	344,28	120.879	41.616.222
11	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		3.251.745
11.1		Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	108,5	29.970	3.251.745
12	72101607-006	Revoque de pared	Unidad Medida Global	1		42.626.451
12.1		Paredes interior y exterior	Metros cuadrados	820,56	51.948	42.626.451
13	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		43.000.956
13.1		Contrapiso esp. H° 7 cm	Metros cuadrados	193	44.955	8.676.315
13.2		Carpeta de nivelación esp. 3 cm	Metros cuadrados	193	31.968	6.169.824
13.3		Piso Cerámico (PI 5)	Metros cuadrados	138	140.859	19.438.542
13.4		Guarda obra de boldosones de H° (40x40) cm (incluye caminero para conexion al pabellon existente)	Metros cuadrados	65	124.875	8.116.875
13.5		Piso de goma ensector de conexión con pendiente	Metros cuadrados	10	59.940	599.400
14	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		6.026.468
14.1		LimpiezaZócalo cerámico (EMBUTIDO) y preparación del terreno	Metro lineal	158,75	37.962	6.026.468
15	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		1.198.800
15.1		Rampa para acceso de personas con capacidades diferentes	Unidad Medida Global	2	599.400	1.198.800
16	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		1.198.800
16.1		Pasa mano de caño de acero inoxidable	Metro lineal	10	119.880	1.198.800
17	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		59.460.480
17.1		Techo de chapa de zinc imitacion a teja pintado, con aislante 3cm, sobre estructura metálica	Metros cuadrados	240	247.752	59.460.480
18	72152605-001	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos	Unidad Medida Global	1		16.911.072
18.1		PVC (Incluye estructura para montaje de la misma)	Metros cuadrados	184	91.908	16.911.072
19	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		38.761.200
19.1		Puerta placa revestida de formica (0,80 x 2,10) mts con marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras	Unidad	9	1.548.450	13.936.050
19.2		Puerta tablero doble hoja de (1.20 x 2.10) mts con visor, marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras tipo van y ven	Unidad	7	3.546.450	24.825.150
20	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		2.997.000
20.1		Puerta metalica para acceso vehicular	Unidad	1	2.997.000	2.997.000
21	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		10.439.550
21.1		Ventana blindex de (2,00x0,90) mts	Unidad	2	1.278.720	2.557.440
21.2		Ventana blindex de (2,00x0,80) mts	Unidad	4	1.178.820	4.715.280
21.3		Ventana blindex de (1,10x1,50) mts	Unidad	1	849.150	849.150
21.4		Ventana blindex de (0,60x0,40) mts	Unidad	4	579.420	2.317.680
22	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		2.797.200
22.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE (Trifásico)	Unidad Medida Global	1	2.797.200	2.797.200
23	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		27.707.265
23.1		Tablero principal	Unidad Medida Global	1	3.496.500	3.496.500
23.2		Acometida a Tablero Principal	Unidad Medida Global	1	1.498.500	1.498.500
23.3		Tablero Seccional	Unidad	5	499.500	2.497.500
23.4		Luces y tomas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	85	210.789	17.917.065
23.5		Luz LED 25 x 25 cm	Unidad	10	229.770	2.297.700
24	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techc	Unidad Medida Global	1		9.090.900
24.1		Ventiladores	Unidad	14	649.350	9.090.900
25	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1		13.636.350
25.1		Registros, 40x40x40 cm	Unidad	5	549.450	2.747.250
25.2		Inodoro con instalación y accesorios	Unidad	4	849.150	3.396.600
25.3		Bacha sobre mesada de granito	Unidad	5	1.498.500	7.492.500
26	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad	1		5.494.500
26.1		Pozo Ciego, diámetro 3 m y profundidad. 3 m	Unidad	1	5.494.500	5.494.500
27	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad	1		3.496.500
27.1		Cámara Séptica, 3.00x1,60x de profundidad 1,20 m	Unidad	1	3.496.500	3.496.500
28	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		1.998.000

Servicios Generales Redop RUC:1736766-2

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

GOBERNACIÓN ALTO PARANA * Secretaría de Obras Públicas * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

28.1		Desagüe Cloacal	Unidad Medida Global	1	1.998.000	1.998.000
29	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	1	10.864.125	10.864.125
30	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad	1		12.987.000
30.1		Red de distribución interna de agua corriente	Unidad Medida Global	1	12.987.000	12.987.000
31	72152607-001	Servicio de instalación de canaletas de descarga	Unidad Medida Global	1		5.349.645
31.1		Canaletas y Bajadas	Metro lineal	63	84.915	5.349.645
32	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		75.586.218
32.1		Pared acrilico semi brillo lavable exterior y interior, con sellador, enduido, a dos manos	Metros cuadrados	736,56	97.902	72.110.697
32.2		Pintura acrilico semi brillo lavable para abertura	Metro lineal	35,5	97.902	3.475.521
33	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		4.015.980
33.1		Canaleta y bajada	Metro lineal	69	24.975	1.723.275
33.2		Pintura para piso	Metros cuadrados	45	50.949	2.292.705
34	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		7.991.882
34.1		Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.997.000	2.997.000
34.2		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	4.994.882	4.994.882
					Precio Total	535.128.328

Firma
Nombre: REDOP - RUC Nº 1736766-2
En calidad de: EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ
PROPIETARIO

Servicios Generales
EJM Redop
RUC:1736766-2

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

GOBERNACIÓN ALTO PARANA * Secretaría de Obras Públicas * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

REDOP

De: Emigdio Javier Monzón Martínez
RUC: 1736766-2
(0983) 213.126
Hernandarias – Paraguay

FOTOS DE OBRAS

4º CERTIFICACION FINAL

DENOMINACION: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2019 CONTRATO Nº 44/2019 AMPLIACION DEL PABELLON DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. O´LEARY - PLURIANUAL - ID Nº 368967, adjudicado por Resolución Nº 1.730 G.A.P.-

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL DECIMO DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANÁ.

EMPRESA CONTRATISTA: REDOP.

AMPLIACION DEL PABELLON DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. O´LEARY -

Servicios Generales
EJM Redop
RUC:1736766-2

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

REDOP

De: Emigdio Javier Monzón Martínez
RUC: 1736766-2
(0983) 213.126
Hernandarias – Paraguay

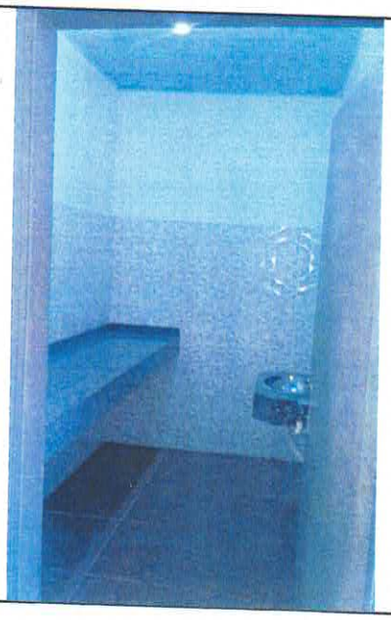

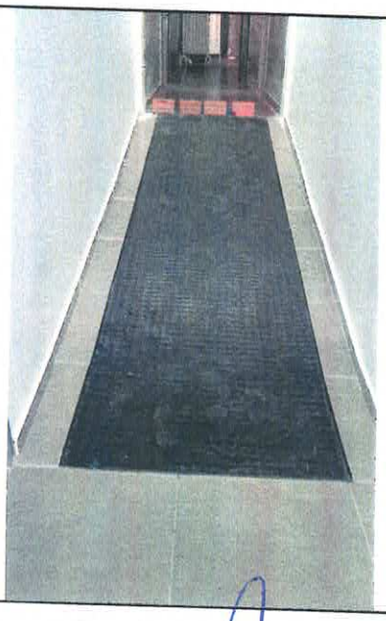

Servicios Generales
Redop
RUC:1736766-2

.....
Emigdio Javier Monzón Martínez
Propietario – REDOP
Servicios Generales

Lic. Miguel Angel Restano
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

GOBERNACIÓN ALTO PARANA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría de Obras Públicas
