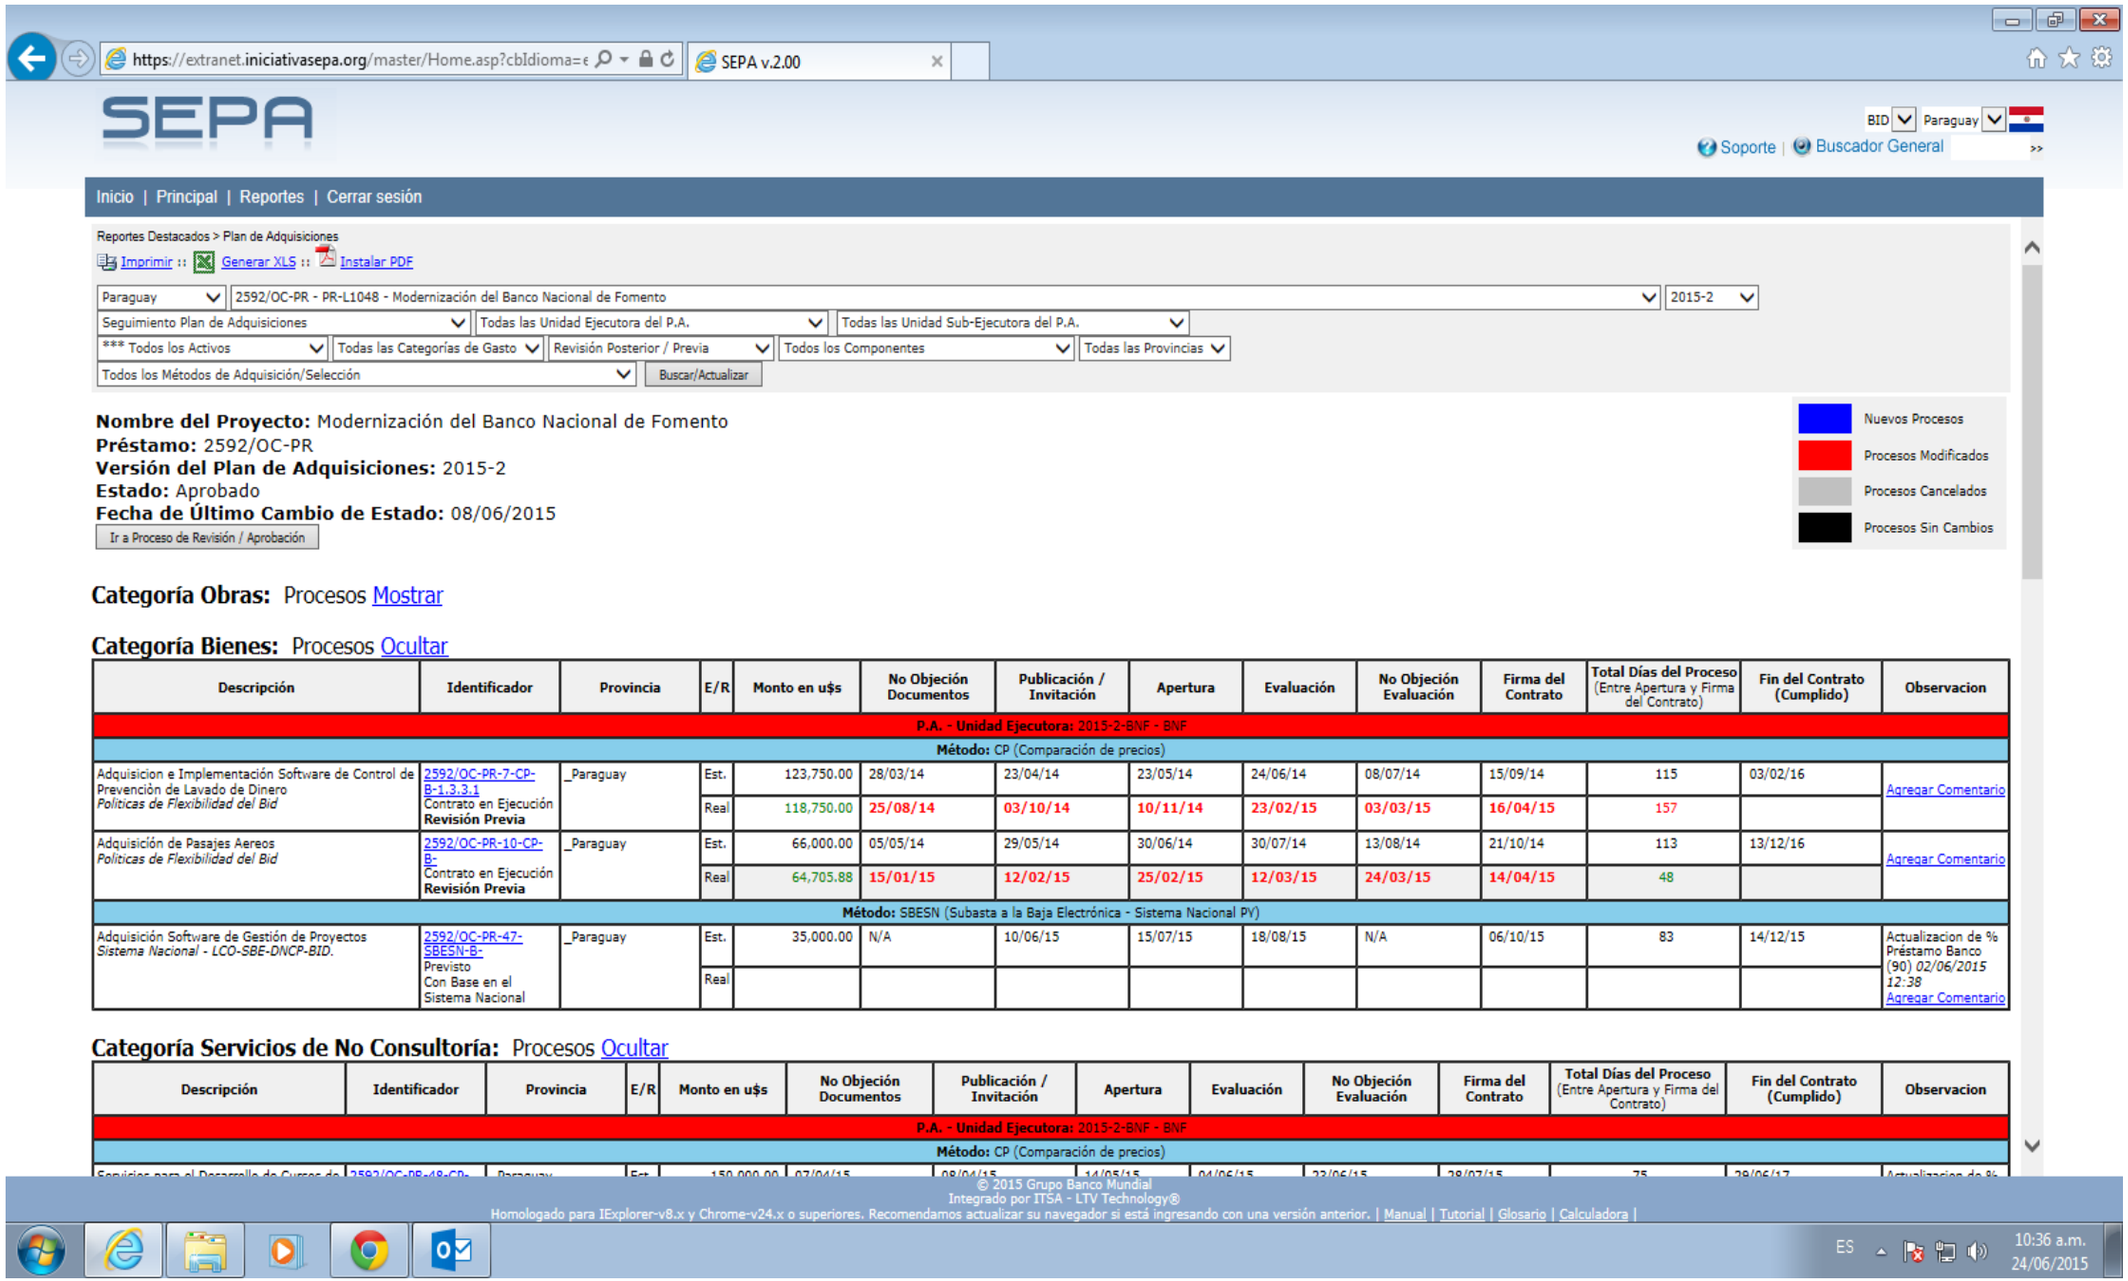
https://extranet.iniciativasepa.org/master/Home.asp?cbIdioma=e
SEPA v.2.00
SEPA
BID
Paraguay
Soporte | Buscador General
Inicio | Principal | Reportes | Cerrar sesión
Reportes Destacados > Plan de Adquisiciones
Imprimir :: Generar XLS :: Instalar PDF
Paraguay
2592/OC-PR - PR-L1048 - Modernización del Banco Nacional de Fomento
2015-2
Seguimiento Plan de Adquisiciones
Todas las Unidad Ejecutora del P.A.
Todas las Unidad Sub-Ejecutora del P.A.
*** Todos los Activos
Todas las Categorías de Gasto
Revisión Posterior / Previa
Todos los Componentes
Todas las Provincias
Todos los Métodos de Adquisición/Selección
Buscar/Actualizar
Nuevos Procesos
Procesos Modificados
Procesos Cancelados
Procesos Sin Cambios
Nombre del Proyecto: Modernización del Banco Nacional de Fomento
Préstamo: 2592/OC-PR
Versión del Plan de Adquisiciones: 2015-2
Estado: Aprobado
Fecha de Último Cambio de Estado: 08/06/2015
Ir a Proceso de Revisión / Aprobación
Categoría Obras: Procesos Mostrar
Categoría Bienes: Procesos Ocultar
Descripción
Identificador
Provincia
E/R
Monto en u$s
No Objeción Documentos
Publicación / Invitación
Apertura
Evaluación
No Objeción Evaluación
Firma del Contrato
Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)
Fin del Contrato (Cumplido)
Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-BNF - BNF
Método: CP (Comparación de precios)
Adquisicion e Implementación Software de Control de Prevención de Lavado de Dinero
Politicas de Flexibilidad del Bid
2592/OC-PR-7-CP-B-1.3.3.1
Contrato en Ejecución
Revisión Previa
_Paraguay
Est.
123,750.00
28/03/14
23/04/14
23/05/14
24/06/14
08/07/14
15/09/14
115
03/02/16
Agregar Comentario
Real
118,750.00
25/08/14
03/10/14
10/11/14
23/02/15
03/03/15
16/04/15
157
Adquisición de Pasajes Aereos
Politicas de Flexibilidad del Bid
2592/OC-PR-10-CP-B-
Contrato en Ejecución
Revisión Previa
_Paraguay
Est.
66,000.00
05/05/14
29/05/14
30/06/14
30/07/14
13/08/14
21/10/14
113
13/12/16
Agregar Comentario
Real
64,705.88
15/01/15
12/02/15
25/02/15
12/03/15
24/03/15
14/04/15
48
Método: SBESN (Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY)
Adquisición Software de Gestión de Proyectos
Sistema Nacional - LCO-SBE-DNCP-BID.
2592/OC-PR-47-SBESN-B-
Previsto
Con Base en el Sistema Nacional
_Paraguay
Est.
35,000.00
N/A
10/06/15
15/07/15
18/08/15
N/A
06/10/15
83
14/12/15
Actualizacion de % Préstamo Banco (90) 02/06/2015 12:38
Agregar Comentario
Real
Categoría Servicios de No Consultoría: Procesos Ocultar
Descripción
Identificador
Provincia
E/R
Monto en u$s
No Objeción Documentos
Publicación / Invitación
Apertura
Evaluación
No Objeción Evaluación
Firma del Contrato
Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)
Fin del Contrato (Cumplido)
Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-BNF - BNF
Método: CP (Comparación de precios)
© 2015 Grupo Banco Mundial
Integrado por ITSA - LTV Technology®
Homologado para IExplorer-v8.x y Chrome-v24.x o superiores. Recomendamos actualizar su navegador si está ingresando con una versión anterior. | Manual | Tutorial | Glosario | Calculadora |
ES
10:36 a.m.
24/06/2015
