Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc
1			**Lote 1: Residencia Universitaria y entorno de Medicina**	**94 días**	**vie 04/11/22**	**vie 03/03/23**	
2			**Preparación de Obra**	**4 días**	**vie 04/11/22**	**mié 09/11/22**	
10			**Servicio de Excavación Estructural**	**11 días**	**mié 09/11/22**	**mié 23/11/22**	
12			**Servicio de Excavación de Zanja de Drenaje**	**6 días**	**mié 23/11/22**	**jue 01/12/22**	
14			**Relleno y compactacion de terreno**	**3 días**	**lun 28/11/22**	**jue 01/12/22**	
16			**Servicio de demolición**	**22 días**	**jue 01/12/22**	**jue 29/12/22**	
22			**Colocacion de hormigon armado**	**18 días**	**mié 23/11/22**	**vie 16/12/22**	
25			**Construcción de Muralla o Muro**	**18 días**	**mié 23/11/22**	**vie 16/12/22**	
28			**Mampostería**	**39 días**	**mié 23/11/22**	**jue 12/01/23**	
36			**Aislación**	**1 día**	**mar 20/12/22**	**mié 21/12/22**	
38			**Revoques**	**13 días**	**lun 02/01/23**	**mié 18/01/23**	
43			**Aberturas**	**8 días**	**sáb 14/01/23**	**mié 25/01/23**	
52			**Colocación de pisos - contrapisos**	**37 días**	**mié 28/12/22**	**lun 13/02/23**	
63			**Revestimiento de pared o muro**	**9 días**	**mié 18/01/23**	**lun 30/01/23**	
66			**Construcción/Colocación de techo**	**9 días**	**lun 30/01/23**	**vie 10/02/23**	
71			**Colocación de Pasamano**	**3 días**	**vie 10/02/23**	**mar 14/02/23**	
73			**Construcción de desague pluvial**	**7 días**	**mar 20/12/22**	**jue 29/12/22**	
80			**Construcción e instalación eléctrica**	**21 días**	**lun 16/01/23**	**sáb 11/02/23**	
102			**Instalaciones Sanitarias**	**24 días**	**lun 02/01/23**	**mié 01/02/23**	
127			**Servicio de Pintura**	**14 días**	**vie 10/02/23**	**mar 28/02/23**	
131			**Limpieza de Obra**	**3 días**	**mar 28/02/23**	**vie 03/03/23**	

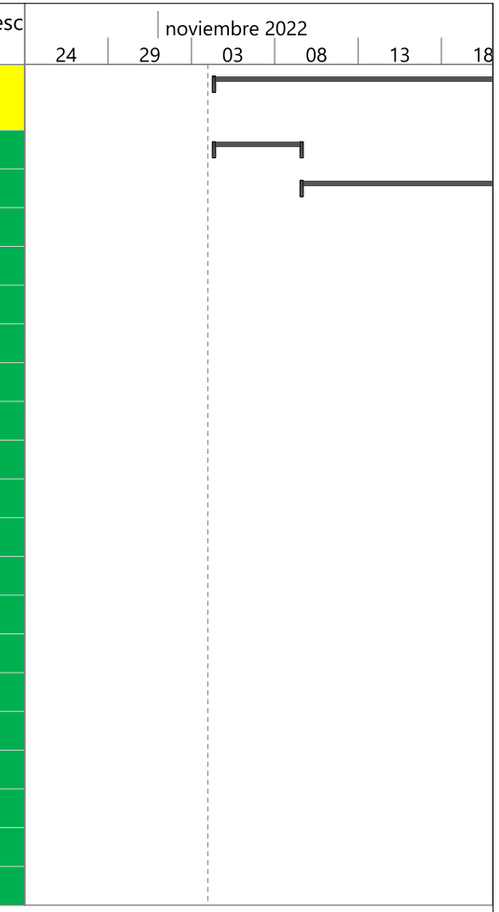

LOTE Nº 1
RESIDENCIA UNIVERSITARIA
Y ENTORNO DE MEDICINA

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

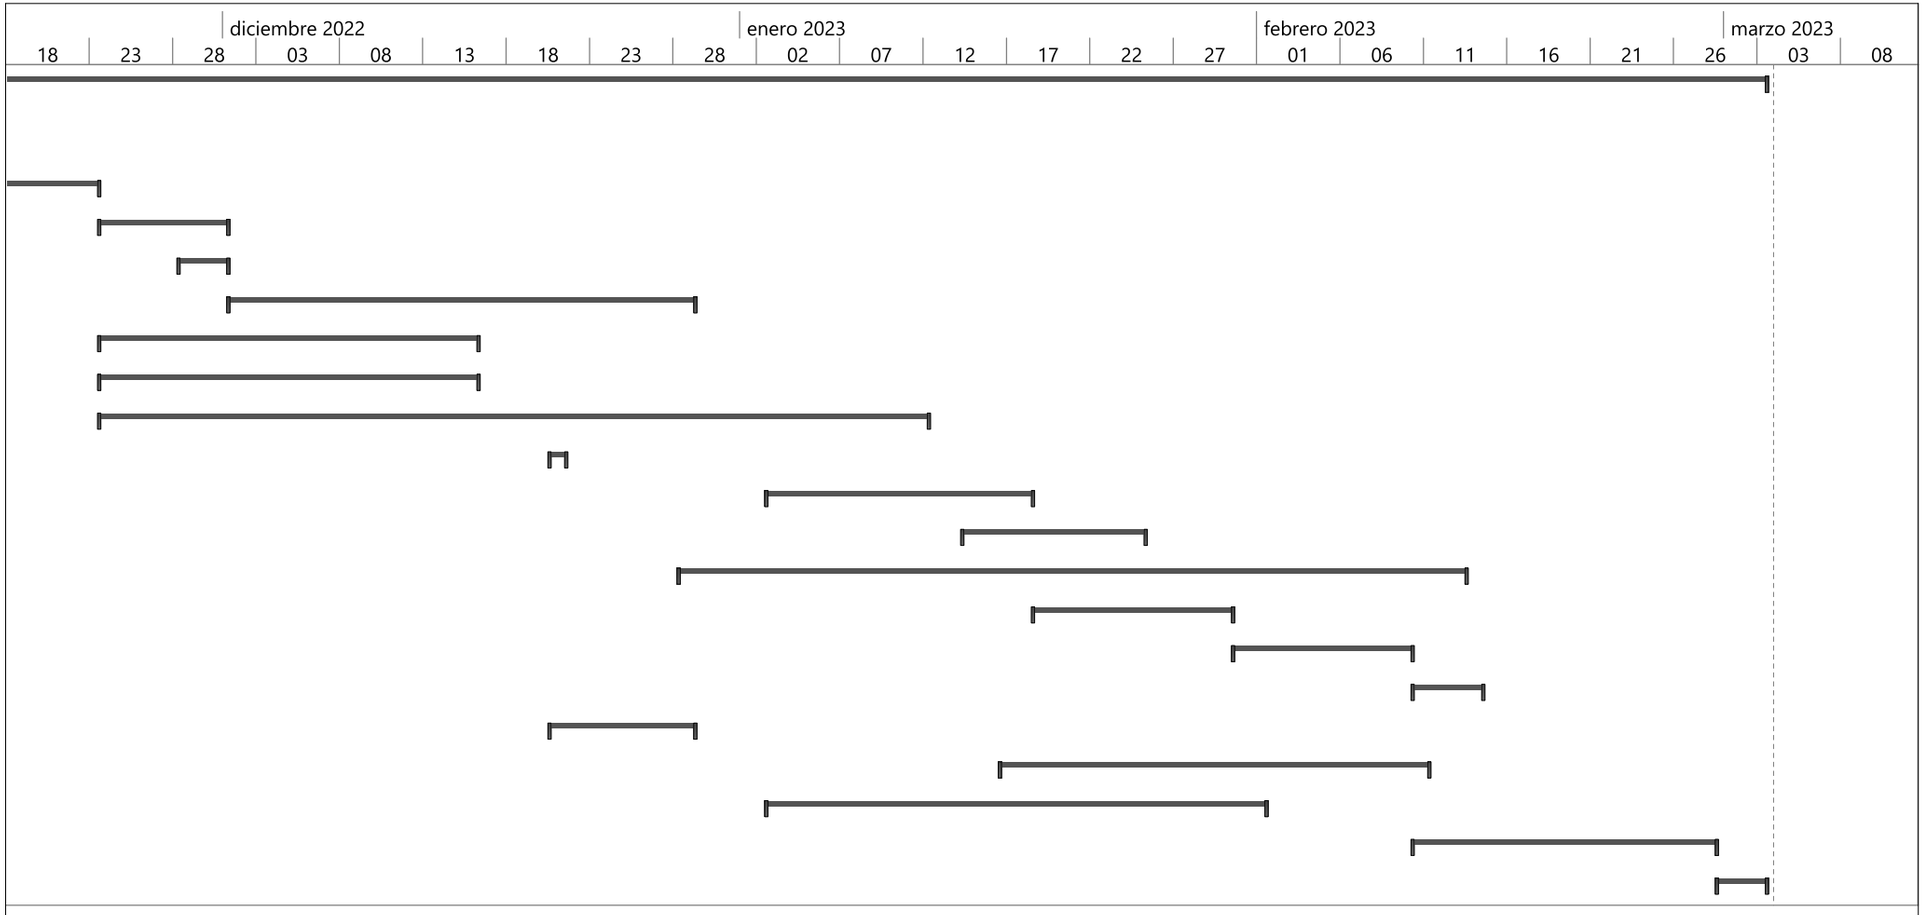

LOTE Nº 1
RESIDENCIA UNIVERSITARIA
Y ENTORNO DE MEDICINA

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
